RELATÓRIO CONSOLIDADO TÉCNICO — RCT

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

RCT Nº	MIN-RCT-CT024-0005-R00	**DATA**	30/10/2026 (SEXTA-FEIRA)	**CONTRATO**	0024-2026
CONTRATANTE	BONS VENTOS DA SERRA 1			**EXECUTORA**	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
LOCAL / TRECHO	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)				
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026)				
DIA DO CRONOGRAMA	DIA ÚTIL 05 DE 19 — 5 DECORRIDO(S), 14 RESTANTE(S)				
EXECUTADO NO DIA	04 — LIMPEZA DOS ACESSOS DA LT-02P4 – 69 KV (ANTECIPADA)				

2. COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO CONSOLIDADO

PARTE	DOCUMENTO	CÓDIGO	SITUAÇÃO
1	DIÁRIO DE CAMPO — FOTOS 01 A 04	MIN-DC-CT024-0005-R00	CONFERIDO — FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
2	DIÁRIO DE OBRA (RDO)	MIN-RDO-CT024-0005-R00	ENVIADO PARA REVISÃO
3	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO DIA (RF) — FOTOS 05 A 08	MIN-RF-CT024-0005-R00	4 FOTO(S) COM LEGENDA

AS FOTOGRAFIAS TÊM NUMERAÇÃO ÚNICA NO CONSOLIDADO: AS PRIMEIRAS ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO E AS DEMAIS NO RF, EM ANEXO. O QR CODE DESTA CAPA E O DE CADA PARTE ABREM A CÓPIA DESTE CONSOLIDADO NA CONSULTA.

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9EV6-5862
MIN-RCT-CT024-0005-R00
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA
É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

DIÁRIO Nº	MIN-DC-CT024-0005	**DATA**	30/10/2026 (SEXTA-FEIRA)	**RESPONSÁVEL**	FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
LOCAL / TRECHO	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)			**CLIMA**	MANHÃ: BOM TARDE: BOM
EQUIPE PRESENTE	1 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO · 1 ENGENHEIRO (TOTAL: 4)				
EQUIPAMENTOS	1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA · 2 VEÍCULOS DE APOIO				

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

PREVISTO EM 29/10/2026	DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. — FEITO

SERVIÇO EXECUTADO	LOCAL / TRECHO	LADO	QUANT.	SITUAÇÃO
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	TORRE 02-3 ATÉ 02-04	AMBOS	2.800,00 M²*	EM ANDAMENTO

* QUANTIDADE ESTIMADA NO CAMPO.

3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS


SEM OCORRÊNCIAS RELEVANTES

4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

SERVIÇOS PREVISTOS	DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO.
RECURSOS NECESSÁRIOS	ROÇADEIRA MECANIZADA
CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES.

SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.


5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA

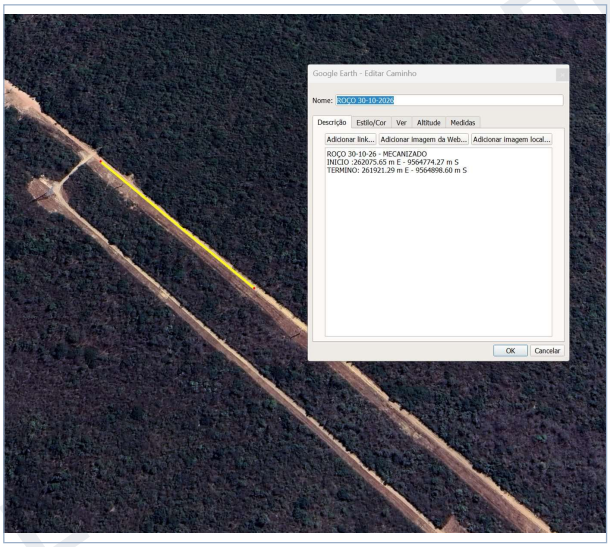

ROÇO 30/10/2026 — 200,00 M EXECUTADOS

SERVIÇO	LADO	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	QUANT.
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	AMBOS	200,00	7,00	2.800,00 M²*

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.

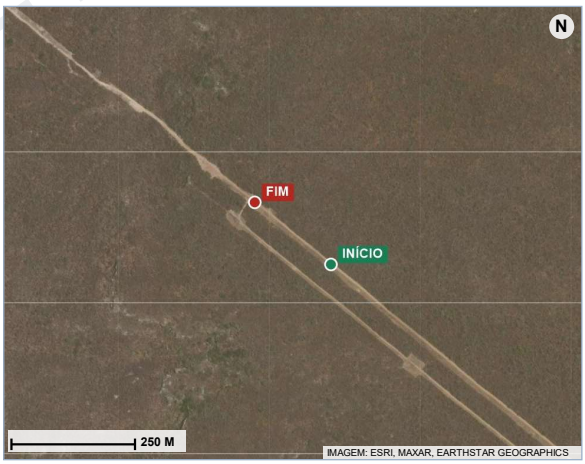

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ABRIR O TRECHO NO GOOGLE MAPS

- INÍCIO (VERDE)
- FIM (VERMELHO)

COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 262075.65 N 9564774.27 · FIM: E 261921.29 N 9564898.60
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 198,20 M · EXTENSÃO MEDIDA: 200,00 M · DIFERENÇA: 1,80 M (0,9%)
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/-3.934799%2C-41.142686/-3.933671%2C-41.144073

6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	UN	ATÉ ONTEM	HOJE	ACUMULADO
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	M²	17.272,57	2.800,00	20.072,57
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	M²	22,50	—	22,50

SOMA DE TODOS OS DIÁRIOS DE CAMPO DESTA OBRA ATÉ 30/10/2026, POR SERVIÇO: ATÉ ONTEM + HOJE = ACUMULADO. A LINHA COM "—" EM HOJE NÃO TEVE EXECUÇÃO NESTE DIA.

DIAS DECORRIDOS: 5 · DIAS TRABALHADOS: 5

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA — DEMAIS FOTOS NO RF EM ANEXO



FOTO 01 — ROÇO REALIZADO



FOTO 02 — ROÇO REALIZADO



FOTO 03 — MANUTENÇÃO CORRETIVA



FOTO 04 — ROÇO REALIZADO

CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

TEXTO CONFERIDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO RESPONSÁVEL: FRANCISCO GUILHERME ARAUJO

CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1

_____
WILLIAM SOUSA DE FREITAS
SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____

SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA

_____
FÁBIO CORSI XIMENES

TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE

_____
NOME: _____
DATA: ___/___/_____

TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE

_____
NOME: _____
DATA: ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9EV6-5862
MIN-RCT-CT024-0005-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA – RDO

APOIO TÉCNICO DE OBRA (ATO) – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BONS VENTOS DA SERRA 1

1. IDENTIFICAÇÃO

RDO Nº	MIN-RDO-CT024-0005	**DATA**	30/10/2026	**DIA DA SEMANA**	SEXTA-FEIRA
OBRA / SERVIÇO	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS				
EMPRESA EXECUTORA	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	**CONTRATO**	0024-2026	**RESP. TÉCNICO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES – 060133223-7
FISCAL TÉCNICO	WILLIAM SOUSA DE FREITAS	**TÉCNICO ATO**	FÁBIO CORSI XIMENES – SUPERVISOR	**ART**	—
LOCAIS VISTORIADOS	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)				

2. PRAZO CONTRATUAL

INÍCIO CONTRATUAL	26/10/2026	**TÉRMINO PREVISTO**	—	**PRAZO TOTAL**	—
DIAS DECORRIDOS	5	**DIAS TRABALHADOS**	5	**DIAS RESTANTES**	—
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026)				
DIA DO CRONOGRAMA	DIA ÚTIL 05 DE 19 — 5 DECORRIDO(S), 14 RESTANTE(S)				
PREVISTO PARA O DIA	02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS (DIA 3 DE 4 DA ETAPA)				
EXECUTADO NO DIA	NENHUM SERVIÇO LANÇADO NO DIA (DIÁRIO DE CAMPO / BLOCO 05)				
SITUAÇÃO DAS ETAPAS	CONCLUÍDAS: — · EM ANDAMENTO: 02, 04 · ATRASADAS: — · A CONFIRMAR CONCLUSÃO: 01 · A INICIAR: 03, 05, 06, 07				

3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E JORNADA

PERÍODO	TEMPO	CONDIÇÃO DE TRABALHO	HORÁRIO DA EXECUTORA	HORÁRIO DO TÉCNICO ATO
MANHÃ	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	NÃO HOUVE ATIVIDADE	08H00 – 12H00	08H00 – 12H00
TARDE	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	NÃO HOUVE ATIVIDADE	13H00 – 17H00	13H00 – 17H00
NOITE / FDS	☐ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	NÃO HOUVE ATIVIDADE	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE

4. RECURSOS MOBILIZADOS – EFETIVO, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.
SUPERVISÃO DE CAMPO	1	EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO	2	ENGENHEIRO	1
TOTAL DO EFETIVO					**4**

MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO	MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO
TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA (EQUIPAMENTO)	1	OPERANDO	VEÍCULOS DE APOIO (EQUIPAMENTO)	2	OPERANDO

5. SEGURANÇA

ITEM VERIFICADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — BLOQUEIO, ETIQUETAGEM E PERMISSÃO DE TRABALHO — NR-10	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
TRABALHO EM ALTURA / ANDAIMES — NR-35 / NR-18	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
USO DE EPI E EPC	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO — POEIRA E RUÍDO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ROTAS DE FUGA E CIRCULAÇÃO LIBERADAS	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DESVIO DE TRÁFEGO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ESCAVAÇÕES E VALAS — ESCORAMENTO E PROTEÇÃO	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS — NR-12	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ÁREAS SENSÍVEIS EM FUNCIONAMENTO (HOSPITAIS, ESCOLAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS)	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO
01	ROÇO REALIZADO	02	ROÇO REALIZADO	03	MANUTENÇÃO CORRETIVA	04	ROÇO REALIZADO
05	LOCAL DA PARADA	06	ROÇO REALIZADO	07	MANUTENÇÃO CORRETIVA	08	MANUTENÇÃO CORRETIVA

AS FOTOGRAFIAS ACIMA ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO (FOTOS 01 A 04) E NO RF DO DIA, EM ANEXO (FOTOS 05 A 08), COM A MESMA NUMERAÇÃO.

7. OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO	PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA: DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO.

8. ASSINATURAS — SITUAÇÃO: ENVIADO (A APROVAÇÃO NO SISMIN NÃO EQUIVALE A ASSINATURA DIGITAL)

TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUTORA	FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1
FÁBIO CORSI XIMENES SUPERVISOR	DAVID DE SOUSA FERNANDES 060133223-7	WILLIAM SOUSA DE FREITAS SUPERVISOR DE O&M – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9EV6-5862
MIN-RCT-CT024-0005-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 30/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0005 — FOTOS 05 A 08 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO		CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS		0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
ART DE EXECUÇÃO	**ART DE FISCALIZAÇÃO**	**DATA DO RDO**	**FOTOGRAFIAS**
—	—	30/10/2026	4 FOTOS

VINCULADO A
FOTOS DO DIA 30/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0005 — FOTOS 05 A 08 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

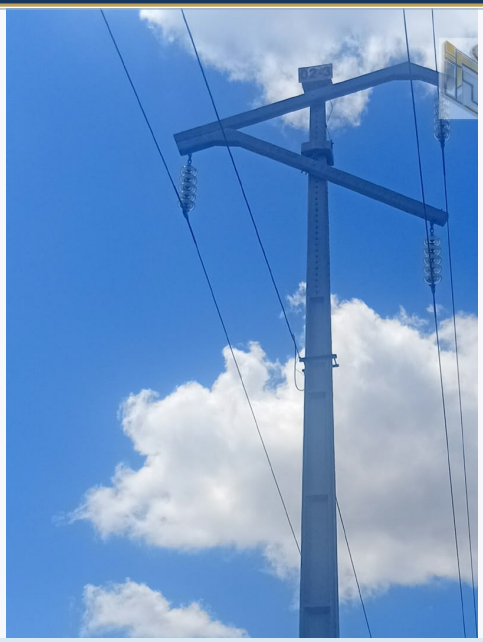


FOTO 05 — LOCAL DA PARADA

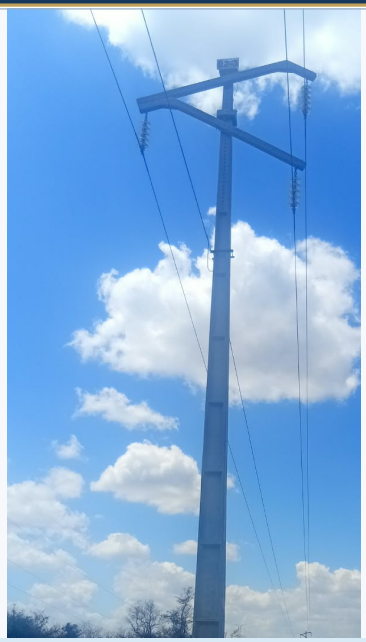


FOTO 06 — ROÇO REALIZADO



FOTO 07 — MANUTENÇÃO CORRETIVA



FOTO 08 — MANUTENÇÃO CORRETIVA

ASSINATURAS

TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA	FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1
FÁBIO CORSI XIMENES SUPERVISOR	WILLIAM SOUSA DE FREITAS SUPERVISOR DE O&M – CIÊNCIA EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9EV6-5862
MIN-RCT-CT024-0005-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
