# DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIÁRIO Nº** | MIN-DC-CT024-0005 | **DATA** | 30/10/2026 (SEXTA-FEIRA) | **RESPONSÁVEL** | FRANCISCO GUILHERME ARAUJO |
| **LOCAL / TRECHO** | LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM) | | | **CLIMA** | MANHÃ: BOM TARDE: BOM |
| **EQUIPE PRESENTE** | 1 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO · 1 ENGENHEIRO (TOTAL: 4) | | | | |
| **EQUIPAMENTOS** | 1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA · 2 VEÍCULOS DE APOIO | | | | |

## 2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

| | |
|---|---|
| **PREVISTO EM 29/10/2026** | DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. — FEITO |

| SERVIÇO EXECUTADO | LOCAL / TRECHO | LADO | QUANT. | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM) | TORRE 02-3 ATÉ 02-04 | AMBOS | 1.400,00 M²* | EM ANDAMENTO |

* QUANTIDADE ESTIMADA NO CAMPO.

## 3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS


| OCORRÊNCIA | IMPACTO NOS SERVIÇOS | PROVIDÊNCIA ADOTADA |
|---|---|---|
| LOGO APÓS A DDS DO DIA A EQUIPE FOI ENCAMINHADA PARA RETOMAR OS SERVIÇOS DA LIMPEZA DA FAIXA LT, CONTANTO AO SE INICIAR OS SERVIÇOS, A MÁQUINA TEVE UM NOVO FURO NO PNEU DEVIDA QUANTIDADE DE TOCOS DE ÁRVORES SECAS NO TRECHO ENTRE A TORRE 02-3 ATÉ 02-04. PERCORRENDO UM TOTAL DE 200M DE EXTENSÃO | OS SERVIÇOS FORAM PARALISADOS POIS HOUVE A NECESSIDADE DE RETIRAR UM DOS PNEUS | MANUTENÇÃO CORRETIVA |

## 4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

| | |
|---|---|
| **SERVIÇOS PREVISTOS** | DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. |
| **RECURSOS NECESSÁRIOS** | ROÇADEIRA MECANIZADA |
| **CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS** | MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES. |

SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.

## 5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA

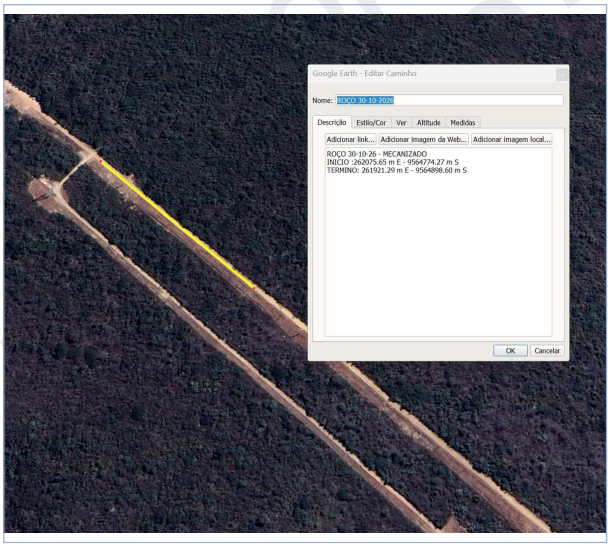


ROÇO 30/10/2026 — 200,00 M EXECUTADOS

| SERVIÇO | LADO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM) | AMBOS | 200,00 | 3,50 | 1.400,00 M²* |

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.




**APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ABRIR O TRECHO NO GOOGLE MAPS**

- INÍCIO (VERDE)
- FIM (VERMELHO)

**COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 262075.65 N 9564774.27 · FIM: E 261921.29 N 9564898.60**
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 198,20 M · EXTENSÃO MEDIDA: 200,00 M · DIFERENÇA: 1,80 M (0,9%)
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/-3.934799%2C-41.142686/-3.933671%2C-41.144073



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

## 6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

| SERVIÇO | UN | ATÉ ONTEM | HOJE | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| ROÇO MECANIZADO | M² | 17.272,57 | — | 17.272,57 |
| ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | M² | 22,50 | — | 22,50 |
| LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM) | M² | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

SOMA DE TODOS OS DIÁRIOS DE CAMPO DESTA OBRA ATÉ 30/10/2026, POR SERVIÇO: ATÉ ONTEM + HOJE = ACUMULADO. A LINHA COM "—" EM HOJE NÃO TEVE EXECUÇÃO NESTE DIA.

DIAS DECORRIDOS: 5 · DIAS TRABALHADOS: 5

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA — DEMAIS FOTOS NO RF EM ANEXO



FOTO 01 — ROÇO REALIZADO



FOTO 02 — ROÇO REALIZADO




FOTO 03 — MANUTENÇÃO CORRETIVA



FOTO 04 — ROÇO REALIZADO



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

## CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

TEXTO CONFERIDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO RESPONSÁVEL: FRANCISCO GUILHERME ARAUJO

| CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1 | SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA |
|---|---|
| **WILLIAM SOUSA DE FREITAS**<br>SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____ | **FÁBIO CORSI XIMENES** |

| TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE | TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE |
|---|---|
| **NOME:** _____<br>DATA: ___/___/_____ | **NOME:** _____<br>DATA: ___/___/_____ |

**CONSULTE PELO CELULAR**
**VERIFICAÇÃO: KTE5-ZQDQ**
MIN-DC-CT024-0005-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
