
ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. CRONOGRAMA DO CONTRATO

CRONOGRAMA	—	**REVISÃO**	—	**PRAZO**	19 DIAS ÚTEIS
INÍCIO	26/10/2026	**TÉRMINO PREVISTO**	23/11/2026	**POSIÇÃO EM**	30/10/2026 — DIA 05 DE 19

2. PREVISTO × REALIZADO POR ETAPA

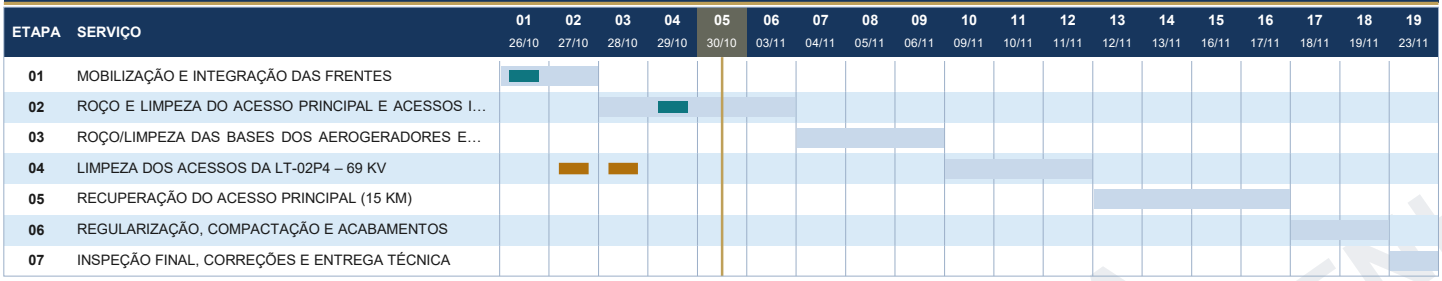

ETAPA	SERVIÇO	INÍCIO	TÉRMINO	DIAS EXEC.	SITUAÇÃO
01	MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FRENTES	26/10/2026	27/10/2026	1	AGUARDA CONFIRMAR CONCLUSÃO
02	ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS	28/10/2026	03/11/2026	1	EM ANDAMENTO
03	ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS	04/11/2026	06/11/2026	—	A INICIAR
04	LIMPEZA DOS ACESSOS DA LT-02P4 – 69 KV	09/11/2026	11/11/2026	2	ANTECIPADA
05	RECUPERAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (15 KM)	12/11/2026	17/11/2026	—	A INICIAR
06	REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTOS	18/11/2026	19/11/2026	—	A INICIAR
07	INSPEÇÃO FINAL, CORREÇÕES E ENTREGA TÉCNICA	23/11/2026	23/11/2026	—	A INICIAR

REALIZADO PELOS SERVIÇOS LANÇADOS NO DIÁRIO DE CAMPO E NO RDO. AVANÇO PREVISTO ATÉ 30/10/2026: 26,3% · AVANÇO REALIZADO (ESTIMADO): 21,1%.

3. OBSERVAÇÕES DO CRONOGRAMA

O PRAZO DE 19 DIAS ÚTEIS (EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS), COM TÉRMINO PREVISTO EM 23/11/2026, É O PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO. O CRONOGRAMA PODERÁ SER ANTECIPADO CASO OS SERVIÇOS AVANCEM MAIS RÁPIDO QUE O PREVISTO, SEM PREJUÍZO DA QUALIDADE E MEDIANTE ACEITE DA FISCALIZAÇÃO; AS MEDIÇÕES ACOMPANHARÃO A EXECUÇÃO EFETIVA. AJUSTES POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, ACESSO E DEMANDAS OPERACIONAIS SEGUEM O ITEM 12 – FORÇA MAIOR, SENDO COMUNICADOS PREVIAMENTE E FORMALIZADOS ENTRE AS PARTES.

AS ETAPAS 01 (MOBILIZAÇÃO) E 07 (INSPEÇÃO FINAL/ENTREGA TÉCNICA) NÃO POSSUEM ITEM DE PREÇO PRÓPRIO: SEUS CUSTOS ESTÃO DILUÍDOS NOS PREÇOS GLOBAIS DOS ITENS 01 A 06.

AS ETAPAS PODEM SER ANTECIPADAS CONFORME AUMENTO DE FRENTES DE SERVIÇO, PODENDO-SE FINALIZAR ETAPAS ANTES DOS PRAZOS ESTIPULADOS. COM ISSO, OS PEDIDOS DE MEDIÇÃO E AS ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTO OBEDECERÃO AOS PERCENTUAIS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, SENDO DEVIDOS ASSIM QUE ALCANÇADA A META DE EXECUÇÃO CORRESPONDENTE.

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: AHP2-GG85
MIN-CR-CRONOGRAMA-20261030
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
