DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

DIÁRIO Nº	MIN-DC-CT024-0006	**DATA**	03/11/2026 (TERÇA-FEIRA)	**RESPONSÁVEL**	FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
LOCAL / TRECHO	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE			**CLIMA**	MANHÃ: BOM TARDE: BOM
EQUIPE PRESENTE	1 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO · 1 ENGENHEIRO (TOTAL: 4)				
EQUIPAMENTOS	1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA · 2 VEÍCULOS DE APOIO				

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

PREVISTO EM 30/10/2026	DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. — FEITO

SERVIÇO EXECUTADO	LOCAL / TRECHO	LADO	QUANT.	SITUAÇÃO
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	TRECHOS DE ACESSOS	ESQUERDO	7.650,00 M²	EM ANDAMENTO

DESCRIÇÃO	HOUVE INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE ROÇO MANUAL


3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS

OCORRÊNCIA	IMPACTO NOS SERVIÇOS	PROVIDÊNCIA ADOTADA
LOGO APÓS A DDS DO DIA A EQUIPE FOI ENCAMINHADA PARA RETOMAR OS SERVIÇOS DE ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE, POIS A MÁQUINA ESTAVA VINDO DA MANUTENÇÃO E PARA NÃO PERDER O PERCURSO OPTOU-SE PELO ROÇO DOS ACESSOS. DURANTE A MANHÃ, A EQUIPE DE ROÇO MANUAL INICIOU O INTEGRAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DA SUBESTAÇÃO. AO INÍCIO DA TARDE A EQUIPE INICIOU OS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL PELA UG-11, TENDO DUAS FRENTE DE TRABALHO NO PARQUE.	NÃO HOUVERAM	—

4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

SERVIÇOS PREVISTOS	RETOMADA DO ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE E ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS.
RECURSOS NECESSÁRIOS	ROÇADEIRA MECANIZADA / ROÇADEIRAS MANUAIS
CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES.
SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.	

5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA

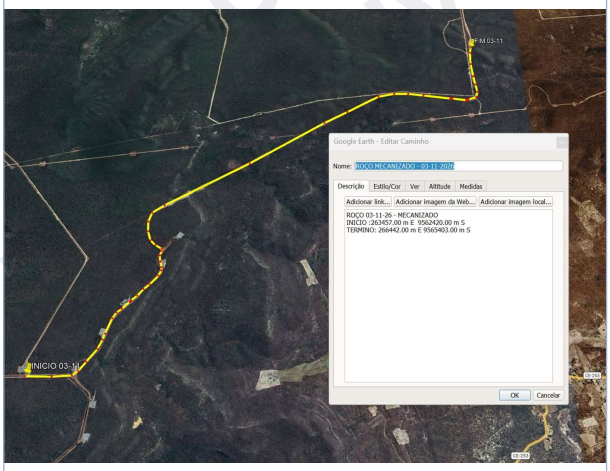

ROÇO MECANIZADO — 5.100,00 M EXECUTADOS

SERVIÇO	LADO	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	QUANT.
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	ESQUERDO	5.100,00	1,50	7.650,00 M²

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.



APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ABRIR O TRECHO NO GOOGLE MAPS

- INÍCIO (VERDE)
- FIM (VERMELHO)

COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 263457.00 N 9562420.00 · FIM: E 266442.00 N 9565403.00
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 4.220,01 M · EXTENSÃO MEDIDA: 5.100,00 M · DIFERENÇA: 879,99 M (20,9%)
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/-3.956115%2C-41.130306/-3.929215%2C-41.103368

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	UN	ATÉ ONTEM	HOJE	ACUMULADO
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	M²	20.072,57	—	20.072,57
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	M²	22,50	7.650,00	7.672,50

SOMA DE TODOS OS DIÁRIOS DE CAMPO DESTA OBRA ATÉ 03/11/2026, POR SERVIÇO: ATÉ ONTEM + HOJE = ACUMULADO. A LINHA COM "—" EM HOJE NÃO TEVE EXECUÇÃO NESTE DIA.

DIAS DECORRIDOS: 9 · DIAS TRABALHADOS: 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA — DEMAIS FOTOS NO RF EM ANEXO



FOTO 01 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 02 — ROÇO MECANIZADO

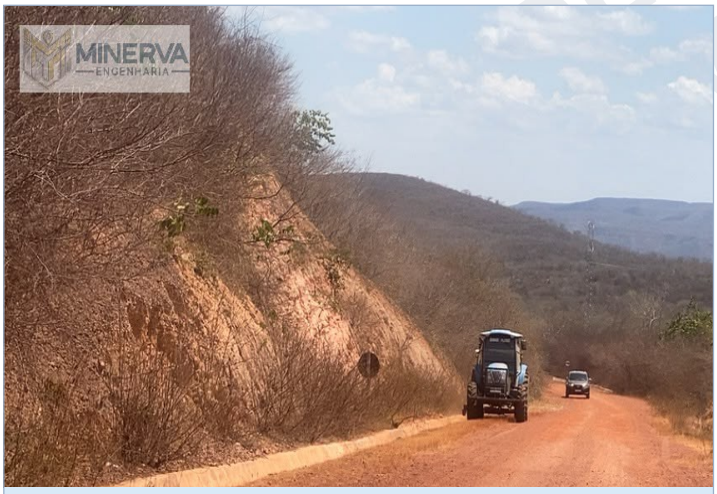


FOTO 03 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 04 — ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 05 — INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA



FOTO 06 — ROÇO BASE AEROGERADORES

CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

TEXTO CONFERIDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO RESPONSÁVEL: FRANCISCO GUILHERME ARAUJO

CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1

WILLIAM SOUSA DE FREITAS
SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____

SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA

FÁBIO CORSI XIMENES

TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE

NOME: _____
DATA: ___/___/_____

TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE

NOME: _____
DATA: ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: IZY5-FA2K
MIN-DC-CT024-0006-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
