RELATÓRIO CONSOLIDADO TÉCNICO — RCT

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

RCT Nº	MIN-RCT-CT024-0004-R00	**DATA**	29/10/2026 (QUINTA-FEIRA)	**CONTRATO**	0024-2026
CONTRATANTE	BONS VENTOS DA SERRA 1			**EXECUTORA**	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
LOCAL / TRECHO	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE				
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026)				
DIA DO CRONOGRAMA	DIA ÚTIL 04 DE 19 — 4 DECORRIDO(S), 15 RESTANTE(S)				
EXECUTADO NO DIA	02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS				

2. COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO CONSOLIDADO

PARTE	DOCUMENTO	CÓDIGO	SITUAÇÃO
1	DIÁRIO DE CAMPO — FOTOS 01 A 04	MIN-DC-CT024-0004-R00	CONFERIDO — FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
2	DIÁRIO DE OBRA (RDO)	MIN-RDO-CT024-0004-R00	ENVIADO PARA REVISÃO
3	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO DIA (RF) — FOTOS 05 A 42	MIN-RF-CT024-0004-R00	38 FOTO(S) COM LEGENDA

AS FOTOGRAFIAS TÊM NUMERAÇÃO ÚNICA NO CONSOLIDADO: AS PRIMEIRAS ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO E AS DEMAIS NO RF, EM ANEXO. O QR CODE DESTA CAPA E O DE CADA PARTE ABREM A CÓPIA DESTE CONSOLIDADO NA CONSULTA.

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: BYKQ-NWGM
MIN-RCT-CT024-0004-R00
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA
É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

DIÁRIO Nº	MIN-DC-CT024-0004	**DATA**	29/10/2026 (QUINTA-FEIRA)	**RESPONSÁVEL**	FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
LOCAL / TRECHO	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE			**CLIMA**	MANHÃ: BOM TARDE: BOM
EQUIPE PRESENTE	1 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO · 1 ENGENHEIRO (TOTAL: 4)				
EQUIPAMENTOS	1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA · 2 VEÍCULOS DE APOIO				

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

PREVISTO EM 28/10/2026	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. — FEITO

SERVIÇO EXECUTADO	LOCAL / TRECHO	LADO	QUANT.	SITUAÇÃO
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	ACESSOS INTERNOS	AMBOS	22.500,00 M²*	EM ANDAMENTO

DESCRIÇÃO	COORDENADA INICIAL: 266479.00 M E, 9564958.00 M S COORDENADA FINAL: 266032.00 M E, 9572386.00 M S

* QUANTIDADE ESTIMADA NO CAMPO.

3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS


OCORRÊNCIA	IMPACTO NOS SERVIÇOS	PROVIDÊNCIA ADOTADA
BREVE PARALISAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA	—	—

4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

SERVIÇOS PREVISTOS	DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO.
RECURSOS NECESSÁRIOS	ROÇADEIRA MECANIZADA
CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES.

SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.


5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA

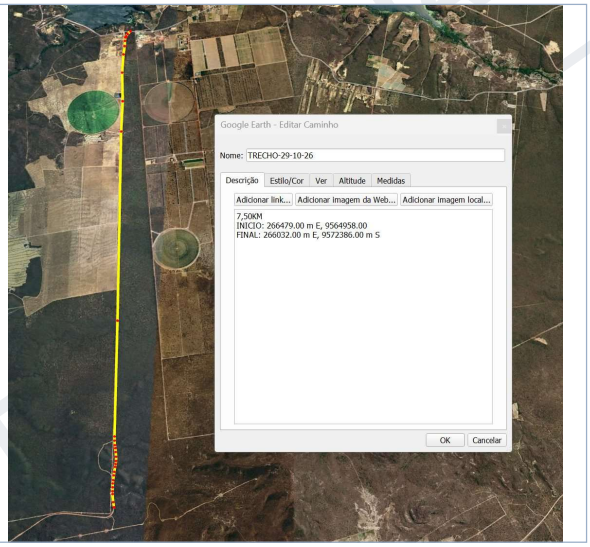

TRECHO-ROÇO DE ACESSOS INTERNOS — 7.500,00 M EXECUTADOS

SERVIÇO	LADO	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	QUANT.
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	AMBOS	7.500,00	1,50	22.500,00 M²*

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.

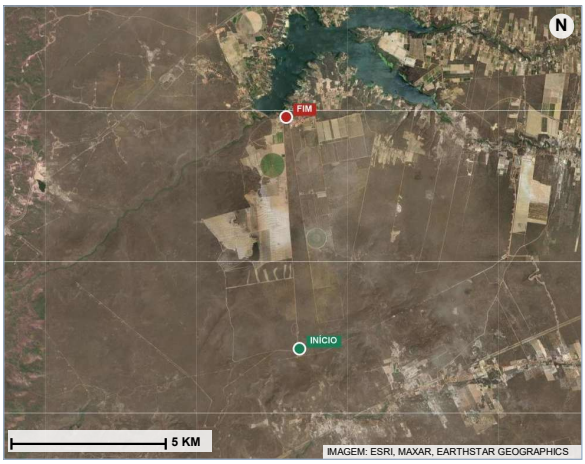

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ABRIR O TRECHO NO GOOGLE MAPS

- INÍCIO (VERDE)
- FIM (VERMELHO)

COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 266479.00 N 9564958 · FIM: E 266032 N 9572386
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 7.441,44 M · EXTENSÃO MEDIDA: 7.500,00 M · DIFERENÇA: 58,56 M (0,8%)
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/-3.933239%2C-41.103045/-3.866074%2C-41.106901

6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	UN	ATÉ ONTEM	HOJE	ACUMULADO
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	M²	17.272,57	—	17.272,57
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	M²	0,00	22.500,00	22.500,00

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

SOMA DE TODOS OS DIÁRIOS DE CAMPO DESTA OBRA ATÉ 29/10/2026, POR SERVIÇO: ATÉ ONTEM + HOJE = ACUMULADO. A LINHA COM "—" EM HOJE NÃO TEVE EXECUÇÃO NESTE DIA.

DIAS DECORRIDOS: 4 · DIAS TRABALHADOS: 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA — DEMAIS FOTOS NO RF EM ANEXO



FOTO 01 — ENTRADA DO PARQUE



FOTO 02 — TRECHO À EXECUTAR



FOTO 03 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 04 — TRECHO À EXECUTAR

CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

TEXTO CONFERIDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO RESPONSÁVEL: FRANCISCO GUILHERME ARAUJO

CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1

WILLIAM SOUSA DE FREITAS
SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____

SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA

FÁBIO CORSI XIMENES

TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE

NOME: _____
DATA: ___/___/_____

TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE

NOME: _____
DATA: ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: BYKQ-NWGM
MIN-RCT-CT024-0004-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA – RDO

APOIO TÉCNICO DE OBRA (ATO) – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BONS VENTOS DA SERRA 1

1. IDENTIFICAÇÃO

RDO Nº	MIN-RDO-CT024-0004	**DATA**	29/10/2026	**DIA DA SEMANA**	QUINTA-FEIRA
OBRA / SERVIÇO	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS				
EMPRESA EXECUTORA	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	**CONTRATO**	0024-2026	**RESP. TÉCNICO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES – 060133223-7
FISCAL TÉCNICO	WILLIAM SOUSA DE FREITAS	**TÉCNICO ATO**	FÁBIO CORSI XIMENES – SUPERVISOR	**ART**	—
LOCAIS VISTORIADOS	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE				

2. PRAZO CONTRATUAL

INÍCIO CONTRATUAL	26/10/2026	**TÉRMINO PREVISTO**	—	**PRAZO TOTAL**	—
DIAS DECORRIDOS	4	**DIAS TRABALHADOS**	4	**DIAS RESTANTES**	—
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026)				
DIA DO CRONOGRAMA	DIA ÚTIL 04 DE 19 — 4 DECORRIDO(S), 15 RESTANTE(S)				
PREVISTO PARA O DIA	02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS (DIA 2 DE 4 DA ETAPA)				
EXECUTADO NO DIA	02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS				
SITUAÇÃO DAS ETAPAS	CONCLUÍDAS: — · EM ANDAMENTO: 02, 04 · ATRASADAS: — · A CONFIRMAR CONCLUSÃO: 01 · A INICIAR: 03, 05, 06, 07				

3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E JORNADA

PERÍODO	TEMPO	CONDIÇÃO DE TRABALHO	HORÁRIO DA EXECUTORA	HORÁRIO DO TÉCNICO ATO
MANHÃ	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	08H00 – 12H00	08H00 – 12H00
TARDE	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	13H00 – 17H00	13H00 – 17H00
NOITE / FDS	☐ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☐ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE

4. RECURSOS MOBILIZADOS – EFETIVO, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.
SUPERVISÃO DE CAMPO	1	EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO	2	ENGENHEIRO	1
TOTAL DO EFETIVO					**4**

MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO	MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO
TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA (EQUIPAMENTO)	1	OPERANDO	VEÍCULOS DE APOIO (EQUIPAMENTO)	2	OPERANDO

OBSERVAÇÕES: HOUVE UMA BREVE PARALISADA NA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, JÁ DESCRITA NO DIÁRIO DE CAMPO E NAS OBSERVAÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5. SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ITEM PLANILHA	SERVIÇO	LOCAL / AMBIENTE	QTD. DO DIA	UN.	SITUAÇÃO
—	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	— LADO AMBOS	22,5	M²	—

OBSERVAÇÕES: DESCRIÇÃO: COORDENADA INICIAL: 266479.00 M E, 9564958.00 M S COORDENADA FINAL: 266032.00 M E, 9572386.00 M S

6. SEGURANÇA

ITEM VERIFICADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — BLOQUEIO, ETIQUETAGEM E PERMISSÃO DE TRABALHO — NR-10	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
TRABALHO EM ALTURA / ANDAIMES — NR-35 / NR-18	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
USO DE EPI E EPC	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO — POEIRA E RUÍDO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ROTAS DE FUGA E CIRCULAÇÃO LIBERADAS	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DESVIO DE TRÁFEGO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ESCAVAÇÕES E VALAS — ESCORAMENTO E PROTEÇÃO	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS — NR-12	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—

7. OCORRÊNCIAS, PARALISAÇÕES E INTERFERÊNCIAS

HORÁRIO	DESCRIÇÃO	IMPACTO NO PRAZO
—	BREVE PARALISAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA	NÃO

OBSERVAÇÕES: APÓS A DDS DO DIA, A EQUIPE SE DESTINOU À PONTO DE APOIO ONDE FOI ESTACIONADO A ROÇADEIRA E CONSTATOU-SE QUE O PNEU AINDA NECESSITAVA DE REPARO CORRETIVO, OPTOU EM LEVAR A ROÇADEIRA PARA À BORRACHARIA PARA RETIRAR O PNEU E FAZER UM REPARO COM MELHOR QUALIDADE, COMO O A ROÇADEIRA TERIA QUE AI NO SENTIDO DA SAÍDA DO PARQUE, OPTOU-SE E PERCORRER O TRECHO ATÉ A PORTEIRA DE ENTRADA FAZENDO O ROÇO NA LATERAL DIREITA, ENTÃO NA COORDENADA 266479.00 M E, 9564958.00 M S INDICOU-SE OS SERVIÇOS DE ROÇO MECANIZADO, E POR VOLTA DAS 10:30H DA MANHÃ A ROÇADEIRA CHEGOU ATÉ A COORDENADA 266032.00 M E, 9572386.00 M S PERCORRENDO UMA DISTANCIA DE 7,5KM (COM 1,50M DE LARGURA). A ROÇADEIRA FOI ESTACIONADA NA BORRACHARIA E O SERVIÇO DE RETIRADA DO PNEU E CONCLUSÃO DO REPARO SE ESTENDEU ATÉ AS 14:55H. AO RETORNAR ATÉ O PONTO DE APOIO, FOI EXECUTADO OS 7,50M DE ROÇO DO LADO POSTERIOR DA ESTRADA VICINAL. COM O TRECHO IGUALADO DA VIAGEM DE IDA, SE ENCERROU AS ATIVIDADES DO DIA. A ROÇADEIRO SE DESLOCOU ATÉ O PONTO DE APOIO PARA O PRÓXIMO DIA SE RETOMAR OS SERVIÇOS NA FAIXA DA LT-02P4, PARTINDO DO PONTO ONDE PAROU NA DATA DE 28/10/26 (TORRE DE Nº 02-3) – COORDENADA 262315-9564582 — IMPACTO: NÃO HOUVERAM IMPACTOS, POIS NO TRAJETO DA ROÇADEIRA ATÉ A OFICINA FOI EXECUTADO O ROÇO DE DETERMINADO TRECHO, TENDO ASSIM UMA PRODUÇÃO NA MEDIA ESPERADA. — PROVIDÊNCIA: MANUTENÇÃO CORRETIVA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO
01	ENTRADA DO PARQUE	02	TRECHO À EXECUTAR	03	ROÇO MECANIZADO	04	TRECHO À EXECUTAR
05	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	06	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	07	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	08	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
09	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	10	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	11	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	12	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
13	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	14	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	15	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	16	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
17	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	18	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	19	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	20	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
21	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	22	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	23	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	24	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
25	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	26	MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA	27	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	28	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
29	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	30	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	31	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	32	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
33	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	34	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	35	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	36	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
37	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	38	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	39	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	40	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO
41	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO	42	EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO				

AS FOTOGRAFIAS ACIMA ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO (FOTOS 01 A 04) E NO RF DO DIA, EM ANEXO (FOTOS 05 A 42), COM A MESMA NUMERAÇÃO.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA – RDO

APOIO TÉCNICO DE OBRA (ATO) – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BONS VENTOS DA SERRA 1

9. OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO	PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA: DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO.

10. ASSINATURAS — SITUAÇÃO: ENVIADO (A APROVAÇÃO NO SISMIN NÃO EQUIVALE A ASSINATURA DIGITAL)

TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUTORA	FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1
FÁBIO CORSI XIMENES SUPERVISOR	DAVID DE SOUSA FERNANDES 060133223-7	WILLIAM SOUSA DE FREITAS SUPERVISOR DE O&M – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: BYKQ-NWGM
MIN-RCT-CT024-0004-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO	CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS	0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS

VINCULADO A
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 05 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 06 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 07 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 08 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 09 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 10 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO	CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS	0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS

VINCULADO A
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 11 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

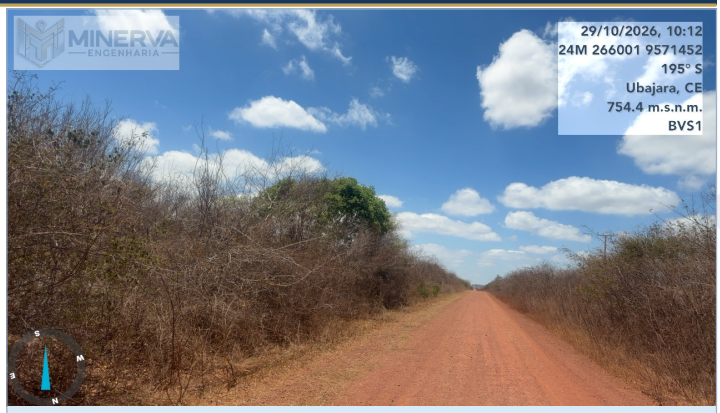


FOTO 12 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 13 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 14 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 15 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 16 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO	CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS	0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS

VINCULADO A
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 17 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 18 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 19 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 20 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 21 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 22 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO		CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS		0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS
VINCULADO A			
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 23 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 24 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 25 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 26 — MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA



FOTO 27 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 28 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO		CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS		0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS
VINCULADO A			
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 29 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 30 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 31 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 32 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 33 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 34 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO		CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS		0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS
VINCULADO A			
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 35 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 36 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 37 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 38 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 39 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 40 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

OBRA / SERVIÇO		CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS		0024-2026	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
ART DE EXECUÇÃO	ART DE FISCALIZAÇÃO	DATA DO RDO	FOTOGRAFIAS
—	—	29/10/2026	38 FOTOS

VINCULADO A
FOTOS DO DIA 29/10/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0004 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 41 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO



FOTO 42 — EXECUÇÃO DO ROÇO MECANIZADO

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

ASSINATURAS

TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA	FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1
FÁBIO CORSI XIMENES SUPERVISOR	WILLIAM SOUSA DE FREITAS SUPERVISOR DE O&M – CIÊNCIA EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: BYKQ-NWGM
MIN-RCT-CT024-0004-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
