DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

DIÁRIO Nº	MIN-DC-CT024-0005	**DATA**	30/10/2026 (SEXTA-FEIRA)	**RESPONSÁVEL**	FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
LOCAL / TRECHO	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)			**CLIMA**	MANHÃ: BOM TARDE: BOM
EQUIPE PRESENTE	1 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO · 1 ENGENHEIRO (TOTAL: 4)				
EQUIPAMENTOS	1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA · 2 VEÍCULOS DE APOIO				

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

PREVISTO EM 29/10/2026	DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. — FEITO

SERVIÇO EXECUTADO	LOCAL / TRECHO	LADO	QUANT.	SITUAÇÃO
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	TORRE 02-3 ATÉ 02-04	AMBOS	1.400,00 M²*	EM ANDAMENTO

* QUANTIDADE ESTIMADA NO CAMPO.

3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS


OCORRÊNCIA	IMPACTO NOS SERVIÇOS	PROVIDÊNCIA ADOTADA
LOGO APÓS A DDS DO DIA A EQUIPE FOI ENCAMINHADA PARA RETOMAR OS SERVIÇOS DA LIMPEZA DA FAIXA LT, CONTANTO AO SE INICIAR OS SERVIÇOS, A MÁQUINA TEVE UM NOVO FURO NO PNEU DEVIDA QUANTIDADE DE TOCOS DE ÁRVORES SECAS NO TRECHO ENTRE A TORRE 02-3 ATÉ 02-04. PERCORRENDO UM TOTAL DE 200M DE EXTENSÃO	OS SERVIÇOS FORAM PARALISADOS POIS HOUVE A NECESSIDADE DE RETIRAR UM DOS PNEUS	MANUTENÇÃO CORRETIVA

4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

SERVIÇOS PREVISTOS	DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO.
RECURSOS NECESSÁRIOS	ROÇADEIRA MECANIZADA
CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES.

SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.

5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA

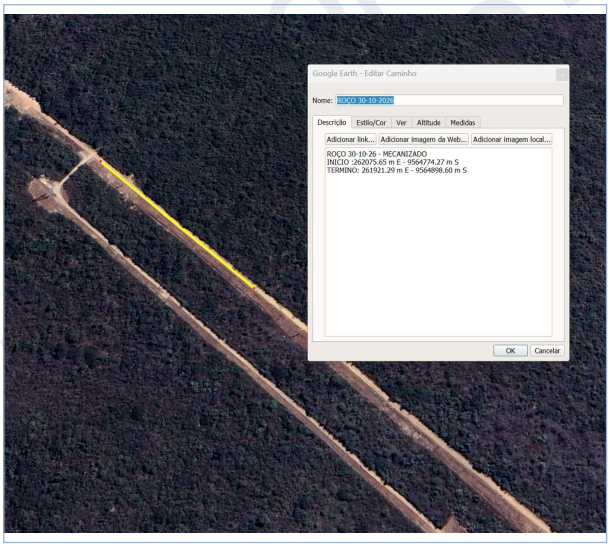

ROÇO 30/10/2026 — 200,00 M EXECUTADOS

SERVIÇO	LADO	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	QUANT.
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	AMBOS	200,00	3,50	1.400,00 M²*

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.



APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ABRIR O TRECHO NO GOOGLE MAPS

- INÍCIO (VERDE)
- FIM (VERMELHO)

COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 262075.65 N 9564774.27 · FIM: E 261921.29 N 9564898.60
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 198,20 M · EXTENSÃO MEDIDA: 200,00 M · DIFERENÇA: 1,80 M (0,9%)
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/-3.934799%2C-41.142686/-3.933671%2C-41.144073

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	UN	ATÉ ONTEM	HOJE	ACUMULADO
LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)	M²	17.272,57	1.400,00	18.672,57
ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	M²	22,50	—	22,50

SOMA DE TODOS OS DIÁRIOS DE CAMPO DESTA OBRA ATÉ 30/10/2026, POR SERVIÇO: ATÉ ONTEM + HOJE = ACUMULADO. A LINHA COM "—" EM HOJE NÃO TEVE EXECUÇÃO NESTE DIA.

DIAS DECORRIDOS: 5 · DIAS TRABALHADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA — DEMAIS FOTOS NO RF EM ANEXO



FOTO 01 — ROÇO REALIZADO



FOTO 02 — ROÇO REALIZADO



FOTO 03 — MANUTENÇÃO CORRETIVA



FOTO 04 — ROÇO REALIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

TEXTO CONFERIDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO RESPONSÁVEL: FRANCISCO GUILHERME ARAUJO

CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1	SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA
WILLIAM SOUSA DE FREITAS SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____	**FÁBIO CORSI XIMENES**

TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE	TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE
NOME: _____ DATA: ___/___/_____	**NOME:** _____ DATA: ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: KTE5-ZQDQ
MIN-DC-CT024-0005-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
