RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO PARCIAL 005 — REVISÃO 00

IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ENXURRADAS - BARRAGINHAS

CONTRATO DE EXECUÇÃO: CT Nº 0.0196.00/2025

CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO: CT Nº 0.0442.00/2025

DOCUMENTO TÉCNICO DE APOIO À MEDIÇÃO, AO ATESTO E AO CONTROLE DE CONFORMIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

CONTRATANTE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
EXECUTORA	WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA.
APOIO À FISCALIZAÇÃO	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.
OBJETO DO RELATÓRIO	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE BARRAGINHAS EXECUTADOS PELA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA
MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA	INHUMAS/GO, ITAUÇU/GO E TAQUARAL DE GOIÁS/GO
CÓDIGO DO DOCUMENTO	**MIN-RTF-CT0442-2026-RP005-R00**
DATA DE REFERÊNCIA	12/11/2026
PERÍODO	03/10/2026 A 12/11/2026
PROPRIEDADES	6 COMPLETA(S) • 1 ATUALIZAÇÃO(ÕES) • 7 RESUMIDA(S)

PROPRIEDADES DESTE RELATÓRIO

NOVAS — APRESENTAÇÃO COMPLETA (6)

PROPRIEDADE	PRODUTOR	MUNICÍPIO	PREV.	EXEC.	APROV.	APRESENTAÇÃO
12AL005	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	INHUMAS/GO	11	7	7	**COMPLETA**
12AL034	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	INHUMAS/GO	3	5	5	**COMPLETA**
12AL035	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	INHUMAS/GO	18	15	15	**COMPLETA**
12AL038	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	INHUMAS/GO	14	14	14	**COMPLETA**
12AL068	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	INHUMAS/GO	3	3	3	**COMPLETA**
12AL115	MILTON JACINTO DA SILVA	INHUMAS/GO	16	12	12	**COMPLETA**

ATUALIZAÇÕES — FATOS APÓS O RELATÓRIO ANTERIOR (1)

PROPRIEDADE	PRODUTOR	MUNICÍPIO	PREV.	EXEC.	APROV.	APRESENTAÇÃO
12AL033	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	INHUMAS/GO	39	37	37	**ATUALIZAÇÃO**

CONCLUÍDAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES — RESUMO (7)

PROPRIEDADE	PRODUTOR	MUNICÍPIO	PREV.	EXEC.	APROV.	APRESENTAÇÃO
12AL010	JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA	INHUMAS/GO	39	30	30	RESUMO (RP004-R01)
12AL025	ANTÔNIO MEDANHA	INHUMAS/GO	29	27	27	RESUMO (RP004-R01)
12AL037	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	INHUMAS/GO	5	1	1	RESUMO (RP004-R01)
12AL039	ANTÔNIO MEDANHA	INHUMAS/GO	21	21	21	RESUMO (RP004-R01)
12AL042	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	INHUMAS/GO	4	3	3	RESUMO (RP004-R01)
12AL053	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	INHUMAS/GO	2	1	1	RESUMO (RP004-R01)
12AL077	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	INHUMAS/GO	6	4	4	RESUMO (RP004-R01)

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

SUMÁRIO

CONTROLE DOCUMENTAL 3
INTRODUÇÃO 3
FINALIDADE, ABRANGÊNCIA E PREMISSAS DE FISCALIZAÇÃO 3
IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADES 3
QUANTITATIVOS E VALORES CONTRATADOS 3
COMPATIBILIZAÇÃO PRELIMINAR DOS QUANTITATIVOS POR PROPRIEDADE 4
EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO 4
EQUIPAMENTOS E RECURSOS APLICADOS NAS INSPEÇÕES 4
METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CONFORMIDADE 5
ESPECIFICAÇÃO DAS FICHAS DE FISCALIZAÇÃO POR PROPRIEDADE 5
PONTOS PADRONIZADOS PARA MEDIÇÃO DAS BARRAGINHAS 6
PROPRIEDADES VISITADAS 6
PROPRIEDADES CONCLUÍDAS E RECEBIDAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES 7
ATUALIZAÇÕES DE PROPRIEDADES APRESENTADAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES 8
PROPRIEDADE 12AL005 – LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE 10
PROPRIEDADE 12AL034 – DIVINO BARBOSA QUEIROZ 15
PROPRIEDADE 12AL035 – ANTÔNIO LIMA DE ABREU 19
PROPRIEDADE 12AL038 – ANTÔNIO JACINTO DA SILVA 25
PROPRIEDADE 12AL068 – ANTÔNIO JACINTO DA SILVA 31
PROPRIEDADE 12AL115 – MILTON JACINTO DA SILVA 35
CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO RELATÓRIO 40
COMPARATIVO TÉCNICO ANTES X DEPOIS DAS CORREÇÕES 40
APANHADO GERAL DAS BARRAGINHAS APROVADAS — ACUMULADO ATÉ 12/11/2026 42
ANEXOS 48

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CONTROLE DOCUMENTAL

CODIFICAÇÃO DOCUMENTAL: MIN-RTF-CT0442-2026-RP005-R00LEGENDA: MIN=MINERVA;

RTF=RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO;

CT0442=CONTRATO 0.0442.00/2025;

2026=ANO;

RP005=RELATÓRIO PARCIAL 005;

R00=REVISÃO 00.

INTRODUÇÃO

FINALIDADE, ABRANGÊNCIA E PREMISSAS DE FISCALIZAÇÃO

O PRESENTE RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDA AS INFORMAÇÕES DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA., NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 0.0196.00/2025, FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF.

O DOCUMENTO TEM POR FINALIDADE REGISTRAR OS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONTROLE DE CONFORMIDADE, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS BACIAS DE CAPTAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ENXURRADAS, DENOMINADAS BARRAGINHAS, VINCULADAS ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NO ESTADO DE GOIÁS.

A ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO RESTRINGE-SE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO PELA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA. NÃO INTEGRAM ESTE DOCUMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS POR OUTRAS EMPRESAS, INTERVENÇÕES NÃO VINCULADAS AO CONTRATO Nº 0.0196.00/2025 OU FRENTES DE TRABALHO NÃO LIBERADAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

AS BARRAGINHAS SÃO ESTRUTURAS MECÂNICAS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA DESTINADAS À INTERCEPTAÇÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL, RETENÇÃO TEMPORÁRIA DAS ENXURRADAS E FAVORECIMENTO DA INFILTRAÇÃO. A VERIFICAÇÃO TÉCNICA DESSAS ESTRUTURAS COMPREENDE A ANÁLISE DA LOCAÇÃO, GEOMETRIA, PROFUNDIDADE, DIÂMETROS, VERTEDOURO, CRISTA, CAMALHÃO, TALUDES, ACABAMENTO, ESTABILIDADE E ADERÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADES

A IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS E DE SUAS RESPONSABILIDADES É NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A RASTREABILIDADE DA EXECUÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DOS REGISTROS TÉCNICOS QUE SUBSIDIARÃO AS MEDIÇÕES E OS ATESTOS DOS SERVIÇOS.

QUADRO 1.1. IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADES ASSOCIADAS À FISCALIZAÇÃO

ELEMENTO	INFORMAÇÃO	RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO PROCESSO
CONTRATANTE	CODEVASF	GESTÃO CONTRATUAL, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E ATESTO DOS SERVIÇOS. ATUALMENTE, O APOIO À FISCALIZAÇÃO SUBSIDIA OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA COMPANHIA.
EMPRESA EXECUTORA	WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA.	EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES E CORREÇÃO DE EVENTUAIS NÃO CONFORMIDADES.
APOIO À FISCALIZAÇÃO	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.	CONFERÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO, VALIDAÇÃO DE QUANTITATIVOS, MEDIÇÃO, GEORREFERENCIAMENTO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS.
CONTRATO FISCALIZADO	CT Nº 0.0196.00/2025	INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ESTABELECE O OBJETO, VALORES, PRAZOS, DOCUMENTOS VINCULADOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

FONTE: CONTRATO CT Nº 0.0196.00/2025 E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO.

QUADRO 1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO

RNP	NOME	FORMAÇÃO
060133223-7	DAVID DE SOUSA FERNANDES	ENGENHEIRO CIVIL / PÓS-GRAD.LATO SENSU ENGA. AMBIENTAL E SANEAM. BÁSICO / PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS / ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

QUANTITATIVOS E VALORES CONTRATADOS

OS QUANTITATIVOS E VALORES APRESENTADOS NO QUADRO A SEGUIR CONSTITUEM A REFERÊNCIA CONTRATUAL PARA O ACOMPANHAMENTO, A MEDIÇÃO E A VALIDAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA. A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR OS QUANTITATIVOS POR ITEM DE SERVIÇO, DISTINGUINDO AS BACIAS NOVAS, AS BACIAS EXISTENTES E AS BACIAS DE ESTRADA COM BIGODE, CONFORME A COMPOSIÇÃO CONTRATUAL.

QUADRO 2. QUANTITATIVOS E VALORES CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO PELA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA

ITEM CONTRATUAL	INTERVENÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	PLACAS DE OBRA	11,7	M²	R$ 537,75	R$ 6.292,97
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 4 M DE RAIO	BACIA 4 M DE RAIO	6	UNID.	R$ 394,51	R$ 2.367,06
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 6 M DE RAIO	BACIA 6 M DE RAIO	338	UNID.	R$ 701,31	R$ 237.042,78
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 6 M DE RAIO	BACIA DE ESTRADA COM BIGODE 6 M DE RAIO	24	UNID.	R$ 701,31	R$ 16.831,44
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 6 M DE RAIO	BACIA EXISTENTE 6 M DE RAIO	24	UNID.	R$ 701,31	R$ 16.831,44
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 9 M DE RAIO	BACIA 9 M DE RAIO	5	UNID.	R$ 1.340,66	R$ 6.703,30
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 12 M DE RAIO	BACIA 12 M DE RAIO	22	UNID.	R$ 2.026,63	R$ 44.585,86

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ITEM CONTRATUAL	INTERVENÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS - 12 M DE RAIO	BACIA EXISTENTE 12 M DE RAIO	9	UNID.	R$ 2.026,63	R$ 18.239,67
TOTAL		428	UNID.		R$ 348.894,52

FONTE: PROPOSTA FINANCEIRA E CONTRATO DE EXECUÇÃO DA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA.

COMPATIBILIZAÇÃO PRELIMINAR DOS QUANTITATIVOS POR PROPRIEDADE

A PLANILHA OPERACIONAL POR PROPRIEDADE DEVE SER UTILIZADA COMO BASE DE PROGRAMAÇÃO DAS VISTORIAS. CONTUDO, PARA EFEITO DE MEDIÇÃO, CADA INTERVENÇÃO DEVERÁ SER CLASSIFICADA DE ACORDO COM O ITEM CONTRATUAL CORRESPONDENTE. A COMPATIBILIZAÇÃO PRELIMINAR INDICA A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DAS BACIAS NOVAS, BACIAS EXISTENTES E BACIAS DE ESTRADA COM BIGODE, A FIM DE EVITAR DIVERGÊNCIAS ENTRE A PROGRAMAÇÃO DE CAMPO E O SALDO CONTRATUAL.

QUADRO 3. COMPATIBILIZAÇÃO PRELIMINAR DOS QUANTITATIVOS POR PROPRIEDADE

CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA	PLANILHA OPERACIONAL	CONTRATO WM	DIFERENÇA PRELIMINAR	ENCAMINHAMENTO TÉCNICO
BACIA 4 M	7	6	+1	CONFERIR EM CAMPO SE HÁ REALOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE RAIO OU ERRO DE LANÇAMENTO.
BACIA 6 M	354	338	+16	RECLASSIFICAR AS UNIDADES, VERIFICANDO SE PARTE DO QUANTITATIVO CORRESPONDE A BACIA EXISTENTE OU BACIA DE ESTRADA COM BIGODE.
BACIA 9 M	8	5	+3	VERIFICAR COMPATIBILIDADE COM O PROJETO E COM A PROPOSTA FINANCEIRA.
BACIA 12 M	20	22	-2	CONFERIR SE AS UNIDADES REMANESCENTES FORAM REGISTRADAS COMO EXISTENTES 12 M OU SE HÁ PENDÊNCIA DE LANÇAMENTO.
BACIA DE ESTRADA COM BIGODE 6 M	NÃO SEGREGADO	24	A CLASSIFICAR	INSERIR CAMPO ESPECÍFICO NAS FICHAS E NO CONTROLE DE MEDIÇÃO.
BACIA EXISTENTE 6 M	NÃO SEGREGADO	24	A CLASSIFICAR	DISTINGUIR RECUPERAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE BACIA EXISTENTE DE CONSTRUÇÃO DE BACIA NOVA.
BACIA EXISTENTE 12 M	NÃO SEGREGADO	9	A CLASSIFICAR	REGISTRAR SEPARADAMENTE PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ITEM CONTRATUAL.

FONTE: PLANILHA OPERACIONAL POR PROPRIEDADE E QUANTITATIVOS CONTRATADOS DA WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA.

A CONFERÊNCIA DEFINITIVA DEVERÁ SER FORMALIZADA NOS DOCUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, MEDIANTE REGISTRO DO CÓDIGO DA INTERVENÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE BACIA, MEDIÇÕES DOS PONTOS PADRONIZADOS, FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS E PARECER CONCLUSIVO DE CONFORMIDADE.

EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

A EQUIPE TÉCNICA DEVERÁ ATUAR DE FORMA COORDENADA, COM ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS DE CAMPO, DE MODO A ASSEGURAR RASTREABILIDADE DOS REGISTROS, CONSISTÊNCIA DAS MEDIÇÕES E EMISSÃO DE RELATÓRIOS TECNICAMENTE VERIFICÁVEIS.

QUADRO 4. COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

FUNÇÃO	PERFIL TÉCNICO	ATRIBUIÇÕES	REGISTROS/ENTREGÁVEIS
ENGENHEIRO PLENO	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO	COORDENAÇÃO TÉCNICA DAS VISTORIAS, ANÁLISE DE CONFORMIDADE, AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, VALIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO.	RELATÓRIO TÉCNICO, PARECER DE MEDIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE CORREÇÃO.
TÉCNICO AMBIENTAL / GEOPROCESSAMENTO	APOIO TÉCNICO E GEOESPACIAL	CONFERÊNCIA DE COORDENADAS, OPERAÇÃO DE GPS/GNSS, ORGANIZAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS E APOIO À ELABORAÇÃO DE SHAPEFILES.	BANCO DE DADOS GEOESPACIAL, COORDENADAS, MAPAS E PLANILHAS DE CAMPO.
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA / AUXILIAR DE CAMPO	APOIO OPERACIONAL ÀS MEDIÇÕES	APOIO NA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS 1V A 13F, MEDIÇÕES AUXILIARES, MARCAÇÃO EM CAMPO E APOIO AO REGISTRO FOTOGRÁFICO.	CADERNETAS DE CAMPO, APOIO ÀS FICHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUPORTE DOCUMENTAL E CONTROLE DE ARQUIVOS	ORGANIZAÇÃO DE FICHAS, FOTOGRAFIAS, RELATÓRIOS, ANEXOS DE PROCESSAMENTO, CONTROLE DE PENDÊNCIAS E PROTOCOLO DOCUMENTAL.	ARQUIVOS CONSOLIDADOS, CONTROLE DE ENTREGÁVEIS E ÍNDICE DOCUMENTAL.

FONTE: PLANO DE TRABALHO DA MINERVA ENGENHARIA E EXIGÊNCIAS DE RELATÓRIOS DA EQUIPE DE APOIO.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS APLICADOS NAS INSPEÇÕES

OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS INSPEÇÕES DEVEM PERMITIR A COLETA DE DADOS COMPATÍVEIS COM A PRECISÃO REQUERIDA PARA A VERIFICAÇÃO GEOMÉTRICA DAS BARRAGINHAS E PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS POR PROPRIEDADE.

QUADRO 5.1. EQUIPAMENTOS E RECURSOS MÍNIMOS DE CAMPO

EQUIPAMENTO/RECURSO	FINALIDADE	EXIGÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA	PRODUTO ASSOCIADO
NOTEBOOK	DESLOCAMENTO DA EQUIPE E ACESSO ÀS FRENTES DE SERVIÇO	COMPATÍVEL COM ESTRADAS RURAIS E ACESSO A ÁREAS DE INTERVENÇÃO	REGISTRO DE DESLOCAMENTO E APOIO LOGÍSTICO
GPS DE NAVEGAÇÃO	LOCALIZAÇÃO PRELIMINAR DAS INTERVENÇÕES	CAPACIDADE DE LEITURA DE COORDENADAS E APOIO À NAVEGAÇÃO	REGISTRO DE LOCALIZAÇÃO E APOIO À PROGRAMAÇÃO DE ROTAS
RECEPTOR GNSS/RTK L1/L2 OU SUPERIOR	LEVANTAMENTO DOS PONTOS PADRONIZADOS E COTAS	COLETA DE COORDENADAS UTM, COTAS E DADOS BRUTOS/PROCESSADOS	PLANILHA DE PONTOS, RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO E ARQUIVO GEOESPACIAL
TRENA E FERRAMENTAS AUXILIARES	CONFERÊNCIA DE DIMENSÕES COMPLEMENTARES	INSTRUMENTOS COMPATÍVEIS COM MEDIÇÕES DE CAMPO	APOIO À FICHA DE MEDIÇÃO E VALIDAÇÃO DIMENSIONAL

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

EQUIPAMENTO/RECURSO	FINALIDADE	EXIGÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA	PRODUTO ASSOCIADO
TELEFONE/CÂMERA COM GEORREFERENCIAMENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO	FOTOGRAFIAS COM COORDENADAS, DATA E HORÁRIO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO POR INTERVENÇÃO
SOFTWARE DE GEOPROCESSAMENTO	TRATAMENTO DOS DADOS E CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS	CAPACIDADE PARA PROCESSAMENTO DE PLANILHAS, ARQUIVOS GNSS E SHAPEFILES	BANCO DE DADOS, MAPAS, TABELAS E ARQUIVOS DIGITAIS
EPIS COMPLETOS	SEGURANÇA DA EQUIPE EM CAMPO	COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES E CONDIÇÕES LOCAIS	CONTROLE DE SEGURANÇA OPERACIONAL

FONTE: PLANO DE TRABALHO DA MINERVA ENGENHARIA, EXIGÊNCIAS DE RELATÓRIOS E FICHA DE FISCALIZAÇÃO.

QUADRO 5.2. IDENTIFICAÇÃO E DADOS APLICADOS NAS INSPEÇÕES

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CONTRATO DE EXECUÇÃO	CT Nº 0.0196.00/2025	CONTRATADA EXECUTORA	WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO	CT Nº 0.0442.00/2025	EMPRESA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.
EQUIPAMENTO GNSS/RTK- BASE	S6 PLUS – GNSS7 – COMNAV Nº SERIE S61L04252	EQUIPAMENTO GNSS/RTK- ROVER	S6 PLUS – GNSS7 – COMNAV Nº SERIE S61L04260
SOFTWARE DO GNSS RTK	SURVEY MASTER DA COMNAV	PROCESSAMENTO	COMPASS RECEIVER - COMPASS SOLUTION
SISTEMA GEODÉSICO / ZONA	SIRGAS 2000 / 22S	PROJEÇÃO/COORDENADAS	UTM / GRAUS DECIMAIS, CONFORME FICHA

FONTE: PLANO DE TRABALHO, CONTRATO DE EXECUÇÃO E INFORMAÇÕES DE CAMPO A SEREM CONSOLIDADAS PELA FISCALIZAÇÃO.

METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CONFORMIDADE

PLANEJAMENTO DAS INSPEÇÕES: ANÁLISE DO CRONOGRAMA DA EXECUTORA, CONFIRMAÇÃO DAS FRENTES LIBERADAS, DEFINIÇÃO DE ROTAS E CONFERÊNCIA PRÉVIA DOS CÓDIGOS DAS INTERVENÇÕES.

INSPEÇÃO DE CAMPO: VERIFICAÇÃO DA LOCAÇÃO, GEOMETRIA, ESTABILIDADE, ACABAMENTO, VERTEDOURO, CRISTA, TALUDES, CAMALHÃO E EVENTUAIS IMPEDIMENTOS TÉCNICOS OU AMBIENTAIS.

MEDIÇÃO GEORREFERENCIADA: LEVANTAMENTO DOS PONTOS 1V A 13F COM EQUIPAMENTO GNSS/RTK OU EQUIVALENTE, COM REGISTRO DE COORDENADAS UTM, COTAS E IDENTIFICAÇÃO DO PONTO NO EQUIPAMENTO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS COM DATA, HORÁRIO E COORDENADAS, CONTEMPLANDO OS ÂNGULOS OBRIGATÓRIOS E AS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS RELEVANTES.

ANÁLISE TÉCNICA: COMPARAÇÃO DOS DADOS COLETADOS COM O PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VI, QUANTITATIVOS CONTRATADOS E ORIENTAÇÕES DA CODEVASF.

CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO: EMISSÃO DE PARECER POR INTERVENÇÃO, COM CLASSIFICAÇÃO APROVADA/NÃO APROVADA, PENDÊNCIAS, RECOMENDAÇÃO DE CORREÇÃO, MEDIÇÃO OU NOVA VISTORIA.

ESPECIFICAÇÃO DAS FICHAS DE FISCALIZAÇÃO POR PROPRIEDADE

A FICHA DE FISCALIZAÇÃO POR PROPRIEDADE DEVERÁ CONSOLIDAR OS DADOS CADASTRAIS, AS MEDIÇÕES, OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS, A CLASSIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO E O PARECER TÉCNICO DE CONFORMIDADE. ESSE PROCEDIMENTO ASSEGURA RASTREABILIDADE ENTRE O PROJETO, A EXECUÇÃO, A MEDIÇÃO E O ATESTO.

QUADRO 6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS FICHAS DE FISCALIZAÇÃO POR PROPRIEDADE

BLOCO DA FICHA	CONTEÚDO OBRIGATÓRIO	FORMA DE APRESENTAÇÃO	CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO
DADOS GERAIS	Nº DO CONTRATO, CONTRATADA, PROPRIEDADE, PROPRIETÁRIO, MUNICÍPIO, MICROBACIA, DATA E NÚMERO DE INTERVENÇÕES.	CABEÇALHO DA FICHA POR PROPRIEDADE.	IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE FISCALIZADA.
IDENTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO	CÓDIGO DA BARRAGINHA, TIPO, RAIO PREVISTO, CONDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/EXISTENTE E MAQUINÁRIO EMPREGADO.	TABELA OU FICHA INDIVIDUAL POR INTERVENÇÃO.	COMPATIBILIDADE COM A NOMENCLATURA DO PROJETO E COM O ITEM CONTRATUAL.
MEDIÇÕES DIMENSIONAIS	PROFUNDIDADE, DIÂMETROS, CRISTA, CAMALHÃO, LARGURA E PROFUNDIDADE DO VERTEDOURO, VOLUME ESTIMADO E PONTOS 1V A 13F.	PLANILHA DE MEDIÇÃO VINCULADA AO CROQUI PADRÃO.	COTAS EM METROS COM DUAS CASAS DECIMAIS E COMPARAÇÃO COM OS MÍNIMOS ESPECIFICADOS.
COORDENADAS E COTAS	COORDENADAS UTM, COORDENADAS EM GRAUS DECIMAIS QUANDO APLICÁVEL E ALTITUDE ORTOMÉTRICA/COTA DOS PONTOS.	TABELA DE PONTOS E RELATÓRIO GNSS/RTK.	RASTREABILIDADE DO PONTO MEDIDO E PRECISÃO DO LEVANTAMENTO.
FOTOGRAFIAS	MONTANTE PARA JUSANTE, VISTA LATERAL, JUSANTE PARA MONTANTE, VERTEDOURO E COMPACTAÇÃO/SOLO COMPACTADO.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO.	IMAGENS COM CÓDIGO DA INTERVENÇÃO, DATA, HORA E COORDENADAS.
ANEXOS TÉCNICOS	DADOS BRUTOS RINEX/NATIVO, RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, SHAPEFILE E TABELA DE ATRIBUTOS.	APENSO DIGITAL VINCULADO AO RELATÓRIO.	COMPATIBILIDADE ENTRE DADOS BRUTOS, PROCESSAMENTO E PRODUTOS FINAIS.
CONCLUSÃO TÉCNICA	APROVADA, NÃO APROVADA OU APROVADA COM RESSALVA; PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÃO DE CORREÇÃO OU MEDIÇÃO.	PARECER CONCLUSIVO POR INTERVENÇÃO.	BASE PARA ATESTO, GLOSA, CORREÇÃO OU NOVA VISTORIA.

FONTE: EXIGÊNCIAS DE RELATÓRIOS DA EQUIPE DE APOIO, CROQUI DE MEDIÇÃO E FICHA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRAGINHA.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PONTOS PADRONIZADOS PARA MEDIÇÃO DAS BARRAGINHAS

A MEDIÇÃO DAS BARRAGINHAS DEVERÁ OBSERVAR A NOMENCLATURA PADRONIZADA DOS PONTOS DE CONTROLE, PERMITINDO A AFERIÇÃO OBJETIVA DA COTA DE VERTIMENTO, LARGURA DO VERTEDOURO, CRISTA, DIÂMETROS, PROFUNDIDADE E EVENTUAIS PONTOS DE FUGA. O CROQUI A SEGUIR DEVERÁ SER ADOTADO COMO REFERÊNCIA PARA PREENCHIMENTO DAS FICHAS E PLANILHAS DE MEDIÇÃO.

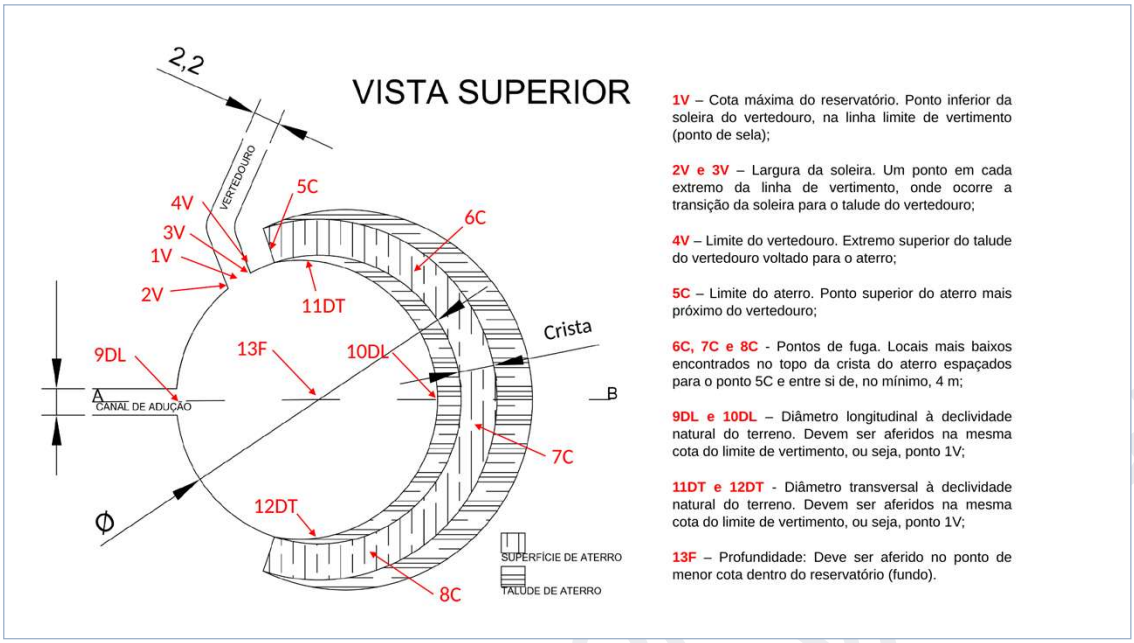


FIGURA 1. DETALHE DA BARRAGINHA E CROQUI PADRÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO

FONTE: CROQUI PADRÃO DE PONTOS DE MEDIÇÃO DAS BARRAGINHAS.

QUADRO 7. PONTOS PADRONIZADOS PARA MEDIÇÃO DAS BARRAGINHAS

PONTO	ELEMENTO AFERIDO	POSICIONAMENTO NO CAMPO	APLICAÇÃO NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE
1V	COTA MÁXIMA DO RESERVATÓRIO / SOLEIRA DO VERTEDOURO	PONTO INFERIOR DA SOLEIRA DO VERTEDOURO, NA LINHA LIMITE DE VERTIMENTO.	REFERÊNCIA ALTIMÉTRICA PARA VERTIMENTO E COMPARAÇÃO DOS DEMAIS PONTOS.
2V E 3V	LARGURA DA SOLEIRA DO VERTEDOURO	EXTREMOS DA LINHA DE VERTIMENTO, NA TRANSIÇÃO DA SOLEIRA PARA O TALUDE DO VERTEDOURO.	VERIFICAÇÃO DA LARGURA ÚTIL E REGULARIDADE GEOMÉTRICA DO VERTEDOURO.
4V	LIMITE DO VERTEDOURO	EXTREMO SUPERIOR DO TALUDE DO VERTEDOURO VOLTADO PARA O ATERRO.	VERIFICAÇÃO DA GEOMETRIA E DA PROFUNDIDADE DO VERTEDOURO.
5C	LIMITE DO ATERRO	PONTO SUPERIOR DO ATERRO MAIS PRÓXIMO DO VERTEDOURO.	AFERIÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE ATERRO, VERTEDOURO E CRISTA.
6C, 7C E 8C	PONTOS BAIXOS DA CRISTA / PONTOS DE FUGA	LOCAIS MAIS BAIXOS NO TOPO DA CRISTA, COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 4 M ENTRE SI E EM RELAÇÃO AO PONTO 5C.	IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE FUGA, REBAIXAMENTO DA CRISTA OU NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO.
9DL E 10DL	DIÂMETRO LONGITUDINAL À DECLIVIDADE NATURAL DO TERRENO	PONTOS AFERIDOS NA MESMA COTA DO LIMITE DE VERTIMENTO, TOMANDO O PONTO 1V COMO REFERÊNCIA.	CONTROLE DO DIÂMETRO LONGITUDINAL E DA CAPACIDADE GEOMÉTRICA DO RESERVATÓRIO.
11DT E 12DT	DIÂMETRO TRANSVERSAL À DECLIVIDADE NATURAL DO TERRENO	PONTOS AFERIDOS NA MESMA COTA DO LIMITE DE VERTIMENTO, TOMANDO O PONTO 1V COMO REFERÊNCIA.	CONTROLE DO DIÂMETRO TRANSVERSAL E REGULARIDADE DA BACIA.
13F	PROFUNDIDADE DA BACIA	PONTO DE MENOR COTA NO FUNDO DO RESERVATÓRIO.	DETERMINAÇÃO DA PROFUNDIDADE EFETIVA E APOIO AO CÁLCULO DO VOLUME DE ACUMULAÇÃO.

OS DADOS COLETADOS DEVERÃO SER APRESENTADOS COM NOMENCLATURA PADRONIZADA, COORDENADAS UTM E COTAS EM METROS COM DUAS CASAS DECIMAIS, ACOMPANHADOS DOS DADOS BRUTOS E RELATÓRIOS DE PROCESSAMENTO, QUANDO UTILIZADO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

PROPRIEDADES VISITADAS

ESTE CAPÍTULO APRESENTA A CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDAS ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA DO PRESENTE RELATÓRIO PARCIAL, CONTEMPLANDO 14 (QUATORZE) PROPRIEDADES RURAIS DO CONTRATO Nº 0.0442.00/2025: 7 (SETE) JÁ CONCLUÍDAS E RECEBIDAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES, APRESENTADAS DE FORMA RESUMIDA NO ITEM SEGUINTE, E 6 (SEIS) FISCALIZADAS NO PERÍODO DESTE RELATÓRIO, APRESENTADAS COM O DETALHAMENTO COMPLETO. A PROPRIEDADE 12AL033, JÁ APRESENTADA EM RELATÓRIO ANTERIOR, TEVE BACIAS REMEDIDAS (RECONFERÊNCIA EM CAMPO) APÓS AQUELE RELATÓRIO, APRESENTADAS NO ITEM "BACIAS REMEDIDAS" COM O COMPARATIVO ANTES X DEPOIS.

PROPRIEDADE	PRODUTOR	PREVISTAS	EXECUTADAS RTK	REMANESCENTE	APROVADAS	PARA CORREÇÃO	EM AVALIAÇÃO	AVANÇO FÍSICO (%)	SITUAÇÃO
12AL010	JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA	39	30	9	30	0	0	76,92 %	CONCLUÍDA COM DESISTÊNCIAS
12AL025	ANTÔNIO MEDANHA	29	27	2	27	0	0	93,10 %	CONCLUÍDA COM DESISTÊNCIAS

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE	PRODUTOR	PREVISTAS	EXECUTADAS RTK	REMANESCENTE	APROVADAS	PARA CORREÇÃO	EM AVALIAÇÃO	AVANÇO FÍSICO (%)	SITUAÇÃO
12AL037	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	5	1	4	1	0	0	20,00 %	CONCLUÍDA COM DESISTÊNCIAS
12AL039	ANTÔNIO MEDANHA	21	21	0	21	0	0	100,00 %	CONCLUÍDA
12AL042	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	4	3	1	3	0	0	75,00 %	CONCLUÍDA COM DESISTÊNCIAS
12AL053	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	2	1	1	1	0	0	50,00 %	CONCLUÍDA COM DESISTÊNCIAS
12AL077	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	6	4	2	4	0	0	66,67 %	CONCLUÍDA COM DESISTÊNCIAS
12AL033	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	39	37	2	37	0	0	94,87 %	CONCLUÍDA APÓS REMEDIÇÃO
12AL005	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	11	7	4	7	0	0	63,64 %	CONCLUÍDA
12AL034	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	3	5	0	5	0	0	100,00 %	CONCLUÍDA
12AL035	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	18	15	3	15	0	0	83,33 %	CONCLUÍDA
12AL038	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	14	14	0	14	0	0	100,00 %	CONCLUÍDA
12AL068	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	3	3	0	3	0	0	100,00 %	CONCLUÍDA
12AL115	MILTON JACINTO DA SILVA	16	12	4	12	0	0	75,00 %	CONCLUÍDA
TOTAL	-	210	180	32	180	0	0	85,71 %	CONSOLIDADO

QUADRO CONSOLIDADO DAS PROPRIEDADES NA DATA DE REFERÊNCIA.

PROPRIEDADES CONCLUÍDAS E RECEBIDAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES

AS PROPRIEDADES RELACIONADAS A SEGUIR TIVERAM A FISCALIZAÇÃO CONCLUÍDA E FORAM RECEBIDAS EM RELATÓRIOS PARCIAIS ANTERIORES, NOS QUAIS CONSTAM O DETALHAMENTO COMPLETO (IDENTIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS, CONTROLE INDIVIDUAL, COORDENADAS GNSS/RTK, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO). NESTE RELATÓRIO, SÃO APRESENTADAS APENAS DE FORMA RESUMIDA, PARA MANTER A CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO, SEM REPETIÇÃO DOS QUADROS DETALHADOS. OS QUANTITATIVOS PREVISTOS CONSIDERAM SOMENTE AS BARRAGINHAS, OBJETO DESTE CONTRATO.

PROPRIEDADE	PRODUTOR	PREVISTAS	EXECUTADAS RTK	DESISTÊNCIAS	APROVADAS	PARA CORREÇÃO	EM AVALIAÇÃO	AVANÇO FÍSICO (%)	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO
12AL010	JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA	39	30	9	30	0	0	76,92 %	APRESENTADA DESDE O RP001-R02; DETALHAMENTO NO RP004-R01
12AL025	ANTÔNIO MEDANHA	29	27	2	27	0	0	93,10 %	APRESENTADA DESDE O RP002-R01; DETALHAMENTO NO RP004-R01
12AL037	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	5	1	4	1	0	0	20,00 %	DETALHAMENTO NO RP004-R01
12AL039	ANTÔNIO MEDANHA	21	21	0	21	0	0	100,00 %	APRESENTADA DESDE O RP002-R01; DETALHAMENTO NO RP004-R01
12AL042	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	4	3	1	3	0	0	75,00 %	APRESENTADA DESDE O RP001-R02; DETALHAMENTO NO RP004-R01
12AL053	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	2	1	1	1	0	0	50,00 %	APRESENTADA DESDE O RP001-R02; DETALHAMENTO NO RP004-R01
12AL077	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	6	4	2	4	0	0	66,67 %	DETALHAMENTO NO RP004-R01

PROPRIEDADES CONCLUÍDAS — RESUMO (DETALHAMENTO NO RELATÓRIO INDICADO).

PROPRIEDADE 12AL010 – JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA: 39 (TRINTA E NOVE) BARRAGINHAS PREVISTAS, 30 (TRINTA) EXECUTADAS E 30 (TRINTA) APROVADAS (76,92 % DE AVANÇO FÍSICO); 9 (NOVE) INTERVENÇÕES REMANESCENTES CORRESPONDEM A DESISTÊNCIAS DO PRODUTOR RURAL. DETALHAMENTO NO RP004-R01 (APRESENTADA DESDE O RP001-R02).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL025 – ANTÔNIO MEDANHA: 29 (VINTE E NOVE) BARRAGINHAS PREVISTAS, 27 (VINTE E SETE) EXECUTADAS E 27 (VINTE E SETE) APROVADAS (93,10 % DE AVANÇO FÍSICO); 2 (DUAS) INTERVENÇÕES REMANESCENTES CORRESPONDEM A DESISTÊNCIAS DO PRODUTOR RURAL. DETALHAMENTO NO RP004-R01 (APRESENTADA DESDE O RP002-R01).

PROPRIEDADE 12AL037 – ANTÔNIO LIMA DE ABREU: 5 (CINCO) BARRAGINHAS PREVISTAS, 1 (UMA) EXECUTADA E 1 (UMA) APROVADA (20,00 % DE AVANÇO FÍSICO); 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES REMANESCENTES CORRESPONDEM A DESISTÊNCIAS DO PRODUTOR RURAL. DETALHAMENTO NO RP004-R01.

PROPRIEDADE 12AL039 – ANTÔNIO MEDANHA: 21 (VINTE E UMA) BARRAGINHAS PREVISTAS, 21 (VINTE E UMA) EXECUTADAS E 21 (VINTE E UMA) APROVADAS (100,00 % DE AVANÇO FÍSICO). DETALHAMENTO NO RP004-R01 (APRESENTADA DESDE O RP002-R01).

PROPRIEDADE 12AL042 – ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO: 4 (QUATRO) BARRAGINHAS PREVISTAS, 3 (TRÊS) EXECUTADAS E 3 (TRÊS) APROVADAS (75,00 % DE AVANÇO FÍSICO); 1 (UMA) INTERVENÇÃO REMANESCENTE CORRESPONDE A DESISTÊNCIAS DO PRODUTOR RURAL. DETALHAMENTO NO RP004-R01 (APRESENTADA DESDE O RP001-R02).

PROPRIEDADE 12AL053 – ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO: 2 (DUAS) BARRAGINHAS PREVISTAS, 1 (UMA) EXECUTADA E 1 (UMA) APROVADA (50,00 % DE AVANÇO FÍSICO); 1 (UMA) INTERVENÇÃO REMANESCENTE CORRESPONDE A DESISTÊNCIAS DO PRODUTOR RURAL. DETALHAMENTO NO RP004-R01 (APRESENTADA DESDE O RP001-R02).

PROPRIEDADE 12AL077 – CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA: 6 (SEIS) BARRAGINHAS PREVISTAS, 4 (QUATRO) EXECUTADAS E 4 (QUATRO) APROVADAS (66,67 % DE AVANÇO FÍSICO); 2 (DUAS) INTERVENÇÕES REMANESCENTES CORRESPONDEM A DESISTÊNCIAS DO PRODUTOR RURAL. DETALHAMENTO NO RP004-R01.

ATUALIZAÇÕES DE PROPRIEDADES APRESENTADAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES

ESTE ITEM APRESENTA, PARA AS PROPRIEDADES JÁ APRESENTADAS EM RELATÓRIOS PARCIAIS ANTERIORES, OS FATOS TÉCNICOS OCORRIDOS APÓS AQUELE RELATÓRIO: ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (APROVAÇÕES POR MARGEM DE TOLERÂNCIA, COM RESSALVA, COM READEQUAÇÃO DE RAIO E BACIAS MANTIDAS EM CORREÇÃO), BACIAS REMEDIDAS EM CAMPO POR RECONFERÊNCIA GNSS/RTK, CORREÇÃO DA BASE DE REFERÊNCIA PELO PPP DO IBGE E CORREÇÕES NÃO EXECUTADAS POR IMPREVISTOS. OS DEMAIS DADOS PERMANECEM CONFORME O RELATÓRIO INDICADO.

PROPRIEDADE 12AL033 – CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA (APRESENTADA NO RP004-R01)

ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF — NOTA TÉCNICA Nº 025/2026, DE 06/10/2026, JOÃO PEDRO CARLOS PAIM: APROVADA POR MARGEM DE TOLERÂNCIA (10% NO VOLUME) — P18, P43; APROVADA COM RESSALVA — P08, P07, P06; APROVADA COM READEQUAÇÃO DE RAIO — P16 (RAIO DE 4 M), P19 (RAIO DE 4 M), P32 (RAIO DE 12 M), P11, P12, P13, P14, P15; EM CORREÇÃO — P39.

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. V-ATERRO (M)	DECISÃO DO FISCAL
P18	**6**	**1,51**	**79,21**	**0,75**	**2,54**	**1,92**	**APROVADA POR MARGEM DE TOLERÂNCIA DE 10% NO VOLUME**
P43	**6**	**1,62**	**81,52**	**0,47**	**2,75**	**3,00**	**APROVADA POR MARGEM DE TOLERÂNCIA DE 10% NO VOLUME**
P08	6	1,55	74,46	0,73	2,22	4,48	APROVADA COM RESSALVA
P07	6	1,55	119,76	0,95	2,49	2,01	APROVADA COM RESSALVA
P06	6	1,77	166,68	0,62	2,50	3,53	APROVADA COM RESSALVA
P16	4	1,13	57,78	0,34	2,74	5,43	APROVADA COM READEQUAÇÃO — MEDIDA COMO RAIO DE 4 M
P19	4	1,57	66,47	1,11	2,60	1,90	APROVADA COM READEQUAÇÃO — MEDIDA COMO RAIO DE 4 M
P32	12	2,34	445,08	0,33	2,51	2,37	APROVADA COM READEQUAÇÃO — MEDIDA COMO RAIO DE 12 M
P11	6	1,72	88,52	0,83	2,39	2,53	APROVADA COM READEQUAÇÃO DE DIMENSÃO
P12	6	2,28	87,72	0,78	2,56	2,96	APROVADA COM READEQUAÇÃO DE DIMENSÃO
P13	6	1,99	88,03	0,82	2,36	2,57	APROVADA COM READEQUAÇÃO DE DIMENSÃO
P14	6	2,47	91,25	0,94	2,78	2,39	APROVADA COM READEQUAÇÃO DE DIMENSÃO
P15	6	1,77	88,67	0,45	2,98	3,32	APROVADA COM READEQUAÇÃO DE DIMENSÃO
P39	9	2,20	463,38	0,39	3,30	4,37	EM CORREÇÃO

DECISÕES DO ATESTO DA CODEVASF — PROPRIEDADE 12AL033.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BACIAS REMEDIDAS EM CAMPO (R03 DE 23/10/2026): 1 (UMA) BACIA RECONFERIDA, QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS APÓS A CORREÇÃO.

CÓDIGO	RAIO (M)ANTES → DEPOIS	PROF. (M)ANTES → DEPOIS	VOL. (M³)ANTES → DEPOIS	PROF.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	LARG.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	DIST.V-ATERRO(M) ANTES → DEPOIS	CONCLUSÃOANTES → DEPOIS
P39	9	2,07 → 2,20	155,94 → 463,38	0,37 → 0,39	2,61 → 3,30	3,25 → 4,37	CORRIGIR → ATENDE


BACIAS REMEDIDAS — ANTES X DEPOIS — PROPRIEDADE 12AL033 (1 (UMA) BACIA).

CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA — USO EXCLUSIVO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL005 — LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE

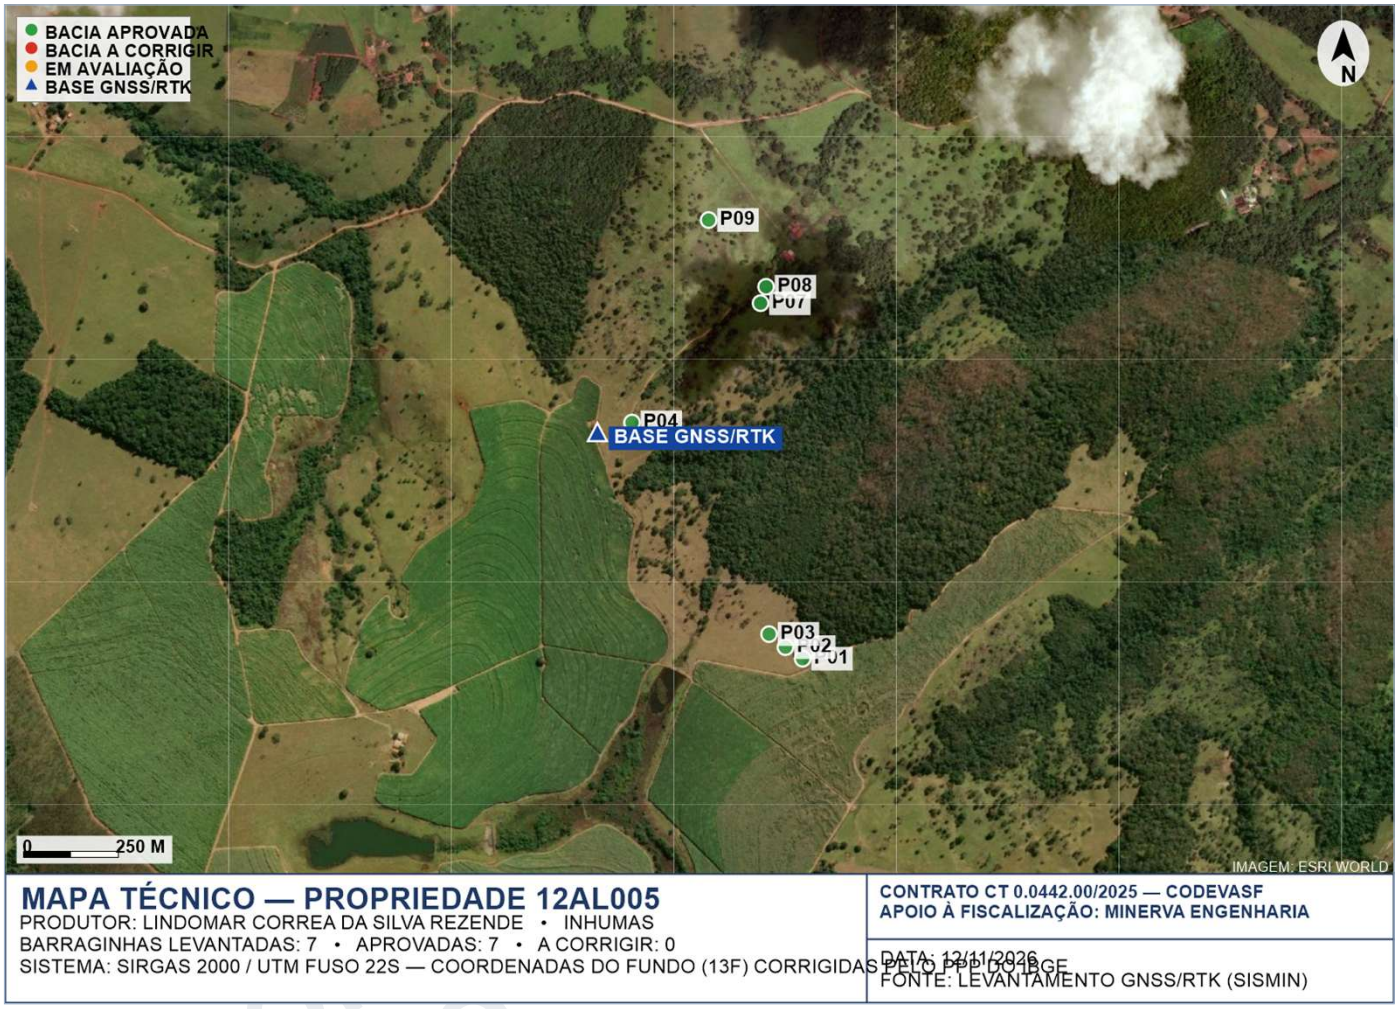

MAPA TÉCNICO — PROPRIEDADE 12AL005
PRODUTOR: LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE • INHUMAS
BARRAGINHAS LEVANTADAS: 7 • APROVADAS: 7 • A CORRIGIR: 0
SISTEMA: SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S — COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CONTRATO CT 0.0442.00/2025 — CODEVASF
APOIO À FISCALIZAÇÃO: MINERVA ENGENHARIA
DATA: 12/11/2026
FONTE: LEVANTAMENTO GNSS/RTK (SISMIN)

MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE 12AL005, COM LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGINHAS FISCALIZADAS E BASE GNSS/RTK.

A PROPRIEDADE 12AL005 INTEGRA A CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPLADA NESTE RELATÓRIO PARCIAL. CONFORME A BASE DE PLANEJAMENTO, ESTÃO PREVISTAS 11 (ONZE) INTERVENÇÕES, DAS QUAIS 7 (SETE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS POR GNSS/RTK ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE	12AL005	PRODUTOR	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE
MUNICÍPIO/UF	INHUMAS/GO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	—
TELEFONE	(62)999104020	LOCALIZAÇÃO	LAT: -16.34331; LONG: -49.56736
BACIA HIDROGRÁFICA	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE	SITUAÇÃO DA FRENTE	CONCLUÍDA
BASE GNSS/RTK	12AL005-BASE	SISTEMA GEODÉSICO	SIRGAS 2000 / UTM / FUSO 22S
E BASE CORRIGIDO	652.507,150	N BASE CORRIGIDO	8.192.009,356
ELEVAÇÃO BASE CORRIGIDA (M)	948,89	SIGMAS 95% (E / N / H)	0,002 / 0,005 / 0,008

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA PROPRIEDADE 12AL005.

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL005P01	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—
12AL005P02	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—
12AL005P03	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—
12AL005P04	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—
12AL005P07	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—
12AL005P08	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—
12AL005P09	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	—	6 METROS	—

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL005.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES

OS QUANTITATIVOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DA PREVISÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PRODUTORES E NO PROJETO KML DA CODEVASF E DA QUANTIDADE DE BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK. O SALDO REMANESCENTE REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE O PREVISTO E O EXECUTADO.

INDICADOR	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES	11	11 6M
BARRAGINHAS EXECUTADAS COM REGISTRO RTK	7	BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK
SALDO REMANESCENTE / NÃO PROCESSADO	4	DIFERENÇA ENTRE PREVISTO E EXECUTADO RTK
APROVADAS	7	CONCLUSÃO GERAL = ATENDE
PARA CORREÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = CORRIGIR
EM AVALIAÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = AVALIAR
AVANÇO FÍSICO (%)	63,64%	EXECUTADAS RTK / PREVISTAS


QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES DA PROPRIEDADE 12AL005.


TIPOLOGIA PREVISTA	QUANTIDADE PREVISTA
6M	11

TIPOLOGIAS PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES DA PROPRIEDADE 12AL005.

PAINEL EXECUTIVO E GRÁFICOS COMPARATIVOS

OS GRÁFICOS APRESENTAM, PARA CADA PROPRIEDADE, A MESMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO: CONTROLE FÍSICO, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS REGISTRADAS NO PROCESSAMENTO RTK.

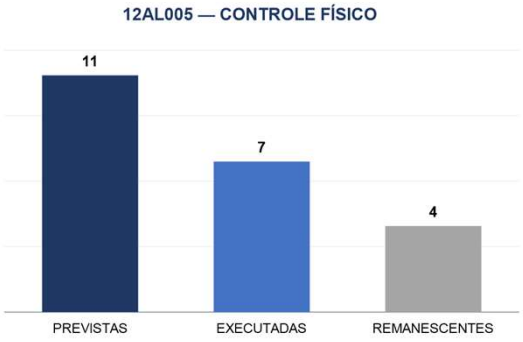

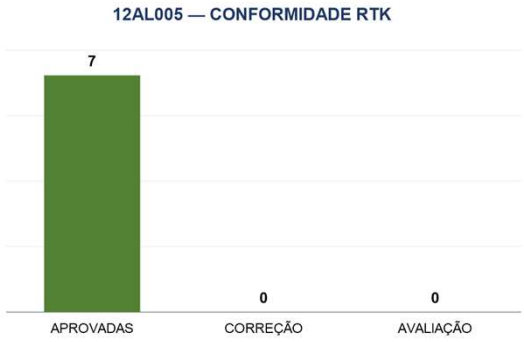

CONTROLE FÍSICO DA PROPRIEDADE 12AL005. • CONFORMIDADE RTK DA PROPRIEDADE 12AL005.



DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS NA PROPRIEDADE 12AL005.

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA VERTEDOR (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	TOPSOIL?	CONCLUSÃO GERAL
		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL005P01	6	2,11	141,38	0,57	2,37	4,24	2,07	2,70	SIM	ATENDE
12AL005P02	6	1,65	96,32	0,82	2,56	6,87	2,05	2,90	SIM	ATENDE
12AL005P03	6	1,95	121,46	0,53	3,19	4,24	3,00	2,80	SIM	ATENDE
12AL005P04	6	1,90	126,76	0,42	2,17	2,73	5,35	2,60	SIM	ATENDE
12AL005P07	6	2,03	114,64	0,61	2,63	5,52	2,69	2,80	SIM	ATENDE
12AL005P08	6	1,72	131,36	0,33	3,23	1,98	1,88	2,70	SIM	ATENDE
12AL005P09	6	1,66	101,34	0,82	2,59	6,87	2,72	2,80	SIM	ATENDE

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL005.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

COORDENADAS E DADOS GNSS/RTK

A TABELA A SEGUIR APRESENTA A COORDENADA SÍNTESE DA INTERVENÇÃO E AS COTAS PRINCIPAIS EXTRAÍDAS DOS PONTOS PADRONIZADOS DO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

CÓDIGO DA INTERVENÇÃO	PONTO DE LOCALIZAÇÃO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA FUNDO (M)	COTA 1V (M)	STATUS
12AL005P01	13F	653.044,057	8.191.415,246	956,000	958,107	AJUSTADO
12AL005P02	13F	652.999,059	8.191.445,726	952,314	953,968	AJUSTADO
12AL005P03	13F	652.956,011	8.191.480,367	948,382	950,337	AJUSTADO
12AL005P04	13F	652.598,624	8.192.037,258	934,815	936,711	AJUSTADO
12AL005P07	13F	652.939,569	8.192.347,325	889,811	891,841	AJUSTADO
12AL005P08	13F	652.954,519	8.192.390,432	886,048	887,765	AJUSTADO
12AL005P09	13F	652.804,348	8.192.566,186	883,932	885,592	AJUSTADO

COORDENADA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES DA PROPRIEDADE 12AL005.

NA SEQUÊNCIA, APRESENTA-SE A TABELA DE PONTOS PADRONIZADOS POR BARRAGINHA, PRESERVANDO A NOMENCLATURA DO LEVANTAMENTO.

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL005P01	1V	653.034,353	8.191.405,384	958,107	AJUSTADO
12AL005P01	2V	653.033,476	8.191.404,646	958,384	AJUSTADO
12AL005P01	3V	653.035,322	8.191.406,129	958,204	AJUSTADO
12AL005P01	4V	653.035,536	8.191.406,539	958,836	AJUSTADO
12AL005P01	5C	653.036,385	8.191.408,424	959,010	AJUSTADO
12AL005P01	6C	653.035,716	8.191.414,788	958,682	AJUSTADO
12AL005P01	7C	653.038,746	8.191.420,497	958,741	AJUSTADO
12AL005P01	8C	653.046,089	8.191.422,226	959,062	AJUSTADO
12AL005P01	9DL	653.047,325	8.191.407,248	958,104	AJUSTADO
12AL005P01	10DL	653.039,009	8.191.417,274	958,095	AJUSTADO
12AL005P01	11DT	653.039,204	8.191.409,677	958,104	AJUSTADO
12AL005P01	12DT	653.048,027	8.191.418,760	958,108	AJUSTADO
12AL005P01	13F	653.044,057	8.191.415,246	956,000	AJUSTADO
12AL005P02	1V	652.989,198	8.191.441,399	953,968	AJUSTADO
12AL005P02	2V	652.987,917	8.191.440,340	954,214	AJUSTADO
12AL005P02	3V	652.989,213	8.191.442,544	953,992	AJUSTADO
12AL005P02	4V	652.989,072	8.191.443,333	954,593	AJUSTADO
12AL005P02	5C	652.989,487	8.191.445,345	954,828	AJUSTADO
12AL005P02	6C	652.992,854	8.191.449,419	954,883	AJUSTADO
12AL005P02	7C	652.996,957	8.191.453,040	954,790	AJUSTADO
12AL005P02	8C	653.004,923	8.191.451,403	955,469	AJUSTADO
12AL005P02	9DL	653.003,587	8.191.439,295	953,965	AJUSTADO
12AL005P02	10DL	652.995,576	8.191.449,135	953,971	AJUSTADO
12AL005P02	11DT	652.994,885	8.191.441,223	953,973	AJUSTADO
12AL005P02	12DT	653.004,211	8.191.447,779	954,045	AJUSTADO
12AL005P02	13F	652.999,059	8.191.445,726	952,314	AJUSTADO
12AL005P03	1V	652.952,365	8.191.472,745	950,337	AJUSTADO
12AL005P03	2V	652.953,595	8.191.471,627	950,726	AJUSTADO
12AL005P03	3V	652.951,321	8.191.473,868	950,531	AJUSTADO
12AL005P03	4V	652.951,210	8.191.474,748	950,945	AJUSTADO
12AL005P03	5C	652.949,206	8.191.476,984	951,337	AJUSTADO
12AL005P03	6C	652.949,756	8.191.483,805	950,924	AJUSTADO
12AL005P03	7C	652.954,603	8.191.489,993	950,867	AJUSTADO
12AL005P03	8C	652.962,066	8.191.490,327	951,134	AJUSTADO
12AL005P03	9DL	652.963,035	8.191.477,146	950,331	AJUSTADO
12AL005P03	10DL	652.953,156	8.191.485,447	950,338	AJUSTADO
12AL005P03	11DT	652.952,122	8.191.477,719	950,332	AJUSTADO
12AL005P03	12DT	652.961,701	8.191.484,722	950,337	AJUSTADO
12AL005P03	13F	652.956,011	8.191.480,367	948,382	AJUSTADO
12AL005P04	1V	652.605,782	8.192.033,982	936,711	AJUSTADO
12AL005P04	2V	652.606,731	8.192.033,395	936,870	AJUSTADO
12AL005P04	3V	652.604,794	8.192.034,370	936,800	AJUSTADO
12AL005P04	4V	652.604,355	8.192.035,105	937,299	AJUSTADO
12AL005P04	5C	652.604,244	8.192.040,454	937,343	AJUSTADO
12AL005P04	6C	652.601,888	8.192.043,039	937,167	AJUSTADO
12AL005P04	7C	652.593,868	8.192.042,993	937,132	AJUSTADO
12AL005P04	8C	652.588,041	8.192.037,842	937,495	AJUSTADO
12AL005P04	9DL	652.590,534	8.192.032,199	936,734	AJUSTADO
12AL005P04	10DL	652.599,859	8.192.041,549	936,731	AJUSTADO
12AL005P04	11DT	652.602,598	8.192.034,583	936,722	AJUSTADO
12AL005P04	12DT	652.590,350	8.192.037,223	936,748	AJUSTADO
12AL005P04	13F	652.598,624	8.192.037,258	934,815	AJUSTADO
12AL005P07	1V	652.945,942	8.192.345,501	891,841	AJUSTADO
12AL005P07	2V	652.946,434	8.192.343,977	892,050	AJUSTADO
12AL005P07	3V	652.945,963	8.192.346,560	891,919	AJUSTADO
12AL005P07	4V	652.945,287	8.192.347,171	892,477	AJUSTADO
12AL005P07	5C	652.946,218	8.192.349,691	892,775	AJUSTADO
12AL005P07	6C	652.944,322	8.192.351,736	892,450	AJUSTADO
12AL005P07	7C	652.940,260	8.192.355,453	892,695	AJUSTADO
12AL005P07	8C	652.933,010	8.192.353,204	892,861	AJUSTADO
12AL005P07	9DL	652.930,558	8.192.346,208	891,890	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL005P07	10DL	652.942,291	8.192.350,076	891,886	AJUSTADO
12AL005P07	11DT	652.941,799	8.192.342,744	891,886	AJUSTADO
12AL005P07	12DT	652.934,586	8.192.351,307	891,882	AJUSTADO
12AL005P07	13F	652.939,569	8.192.347,325	889,811	AJUSTADO
12AL005P08	1V	652.951,494	8.192.400,644	887,765	AJUSTADO
12AL005P08	2V	652.950,174	8.192.401,778	887,945	AJUSTADO
12AL005P08	3V	652.952,847	8.192.399,960	887,777	AJUSTADO
12AL005P08	4V	652.953,426	8.192.399,069	888,304	AJUSTADO
12AL005P08	5C	652.954,968	8.192.398,002	888,569	AJUSTADO
12AL005P08	6C	652.957,022	8.192.396,703	888,141	AJUSTADO
12AL005P08	7C	652.960,500	8.192.394,748	888,092	AJUSTADO
12AL005P08	8C	652.964,158	8.192.392,193	888,222	AJUSTADO
12AL005P08	9DL	652.952,794	8.192.381,606	887,778	AJUSTADO
12AL005P08	10DL	652.957,872	8.192.393,658	887,786	AJUSTADO
12AL005P08	11DT	652.948,252	8.192.392,030	887,780	AJUSTADO
12AL005P08	12DT	652.962,103	8.192.387,427	887,775	AJUSTADO
12AL005P08	13F	652.954,519	8.192.390,432	886,048	AJUSTADO
12AL005P09	1V	652.799,862	8.192.575,831	885,592	AJUSTADO
12AL005P09	2V	652.798,798	8.192.576,361	885,697	AJUSTADO
12AL005P09	3V	652.801,080	8.192.575,142	885,573	AJUSTADO
12AL005P09	4V	652.801,098	8.192.574,186	886,459	AJUSTADO
12AL005P09	5C	652.803,774	8.192.574,646	886,923	AJUSTADO
12AL005P09	6C	652.810,497	8.192.570,930	886,416	AJUSTADO
12AL005P09	7C	652.813,497	8.192.564,052	886,517	AJUSTADO
12AL005P09	8C	652.806,844	8.192.557,202	886,881	AJUSTADO
12AL005P09	9DL	652.799,021	8.192.560,064	885,473	AJUSTADO
12AL005P09	10DL	652.809,035	8.192.567,552	885,549	AJUSTADO
12AL005P09	11DT	652.801,749	8.192.572,204	885,582	AJUSTADO
12AL005P09	12DT	652.805,382	8.192.560,621	885,604	AJUSTADO
12AL005P09	13F	652.804,348	8.192.566,186	883,932	AJUSTADO

COORDENADAS E COTAS DOS PONTOS PADRONIZADOS COLETADOS NA PROPRIEDADE 12AL005.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A ANÁLISE DE CONFORMIDADE FOI ESTRUTURADA A PARTIR DOS PARÂMETROS PROCESSADOS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK, COM A CLASSIFICAÇÃO APROVADA, PARA CORREÇÃO E EM AVALIAÇÃO.

CÓDIGO	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	CONCLUSÃO GERAL
	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL005P01	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL005P02	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL005P03	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL005P04	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL005P07	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL005P08	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL005P09	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPRIEDADE 12AL005.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF)

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 12AL005 É APRESENTADO NOS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, EM ORDEM NUMÉRICA. AS FOTOGRAFIAS CONTEMPLAM A BASE GNSS/RTK, AS BARRAGINHAS EXECUTADAS, VERTEDOUROS, DETALHES CONSTRUTIVOS E DEMAIS EVIDÊNCIAS DE CAMPO.

ELEMENTO DO RF	PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	DUAS COLUNAS, COM 3 LINHAS POR PÁGINA, CONFORME QUANTIDADE DE IMAGENS
LEGENDA	LEGENDA COM O NÚMERO DA BACIA (12AL005-PXX)
RASTREABILIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO CÓDIGO DA BARRAGINHA
CONTEÚDO MÍNIMO	BASE GNSS/RTK, VISTA GERAL, VERTEDOURO, CRISTA/TALUDES E DETALHES EXECUTIVOS

PADRÃO DE INSERÇÃO DO RF DA PROPRIEDADE 12AL005.

CONCLUSÃO TÉCNICA DA PROPRIEDADE

A PROPRIEDADE 12AL005 POSSUI 11 (ONZE) BARRAGINHAS PREVISTAS, DAS QUAIS 7 (SETE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS EM CAMPO, CORRESPONDENDO A 63,64% DE EXECUÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO.

AS 4 (QUATRO) BARRAGINHAS REMANESCENTES CORRESPONDEM ÀS INTERVENÇÕES AINDA NÃO EXECUTADAS NA DATA DA FISCALIZAÇÃO, PERMANECENDO VINCULADAS AO CRONOGRAMA DA EMPRESA EXECUTORA. CASO OCORRA DESISTÊNCIA PELO PRODUTOR RURAL, A SITUAÇÃO DEVERÁ SER FORMALIZADA MEDIANTE A RESPECTIVA ANUÊNCIA DE DESISTÊNCIA.

CONFORME OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO E DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 7 (SETE) BARRAGINHAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À PROPRIEDADE 12AL005, COMPREENDENDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS DE PROCESSAMENTO, MAPAS, TABELAS, GRÁFICOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA
USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL034 — DIVINO BARBOSA QUEIROZ



MAPA TÉCNICO — PROPRIEDADE 12AL034
PRODUTOR: DIVINO BARBOSA QUEIROZ • INHUMAS
BARRAGINHAS LEVANTADAS: 5 • APROVADAS: 5 • A CORRIGIR: 0
SISTEMA: SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S — COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CONTRATO CT 0.0442.00/2025 — CODEVASF
APOIO À FISCALIZAÇÃO: MINERVA ENGENHARIA

DATA: 12/11/2026
FONTE: LEVANTAMENTO GNSS/RTK (SISMIN)

MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE 12AL034, COM LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGINHAS FISCALIZADAS E BASE GNSS/RTK.

A PROPRIEDADE 12AL034 INTEGRA A CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPLADA NESTE RELATÓRIO PARCIAL. CONFORME A BASE DE PLANEJAMENTO, ESTÃO PREVISTAS 3 (TRÊS) INTERVENÇÕES, DAS QUAIS 5 (CINCO) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS POR GNSS/RTK ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE	12AL034	PRODUTOR	DIVINO BARBOSA QUEIROZ
MUNICÍPIO/UF	INHUMAS/GO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	—
TELEFONE	(62)999676824	LOCALIZAÇÃO	LAT: -16.32881; LONG: -49.60006
BACIA HIDROGRÁFICA	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE	SITUAÇÃO DA FRENTE	CONCLUÍDA
BASE GNSS/RTK	12AL034-BASE	SISTEMA GEODÉSICO	SIRGAS 2000 / UTM / FUSO 22S
E BASE CORRIGIDO	650.229,920	N BASE CORRIGIDO	8.193.614,559
ELEVAÇÃO BASE CORRIGIDA (M)	1.012,96	SIGMAS 95% (E / N / H)	0,001 / 0,004 / 0,006

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA PROPRIEDADE 12AL034.

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL034P01	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	—	6 METROS	4 → 6 M
12AL034P02	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	—	6 METROS	—
12AL034P03	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	—	9 METROS	6 → 9 M
12AL034P04	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	—	4 METROS	—
12AL034P05	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	—	6 METROS	—

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL034.

QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES

OS QUANTITATIVOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DA PREVISÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PRODUTORES E NO PROJETO KML DA CODEVASF E DA QUANTIDADE DE BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK. O SALDO REMANESCENTE REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE O PREVISTO E O EXECUTADO.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

INDICADOR	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES	3	1 4M, 1 6M, 1 EXISTENTE 6 M
BARRAGINHAS EXECUTADAS COM REGISTRO RTK	5	BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK
SALDO REMANESCENTE / NÃO PROCESSADO	0 (+2)	2 (DUAS) BARRAGINHAS EXECUTADAS ALÉM DO PROJETO, EM COMPENSAÇÃO ÀS DESISTÊNCIAS DO CONTRATO
APROVADAS	5	CONCLUSÃO GERAL = ATENDE
PARA CORREÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = CORRIGIR
EM AVALIAÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = AVALIAR
AVANÇO FÍSICO (%)	100,00%	EXECUTADAS RTK / PREVISTAS


QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES DA PROPRIEDADE 12AL034.


TIPOLOGIA PREVISTA	QUANTIDADE PREVISTA
4M	1
6M	1
EXISTENTE 6 M	1

TIPOLOGIAS PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES DA PROPRIEDADE 12AL034.

PAINEL EXECUTIVO E GRÁFICOS COMPARATIVOS

OS GRÁFICOS APRESENTAM, PARA CADA PROPRIEDADE, A MESMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO: CONTROLE FÍSICO, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS REGISTRADAS NO PROCESSAMENTO RTK.

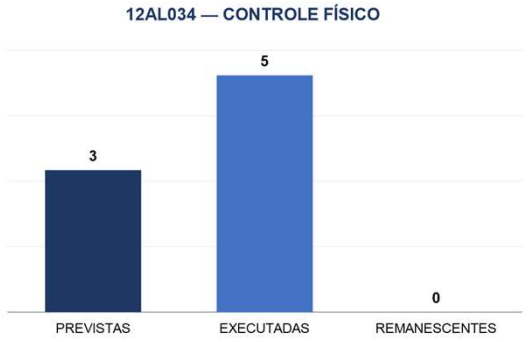

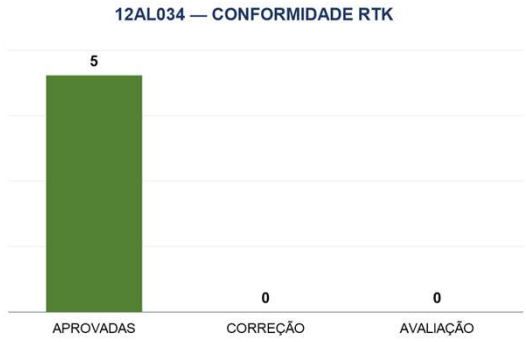

CONTROLE FÍSICO DA PROPRIEDADE 12AL034. • CONFORMIDADE RTK DA PROPRIEDADE 12AL034.



DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS NA PROPRIEDADE 12AL034.

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M^3)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA VERTEDOR (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	TOPSOIL?	CONCLUSÃO GERAL
		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL034P01	6	2,17	159,33	0,69	4,35	5,52	2,18	3,00	SIM	ATENDE
12AL034P02	6	1,64	145,39	0,51	2,90	4,24	2,30	3,10	SIM	ATENDE
12AL034P03	9	2,31	234,60	0,57	3,16	4,24	2,28	2,80	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL034P04	4	1,35	71,33	0,97	2,50	6,87	1,90	3,10	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL034P05	6	1,27	121,88	0,50	2,74	3,63	3,74	3,10	SIM	ATENDE

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL034.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

COORDENADAS E DADOS GNSS/RTK

A TABELA A SEGUIR APRESENTA A COORDENADA SÍNTESE DA INTERVENÇÃO E AS COTAS PRINCIPAIS EXTRAÍDAS DOS PONTOS PADRONIZADOS DO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

CÓDIGO DA INTERVENÇÃO	PONTO DE LOCALIZAÇÃO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA FUNDO (M)	COTA 1V (M)	STATUS
12AL034P01	13F	649.521,024	8.194.412,074	980,061	982,231	AJUSTADO
12AL034P02	13F	649.593,416	8.194.476,792	992,444	994,084	AJUSTADO
12AL034P03	13F	649.512,218	8.194.510,156	991,155	993,469	AJUSTADO
12AL034P04	13F	650.385,314	8.193.131,009	983,324	984,679	AJUSTADO
12AL034P05	13F	650.251,042	8.193.414,647	1.001,585	1.002,851	AJUSTADO

COORDENADA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES DA PROPRIEDADE 12AL034.

NA SEQUÊNCIA, APRESENTA-SE A TABELA DE PONTOS PADRONIZADOS POR BARRAGINHA, PRESERVANDO A NOMENCLATURA DO LEVANTAMENTO.

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL034P01	1V	649.515,807	8.194.418,059	982,231	AJUSTADO
12AL034P01	2V	649.514,768	8.194.419,872	982,570	AJUSTADO
12AL034P01	3V	649.515,045	8.194.415,530	982,307	AJUSTADO
12AL034P01	4V	649.514,089	8.194.415,133	982,699	AJUSTADO
12AL034P01	5C	649.513,288	8.194.413,110	983,014	AJUSTADO
12AL034P01	6C	649.512,393	8.194.405,126	982,921	AJUSTADO
12AL034P01	7C	649.520,341	8.194.399,457	983,046	AJUSTADO
12AL034P01	8C	649.525,866	8.194.402,162	983,327	AJUSTADO
12AL034P01	9DL	649.523,434	8.194.417,103	982,117	AJUSTADO
12AL034P01	10DL	649.519,281	8.194.402,657	982,229	AJUSTADO
12AL034P01	11DT	649.515,775	8.194.413,316	982,228	AJUSTADO
12AL034P01	12DT	649.526,188	8.194.407,309	982,249	AJUSTADO
12AL034P01	13F	649.521,024	8.194.412,074	980,061	AJUSTADO
12AL034P02	1V	649.586,398	8.194.488,368	994,084	AJUSTADO
12AL034P02	2V	649.586,614	8.194.489,879	994,343	AJUSTADO
12AL034P02	3V	649.585,679	8.194.487,135	994,210	AJUSTADO
12AL034P02	4V	649.585,265	8.194.486,757	994,517	AJUSTADO
12AL034P02	5C	649.584,685	8.194.484,529	994,774	AJUSTADO
12AL034P02	6C	649.585,355	8.194.479,739	994,750	AJUSTADO
12AL034P02	7C	649.586,885	8.194.475,330	994,592	AJUSTADO
12AL034P02	8C	649.599,389	8.194.467,679	994,907	AJUSTADO
12AL034P02	9DL	649.598,358	8.194.484,335	994,083	AJUSTADO
12AL034P02	10DL	649.590,469	8.194.473,800	994,082	AJUSTADO
12AL034P02	11DT	649.587,429	8.194.484,421	994,086	AJUSTADO
12AL034P02	12DT	649.601,511	8.194.475,114	994,094	AJUSTADO
12AL034P02	13F	649.593,416	8.194.476,792	992,444	AJUSTADO
12AL034P03	1V	649.506,034	8.194.516,056	993,469	AJUSTADO
12AL034P03	2V	649.506,782	8.194.516,976	993,645	AJUSTADO
12AL034P03	3V	649.504,499	8.194.514,796	993,620	AJUSTADO
12AL034P03	4V	649.504,324	8.194.514,237	994,076	AJUSTADO
12AL034P03	5C	649.502,432	8.194.512,956	994,594	AJUSTADO
12AL034P03	6C	649.504,182	8.194.507,420	994,227	AJUSTADO
12AL034P03	7C	649.511,201	8.194.502,643	994,044	AJUSTADO
12AL034P03	8C	649.520,520	8.194.503,494	994,389	AJUSTADO
12AL034P03	9DL	649.515,523	8.194.520,489	993,483	AJUSTADO
12AL034P03	10DL	649.511,122	8.194.504,946	993,409	AJUSTADO
12AL034P03	11DT	649.505,259	8.194.511,842	993,470	AJUSTADO
12AL034P03	12DT	649.520,790	8.194.511,329	993,477	AJUSTADO
12AL034P03	13F	649.512,218	8.194.510,156	991,155	AJUSTADO
12AL034P04	1V	650.390,122	8.193.126,582	984,679	AJUSTADO
12AL034P04	2V	650.390,990	8.193.127,763	984,780	AJUSTADO
12AL034P04	3V	650.389,868	8.193.125,532	984,793	AJUSTADO
12AL034P04	4V	650.389,549	8.193.124,944	985,118	AJUSTADO
12AL034P04	5C	650.388,811	8.193.123,198	985,759	AJUSTADO
12AL034P04	6C	650.382,930	8.193.122,861	985,647	AJUSTADO
12AL034P04	7C	650.376,174	8.193.129,636	985,915	AJUSTADO
12AL034P04	8C	650.381,432	8.193.141,103	986,060	AJUSTADO
12AL034P04	9DL	650.389,714	8.193.136,887	984,678	AJUSTADO
12AL034P04	10DL	650.380,917	8.193.135,916	984,672	AJUSTADO
12AL034P04	11DT	650.385,362	8.193.123,574	984,676	AJUSTADO
12AL034P04	12DT	650.385,266	8.193.138,444	984,678	AJUSTADO
12AL034P04	13F	650.385,314	8.193.131,009	983,324	AJUSTADO
12AL034P05	1V	650.257,713	8.193.417,146	1.002,851	AJUSTADO
12AL034P05	2V	650.258,647	8.193.418,150	1.003,040	AJUSTADO
12AL034P05	3V	650.257,166	8.193.415,848	1.002,963	AJUSTADO
12AL034P05	4V	650.256,773	8.193.415,332	1.003,318	AJUSTADO
12AL034P05	5C	650.256,812	8.193.411,595	1.003,275	AJUSTADO
12AL034P05	6C	650.251,177	8.193.407,804	1.003,349	AJUSTADO
12AL034P05	7C	650.242,616	8.193.409,690	1.003,554	AJUSTADO
12AL034P05	8C	650.240,269	8.193.419,761	1.003,649	AJUSTADO
12AL034P05	9DL	650.254,594	8.193.424,324	1.002,851	AJUSTADO
12AL034P05	10DL	650.243,869	8.193.410,947	1.002,851	AJUSTADO
12AL034P05	11DT	650.255,671	8.193.412,794	1.002,851	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL034P05	12DT	650.243,524	8.193.420,098	1.002,851	AJUSTADO
12AL034P05	13F	650.251,042	8.193.414,647	1.001,585	AJUSTADO

COORDENADAS E COTAS DOS PONTOS PADRONIZADOS COLETADOS NA PROPRIEDADE 12AL034.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A ANÁLISE DE CONFORMIDADE FOI ESTRUTURADA A PARTIR DOS PARÂMETROS PROCESSADOS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK, COM A CLASSIFICAÇÃO APROVADA, PARA CORREÇÃO E EM AVALIAÇÃO.

CÓDIGO	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	CONCLUSÃO GERAL
	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL034P01	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL034P02	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL034P03	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE COM RESSALVA
12AL034P04	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL034P05	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPRIEDADE 12AL034.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF)

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 12AL034 É APRESENTADO NOS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, EM ORDEM NUMÉRICA. AS FOTOGRAFIAS CONTEMPLAM A BASE GNSS/RTK, AS BARRAGINHAS EXECUTADAS, VERTEDOUROS, DETALHES CONSTRUTIVOS E DEMAIS EVIDÊNCIAS DE CAMPO.

ELEMENTO DO RF	PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	DUAS COLUNAS, COM 3 LINHAS POR PÁGINA, CONFORME QUANTIDADE DE IMAGENS
LEGENDA	LEGENDA COM O NÚMERO DA BACIA (12AL034-PXX)
RASTREABILIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO CÓDIGO DA BARRAGINHA
CONTEÚDO MÍNIMO	BASE GNSS/RTK, VISTA GERAL, VERTEDOURO, CRISTA/TALUDES E DETALHES EXECUTIVOS

PADRÃO DE INSERÇÃO DO RF DA PROPRIEDADE 12AL034.

CONCLUSÃO TÉCNICA DA PROPRIEDADE

A PROPRIEDADE 12AL034 POSSUI 3 (TRÊS) BARRAGINHAS PREVISTAS, DAS QUAIS 5 (CINCO) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS EM CAMPO, CORRESPONDENDO A 100,00% DE EXECUÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO.

REGISTRA-SE QUE 2 (DUAS) BARRAGINHAS FORAM EXECUTADAS ALÉM DAS PROJETADAS PARA A PROPRIEDADE, EM COMPENSAÇÃO ÀS DESISTÊNCIAS DE PRODUTORES REGISTRADAS NO CONTRATO, PERMANECENDO O REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS SOB COMPETÊNCIA DA CODEVASF.

CONFORME OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO E DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 5 (CINCO) BARRAGINHAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS.


TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À PROPRIEDADE 12AL034, COMPREENDENDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS DE PROCESSAMENTO, MAPAS, TABELAS, GRÁFICOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL035 — ANTÔNIO LIMA DE ABREU

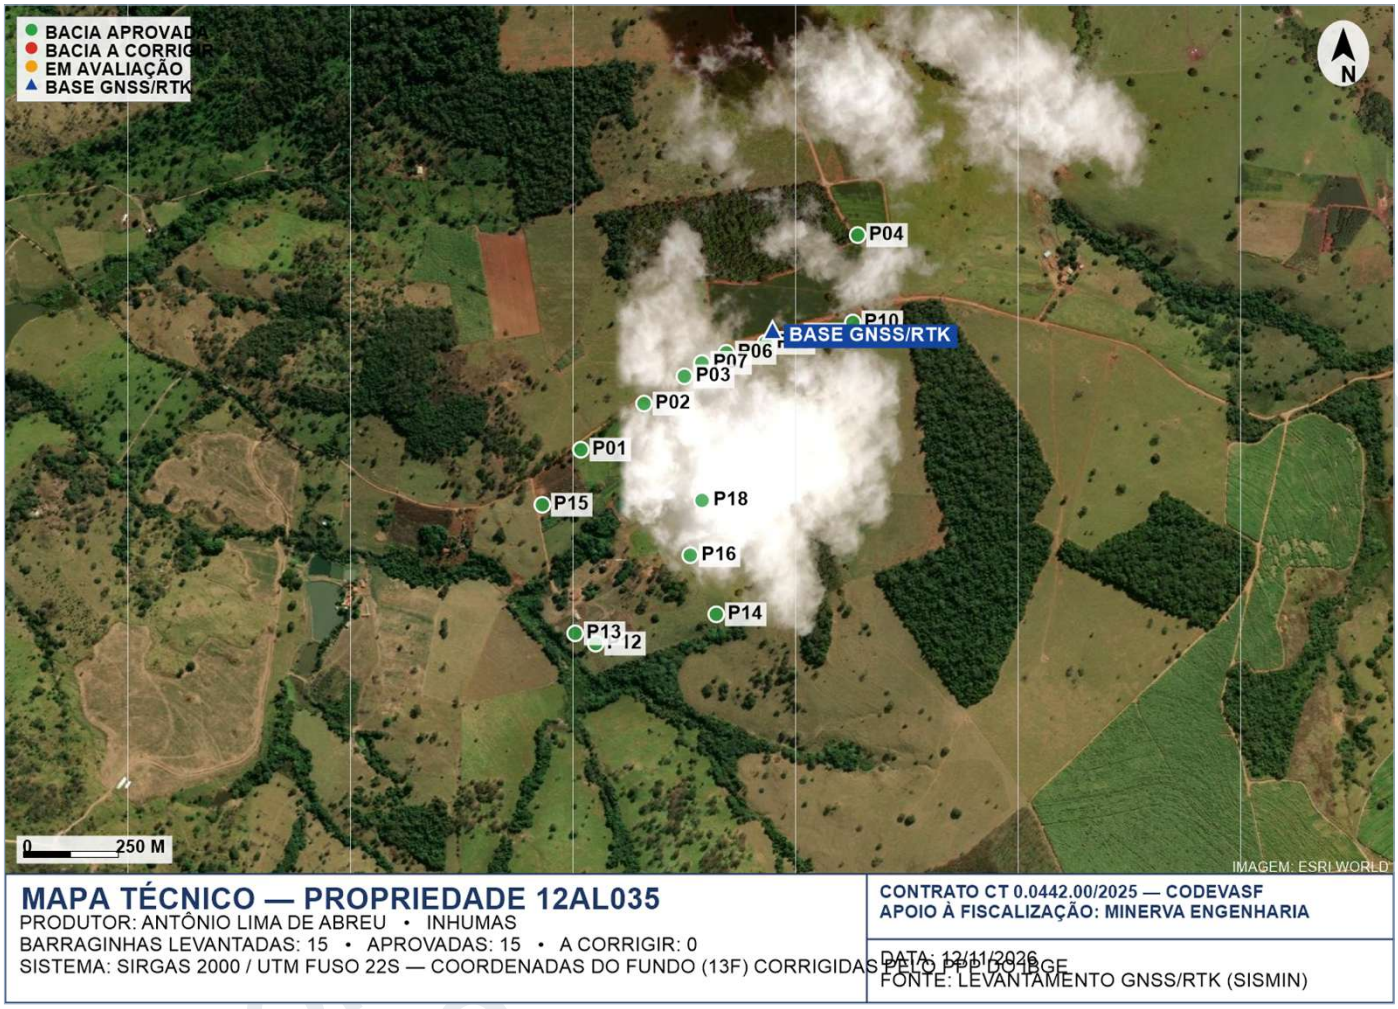

MAPA TÉCNICO — PROPRIEDADE 12AL035
PRODUTOR: ANTÔNIO LIMA DE ABREU • INHUMAS
BARRAGINHAS LEVANTADAS: 15 • APROVADAS: 15 • A CORRIGIR: 0
SISTEMA: SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S — COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CONTRATO CT 0.0442.00/2025 — CODEVASF
APOIO À FISCALIZAÇÃO: MINERVA ENGENHARIA

DATA: 12/11/2026
FONTE: LEVANTAMENTO GNSS/RTK (SISMIN)

MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE 12AL035, COM LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGINHAS FISCALIZADAS E BASE GNSS/RTK.

A PROPRIEDADE 12AL035 INTEGRA A CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPLADA NESTE RELATÓRIO PARCIAL. CONFORME A BASE DE PLANEJAMENTO, ESTÃO PREVISTAS 18 (DEZOITO) INTERVENÇÕES, DAS QUAIS 15 (QUINZE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS POR GNSS/RTK ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE	12AL035	PRODUTOR	ANTÔNIO LIMA DE ABREU
MUNICÍPIO/UF	INHUMAS/GO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	—
TELEFONE	(62)999256187	LOCALIZAÇÃO	LAT: -16.34767; LONG: -49.59699
BACIA HIDROGRÁFICA	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE	SITUAÇÃO DA FRENTE	CONCLUÍDA
BASE GNSS/RTK	12AL035-BASE	SISTEMA GEODÉSICO	SIRGAS 2000 / UTM / FUSO 22S
E BASE CORRIGIDO	650.305,847	N BASE CORRIGIDO	8.192.688,788
ELEVAÇÃO BASE CORRIGIDA (M)	959,19	SIGMAS 95% (E / N / H)	0,001 / 0,004 / 0,006

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA PROPRIEDADE 12AL035.

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL035P01	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P02	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P03	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P04	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P05	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P06	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P07	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P08	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P10	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P12	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P13	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P14	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	12 METROS	—
12AL035P15	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL035P16	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	—
12AL035P18	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	—	6 METROS	12 → 6 M

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL035.

QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES

OS QUANTITATIVOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DA PREVISÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PRODUTORES E NO PROJETO KML DA CODEVASF E DA QUANTIDADE DE BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK. O SALDO REMANESCENTE REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE O PREVISTO E O EXECUTADO.

INDICADOR	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES	18	10 6M, 2 12M, 6 EXISTENTE 6 M
BARRAGINHAS EXECUTADAS COM REGISTRO RTK	15	BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK
SALDO REMANESCENTE / NÃO PROCESSADO	3	DIFERENÇA ENTRE PREVISTO E EXECUTADO RTK
APROVADAS	15	CONCLUSÃO GERAL = ATENDE
PARA CORREÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = CORRIGIR
EM AVALIAÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = AVALIAR
AVANÇO FÍSICO (%)	83,33%	EXECUTADAS RTK / PREVISTAS


QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES DA PROPRIEDADE 12AL035.


TIPOLOGIA PREVISTA	QUANTIDADE PREVISTA
6M	10
12M	2
EXISTENTE 6 M	6

TIPOLOGIAS PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES DA PROPRIEDADE 12AL035.

PAINEL EXECUTIVO E GRÁFICOS COMPARATIVOS

OS GRÁFICOS APRESENTAM, PARA CADA PROPRIEDADE, A MESMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO: CONTROLE FÍSICO, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS REGISTRADAS NO PROCESSAMENTO RTK.

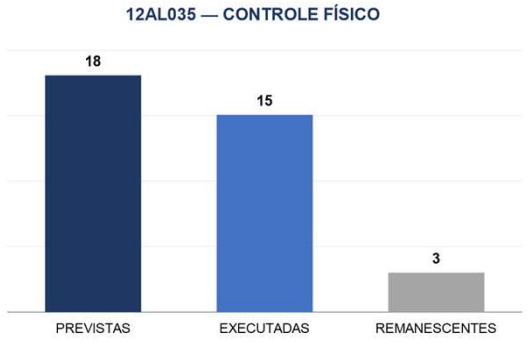

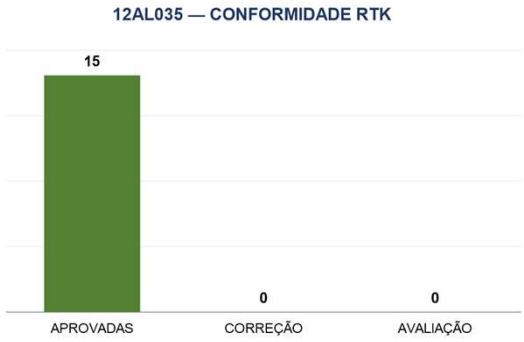

CONTROLE FÍSICO DA PROPRIEDADE 12AL035. • CONFORMIDADE RTK DA PROPRIEDADE 12AL035.



DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS NA PROPRIEDADE 12AL035.

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA VERTEDOR (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	TOPSOIL?	CONCLUSÃO GERAL
		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL035P01	6	1,63	97,14	1,29	3,08	6,87	2,19	2,55	SIM	ATENDE
12AL035P02	6	1,63	108,73	0,29	2,44	1,98	2,50	3,10	SIM	ATENDE
12AL035P03	6	1,65	112,35	0,25	2,61	1,98	2,68	3,50	SIM	ATENDE
12AL035P04	6	1,64	102,85	0,96	2,35	6,87	3,69	3,00	SIM	ATENDE

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL035P05	6	1,55	85,04	0,99	2,18	6,09	2,85	3,10	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL035P06	6	1,87	151,88	0,56	2,39	4,24	2,19	3,40	SIM	ATENDE
12AL035P07	6	2,13	155,88	0,37	2,42	2,50	2,54	4,50	SIM	ATENDE
12AL035P08	6	1,69	128,66	0,57	2,59	4,24	2,30	3,30	SIM	ATENDE
12AL035P10	6	1,71	129,97	0,82	2,45	6,87	2,59	3,40	SIM	ATENDE
12AL035P12	6	1,55	101,88	0,68	2,39	5,52	2,53	3,20	SIM	ATENDE
12AL035P13	6	1,88	165,92	0,40	2,51	2,50	2,39	3,00	SIM	ATENDE
12AL035P14	12	2,21	498,08	0,63	2,90	5,52	2,99	3,20	SIM	ATENDE
12AL035P15	6	1,76	104,87	0,43	2,59	3,05	2,45	3,30	SIM	ATENDE
12AL035P16	6	1,63	108,21	0,45	2,50	3,63	3,22	3,60	SIM	ATENDE
12AL035P18	6	2,01	166,35	0,57	2,60	4,24	2,83	2,50	SIM	ATENDE

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL035.

COORDENADAS E DADOS GNSS/RTK

A TABELA A SEGUIR APRESENTA A COORDENADA SÍNTESE DA INTERVENÇÃO E AS COTAS PRINCIPAIS EXTRAÍDAS DOS PONTOS PADRONIZADOS DO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

CÓDIGO DA INTERVENÇÃO	PONTO DE LOCALIZAÇÃO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA FUNDO (M)	COTA 1V (M)	STATUS
12AL035P01	13F	649.798,458	8.192.382,504	925,477	927,108	AJUSTADO
12AL035P02	13F	649.965,743	8.192.501,973	935,225	936,860	AJUSTADO
12AL035P03	13F	650.072,640	8.192.572,729	941,452	943,106	AJUSTADO
12AL035P04	13F	650.532,087	8.192.939,504	976,470	978,110	AJUSTADO
12AL035P05	13F	650.364,970	8.192.680,211	957,499	959,051	AJUSTADO
12AL035P06	13F	650.183,766	8.192.633,740	949,031	950,900	AJUSTADO
12AL035P07	13F	650.118,839	8.192.607,548	944,184	946,312	AJUSTADO
12AL035P08	13F	650.286,857	8.192.658,796	954,962	956,649	AJUSTADO
12AL035P10	13F	650.517,775	8.192.710,625	962,263	963,971	AJUSTADO
12AL035P12	13F	649.833,821	8.191.874,044	899,943	901,496	AJUSTADO
12AL035P13	13F	649.780,090	8.191.901,233	900,614	902,494	AJUSTADO
12AL035P14	13F	650.152,505	8.191.948,486	917,044	919,255	AJUSTADO
12AL035P15	13F	649.695,870	8.192.238,770	916,491	918,246	AJUSTADO
12AL035P16	13F	650.084,712	8.192.103,727	923,149	924,779	AJUSTADO
12AL035P18	13F	650.116,834	8.192.247,189	915,901	917,915	AJUSTADO

COORDENADA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES DA PROPRIEDADE 12AL035.

NA SEQUÊNCIA, APRESENTA-SE A TABELA DE PONTOS PADRONIZADOS POR BARRAGINHA, PRESERVANDO A NOMENCLATURA DO LEVANTAMENTO.

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL035P01	1V	649.790,847	8.192.381,241	927,108	AJUSTADO
12AL035P01	2V	649.789,766	8.192.381,705	927,391	AJUSTADO
12AL035P01	3V	649.792,111	8.192.379,711	927,177	AJUSTADO
12AL035P01	4V	649.792,299	8.192.378,554	927,616	AJUSTADO
12AL035P01	5C	649.793,898	8.192.377,063	928,075	AJUSTADO
12AL035P01	6C	649.802,147	8.192.378,107	928,398	AJUSTADO
12AL035P01	7C	649.805,198	8.192.384,476	928,602	AJUSTADO
12AL035P01	8C	649.803,701	8.192.391,660	928,619	AJUSTADO
12AL035P01	9DL	649.799,919	8.192.391,270	927,108	AJUSTADO
12AL035P01	10DL	649.799,651	8.192.379,037	927,107	AJUSTADO
12AL035P01	11DT	649.794,582	8.192.379,323	927,108	AJUSTADO
12AL035P01	12DT	649.801,325	8.192.389,376	927,139	AJUSTADO
12AL035P01	13F	649.798,458	8.192.382,504	925,477	AJUSTADO
12AL035P02	1V	649.975,800	8.192.506,363	936,860	AJUSTADO
12AL035P02	2V	649.976,482	8.192.507,353	937,026	AJUSTADO
12AL035P02	3V	649.975,147	8.192.505,316	936,900	AJUSTADO
12AL035P02	4V	649.974,871	8.192.504,834	937,285	AJUSTADO
12AL035P02	5C	649.974,156	8.192.502,436	937,440	AJUSTADO
12AL035P02	6C	649.969,164	8.192.496,111	937,193	AJUSTADO
12AL035P02	7C	649.959,683	8.192.495,981	937,148	AJUSTADO
12AL035P02	8C	649.956,806	8.192.506,079	937,525	AJUSTADO
12AL035P02	9DL	649.969,376	8.192.510,605	936,853	AJUSTADO
12AL035P02	10DL	649.960,847	8.192.499,459	936,848	AJUSTADO
12AL035P02	11DT	649.971,091	8.192.502,578	936,857	AJUSTADO
12AL035P02	12DT	649.959,758	8.192.505,908	936,864	AJUSTADO
12AL035P02	13F	649.965,743	8.192.501,973	935,225	AJUSTADO
12AL035P03	1V	650.079,812	8.192.581,292	943,106	AJUSTADO
12AL035P03	2V	650.079,931	8.192.582,807	943,311	AJUSTADO
12AL035P03	3V	650.080,590	8.192.580,278	943,273	AJUSTADO
12AL035P03	4V	650.081,061	8.192.579,620	943,680	AJUSTADO
12AL035P03	5C	650.082,221	8.192.577,206	943,677	AJUSTADO
12AL035P03	6C	650.080,152	8.192.569,468	943,359	AJUSTADO
12AL035P03	7C	650.072,806	8.192.565,602	943,381	AJUSTADO
12AL035P03	8C	650.064,445	8.192.578,042	943,694	AJUSTADO
12AL035P03	9DL	650.076,168	8.192.582,229	943,103	AJUSTADO
12AL035P03	10DL	650.070,130	8.192.569,888	943,087	AJUSTADO
12AL035P03	11DT	650.079,803	8.192.575,464	943,114	AJUSTADO
12AL035P03	12DT	650.067,854	8.192.578,484	943,100	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL035P03	13F	650.072,640	8.192.572,729	941,452	AJUSTADO
12AL035P04	1V	650.527,013	8.192.934,774	978,110	AJUSTADO
12AL035P04	2V	650.527,798	8.192.933,868	978,246	AJUSTADO
12AL035P04	3V	650.526,087	8.192.935,478	978,091	AJUSTADO
12AL035P04	4V	650.527,899	8.192.933,069	978,565	AJUSTADO
12AL035P04	5C	650.530,572	8.192.930,532	979,348	AJUSTADO
12AL035P04	6C	650.534,399	8.192.931,978	979,068	AJUSTADO
12AL035P04	7C	650.539,582	8.192.942,880	979,395	AJUSTADO
12AL035P04	8C	650.531,965	8.192.952,064	979,580	AJUSTADO
12AL035P04	9DL	650.524,809	8.192.941,938	978,111	AJUSTADO
12AL035P04	10DL	650.535,933	8.192.938,477	978,104	AJUSTADO
12AL035P04	11DT	650.529,700	8.192.933,662	978,116	AJUSTADO
12AL035P04	12DT	650.530,536	8.192.947,036	978,110	AJUSTADO
12AL035P04	13F	650.532,087	8.192.939,504	976,470	AJUSTADO
12AL035P05	1V	650.375,972	8.192.675,806	959,051	AJUSTADO
12AL035P05	2V	650.376,816	8.192.676,693	959,159	AJUSTADO
12AL035P05	3V	650.375,250	8.192.675,178	959,040	AJUSTADO
12AL035P05	4V	650.374,578	8.192.674,785	959,409	AJUSTADO
12AL035P05	5C	650.372,420	8.192.672,921	960,092	AJUSTADO
12AL035P05	6C	650.368,030	8.192.670,935	960,062	AJUSTADO
12AL035P05	7C	650.360,916	8.192.673,692	960,040	AJUSTADO
12AL035P05	8C	650.359,140	8.192.685,017	960,440	AJUSTADO
12AL035P05	9DL	650.371,167	8.192.683,802	959,079	AJUSTADO
12AL035P05	10DL	650.362,213	8.192.677,276	959,056	AJUSTADO
12AL035P05	11DT	650.370,693	8.192.674,487	959,045	AJUSTADO
12AL035P05	12DT	650.365,219	8.192.685,505	959,051	AJUSTADO
12AL035P05	13F	650.364,970	8.192.680,211	957,499	AJUSTADO
12AL035P06	1V	650.194,030	8.192.630,432	950,900	AJUSTADO
12AL035P06	2V	650.194,597	8.192.631,433	951,101	AJUSTADO
12AL035P06	3V	650.193,545	8.192.629,286	951,058	AJUSTADO
12AL035P06	4V	650.193,748	8.192.628,327	951,465	AJUSTADO
12AL035P06	5C	650.193,187	8.192.626,210	951,766	AJUSTADO
12AL035P06	6C	650.183,945	8.192.624,695	951,459	AJUSTADO
12AL035P06	7C	650.176,443	8.192.629,323	951,754	AJUSTADO
12AL035P06	8C	650.177,498	8.192.640,801	951,887	AJUSTADO
12AL035P06	9DL	650.189,137	8.192.640,007	950,905	AJUSTADO
12AL035P06	10DL	650.181,089	8.192.628,794	950,895	AJUSTADO
12AL035P06	11DT	650.190,321	8.192.628,513	950,895	AJUSTADO
12AL035P06	12DT	650.180,329	8.192.639,234	950,900	AJUSTADO
12AL035P06	13F	650.183,766	8.192.633,740	949,031	AJUSTADO
12AL035P07	1V	650.130,165	8.192.605,425	946,312	AJUSTADO
12AL035P07	2V	650.130,495	8.192.606,711	946,458	AJUSTADO
12AL035P07	3V	650.130,039	8.192.604,332	946,368	AJUSTADO
12AL035P07	4V	650.129,651	8.192.603,834	946,774	AJUSTADO
12AL035P07	5C	650.128,230	8.192.601,730	947,284	AJUSTADO
12AL035P07	6C	650.121,769	8.192.598,693	946,837	AJUSTADO
12AL035P07	7C	650.114,228	8.192.600,907	946,683	AJUSTADO
12AL035P07	8C	650.110,764	8.192.607,815	946,875	AJUSTADO
12AL035P07	9DL	650.123,143	8.192.613,755	946,343	AJUSTADO
12AL035P07	10DL	650.116,729	8.192.602,318	946,303	AJUSTADO
12AL035P07	11DT	650.124,504	8.192.602,105	946,315	AJUSTADO
12AL035P07	12DT	650.114,083	8.192.611,098	946,309	AJUSTADO
12AL035P07	13F	650.118,839	8.192.607,548	944,184	AJUSTADO
12AL035P08	1V	650.298,114	8.192.659,919	956,649	AJUSTADO
12AL035P08	2V	650.299,149	8.192.660,836	956,861	AJUSTADO
12AL035P08	3V	650.297,706	8.192.658,688	956,692	AJUSTADO
12AL035P08	4V	650.298,287	8.192.657,572	957,089	AJUSTADO
12AL035P08	5C	650.296,711	8.192.655,900	957,373	AJUSTADO
12AL035P08	6C	650.292,042	8.192.652,514	957,261	AJUSTADO
12AL035P08	7C	650.284,620	8.192.652,106	957,217	AJUSTADO
12AL035P08	8C	650.281,058	8.192.665,293	957,292	AJUSTADO
12AL035P08	9DL	650.294,139	8.192.665,845	956,647	AJUSTADO
12AL035P08	10DL	650.283,624	8.192.655,515	956,656	AJUSTADO
12AL035P08	11DT	650.294,498	8.192.657,762	956,643	AJUSTADO
12AL035P08	12DT	650.282,870	8.192.663,388	956,655	AJUSTADO
12AL035P08	13F	650.286,857	8.192.658,796	954,962	AJUSTADO
12AL035P10	1V	650.524,918	8.192.704,638	963,971	AJUSTADO
12AL035P10	2V	650.525,733	8.192.705,561	964,101	AJUSTADO
12AL035P10	3V	650.523,976	8.192.703,857	964,106	AJUSTADO
12AL035P10	4V	650.523,389	8.192.703,350	964,419	AJUSTADO
12AL035P10	5C	650.521,188	8.192.701,981	964,863	AJUSTADO
12AL035P10	6C	650.514,406	8.192.703,724	964,790	AJUSTADO
12AL035P10	7C	650.508,892	8.192.708,581	964,835	AJUSTADO
12AL035P10	8C	650.514,575	8.192.718,489	965,154	AJUSTADO
12AL035P10	9DL	650.525,857	8.192.715,313	963,975	AJUSTADO
12AL035P10	10DL	650.514,716	8.192.706,276	963,964	AJUSTADO
12AL035P10	11DT	650.521,122	8.192.704,366	963,986	AJUSTADO
12AL035P10	12DT	650.520,909	8.192.717,601	963,975	AJUSTADO
12AL035P10	13F	650.517,775	8.192.710,625	962,263	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL035P12	1V	649.821,405	8.191.882,013	901,496	AJUSTADO
12AL035P12	2V	649.820,625	8.191.882,897	901,778	AJUSTADO
12AL035P12	3V	649.822,354	8.191.881,246	901,563	AJUSTADO
12AL035P12	4V	649.822,670	8.191.880,771	901,825	AJUSTADO
12AL035P12	5C	649.823,515	8.191.878,383	902,175	AJUSTADO
12AL035P12	6C	649.825,541	8.191.874,772	902,180	AJUSTADO
12AL035P12	7C	649.827,894	8.191.870,970	902,214	AJUSTADO
12AL035P12	8C	649.832,399	8.191.866,822	902,496	AJUSTADO
12AL035P12	9DL	649.836,759	8.191.882,483	901,501	AJUSTADO
12AL035P12	10DL	649.829,397	8.191.873,589	901,490	AJUSTADO
12AL035P12	11DT	649.827,025	8.191.879,080	901,504	AJUSTADO
12AL035P12	12DT	649.841,155	8.191.877,777	901,492	AJUSTADO
12AL035P12	13F	649.833,821	8.191.874,044	899,943	AJUSTADO
12AL035P13	1V	649.790,045	8.191.901,723	902,494	AJUSTADO
12AL035P13	2V	649.791,175	8.191.902,488	902,699	AJUSTADO
12AL035P13	3V	649.789,580	8.191.900,550	902,516	AJUSTADO
12AL035P13	4V	649.789,067	8.191.900,467	902,712	AJUSTADO
12AL035P13	5C	649.787,721	8.191.898,494	903,560	AJUSTADO
12AL035P13	6C	649.781,155	8.191.895,431	903,134	AJUSTADO
12AL035P13	7C	649.771,919	8.191.900,836	902,893	AJUSTADO
12AL035P13	8C	649.773,212	8.191.915,392	902,970	AJUSTADO
12AL035P13	9DL	649.785,429	8.191.909,899	902,499	AJUSTADO
12AL035P13	10DL	649.773,747	8.191.902,651	902,492	AJUSTADO
12AL035P13	11DT	649.785,732	8.191.900,153	902,501	AJUSTADO
12AL035P13	12DT	649.775,883	8.191.912,768	902,506	AJUSTADO
12AL035P13	13F	649.780,090	8.191.901,233	900,614	AJUSTADO
12AL035P14	1V	650.137,221	8.191.962,211	919,255	AJUSTADO
12AL035P14	2V	650.137,860	8.191.963,358	919,552	AJUSTADO
12AL035P14	3V	650.136,504	8.191.960,795	919,190	AJUSTADO
12AL035P14	4V	650.136,091	8.191.959,595	919,761	AJUSTADO
12AL035P14	5C	650.135,001	8.191.956,809	920,001	AJUSTADO
12AL035P14	6C	650.140,768	8.191.949,536	919,898	AJUSTADO
12AL035P14	7C	650.148,176	8.191.941,241	919,882	AJUSTADO
12AL035P14	8C	650.162,876	8.191.937,817	920,479	AJUSTADO
12AL035P14	9DL	650.163,839	8.191.957,712	918,747	AJUSTADO
12AL035P14	10DL	650.145,606	8.191.947,555	919,278	AJUSTADO
12AL035P14	11DT	650.148,196	8.191.965,015	919,269	AJUSTADO
12AL035P14	12DT	650.163,634	8.191.942,653	919,258	AJUSTADO
12AL035P14	13F	650.152,505	8.191.948,486	917,044	AJUSTADO
12AL035P15	1V	649.702,037	8.192.244,291	918,246	AJUSTADO
12AL035P15	2V	649.702,097	8.192.245,599	918,429	AJUSTADO
12AL035P15	3V	649.702,574	8.192.243,055	918,308	AJUSTADO
12AL035P15	4V	649.702,620	8.192.242,700	918,739	AJUSTADO
12AL035P15	5C	649.704,068	8.192.240,723	919,075	AJUSTADO
12AL035P15	6C	649.701,639	8.192.233,707	918,679	AJUSTADO
12AL035P15	7C	649.691,111	8.192.233,147	918,825	AJUSTADO
12AL035P15	8C	649.686,436	8.192.239,698	919,264	AJUSTADO
12AL035P15	9DL	649.694,885	8.192.246,033	918,253	AJUSTADO
12AL035P15	10DL	649.697,498	8.192.234,783	918,231	AJUSTADO
12AL035P15	11DT	649.702,022	8.192.238,893	918,247	AJUSTADO
12AL035P15	12DT	649.689,375	8.192.240,992	918,231	AJUSTADO
12AL035P15	13F	649.695,870	8.192.238,770	916,491	AJUSTADO
12AL035P16	1V	650.083,544	8.192.094,256	924,779	AJUSTADO
12AL035P16	2V	650.084,589	8.192.093,429	925,087	AJUSTADO
12AL035P16	3V	650.082,424	8.192.094,687	924,866	AJUSTADO
12AL035P16	4V	650.082,351	8.192.094,977	925,173	AJUSTADO
12AL035P16	5C	650.079,143	8.192.095,201	925,558	AJUSTADO
12AL035P16	6C	650.075,722	8.192.098,998	925,229	AJUSTADO
12AL035P16	7C	650.075,359	8.192.104,848	925,231	AJUSTADO
12AL035P16	8C	650.086,995	8.192.111,643	925,827	AJUSTADO
12AL035P16	9DL	650.090,432	8.192.106,059	924,767	AJUSTADO
12AL035P16	10DL	650.077,797	8.192.103,095	924,779	AJUSTADO
12AL035P16	11DT	650.081,232	8.192.097,659	924,799	AJUSTADO
12AL035P16	12DT	650.088,900	8.192.107,849	924,778	AJUSTADO
12AL035P16	13F	650.084,712	8.192.103,727	923,149	AJUSTADO
12AL035P18	1V	650.120,564	8.192.237,513	917,915	AJUSTADO
12AL035P18	2V	650.121,341	8.192.236,712	918,189	AJUSTADO
12AL035P18	3V	650.118,968	8.192.237,764	917,881	AJUSTADO
12AL035P18	4V	650.118,436	8.192.237,807	918,224	AJUSTADO
12AL035P18	5C	650.115,625	8.192.238,127	918,729	AJUSTADO
12AL035P18	6C	650.111,260	8.192.241,100	918,489	AJUSTADO
12AL035P18	7C	650.111,089	8.192.250,600	918,637	AJUSTADO
12AL035P18	8C	650.118,409	8.192.254,656	918,672	AJUSTADO
12AL035P18	9DL	650.125,762	8.192.250,315	917,900	AJUSTADO
12AL035P18	10DL	650.111,775	8.192.244,351	917,895	AJUSTADO
12AL035P18	11DT	650.116,832	8.192.239,640	917,909	AJUSTADO
12AL035P18	12DT	650.119,618	8.192.252,826	917,895	AJUSTADO
12AL035P18	13F	650.116,834	8.192.247,189	915,901	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

COORDENADAS E COTAS DOS PONTOS PADRONIZADOS COLETADOS NA PROPRIEDADE 12AL035.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A ANÁLISE DE CONFORMIDADE FOI ESTRUTURADA A PARTIR DOS PARÂMETROS PROCESSADOS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK, COM A CLASSIFICAÇÃO APROVADA, PARA CORREÇÃO E EM AVALIAÇÃO.

CÓDIGO	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	CONCLUSÃO GERAL
	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL035P01	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P02	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P03	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P04	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P05	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL035P06	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P07	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P08	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P10	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P12	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P13	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P14	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P15	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P16	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL035P18	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPRIEDADE 12AL035.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF)

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 12AL035 É APRESENTADO NOS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, EM ORDEM NUMÉRICA. AS FOTOGRAFIAS CONTEMPLAM A BASE GNSS/RTK, AS BARRAGINHAS EXECUTADAS, VERTEDOUROS, DETALHES CONSTRUTIVOS E DEMAIS EVIDÊNCIAS DE CAMPO.

ELEMENTO DO RF	PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	DUAS COLUNAS, COM 3 LINHAS POR PÁGINA, CONFORME QUANTIDADE DE IMAGENS
LEGENDA	LEGENDA COM O NÚMERO DA BACIA (12AL035-PXX)
RASTREABILIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO CÓDIGO DA BARRAGINHA
CONTEÚDO MÍNIMO	BASE GNSS/RTK, VISTA GERAL, VERTEDOURO, CRISTA/TALUDES E DETALHES EXECUTIVOS

PADRÃO DE INSERÇÃO DO RF DA PROPRIEDADE 12AL035.

CONCLUSÃO TÉCNICA DA PROPRIEDADE

A PROPRIEDADE 12AL035 POSSUI 18 (DEZOITO) BARRAGINHAS PREVISTAS, DAS QUAIS 15 (QUINZE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS EM CAMPO, CORRESPONDENDO A 83,33% DE EXECUÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO.


AS 3 (TRÊS) BARRAGINHAS REMANESCENTES CORRESPONDEM ÀS INTERVENÇÕES AINDA NÃO EXECUTADAS NA DATA DA FISCALIZAÇÃO, PERMANECENDO VINCULADAS AO CRONOGRAMA DA EMPRESA EXECUTORA. CASO OCORRA DESISTÊNCIA PELO PRODUTOR RURAL, A SITUAÇÃO DEVERÁ SER FORMALIZADA MEDIANTE A RESPECTIVA ANUÊNCIA DE DESISTÊNCIA.

CONFORME OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO E DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 15 (QUINZE) BARRAGINHAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS.

TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À PROPRIEDADE 12AL035, COMPREENDENDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS DE PROCESSAMENTO, MAPAS, TABELAS, GRÁFICOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL038 — ANTÔNIO JACINTO DA SILVA

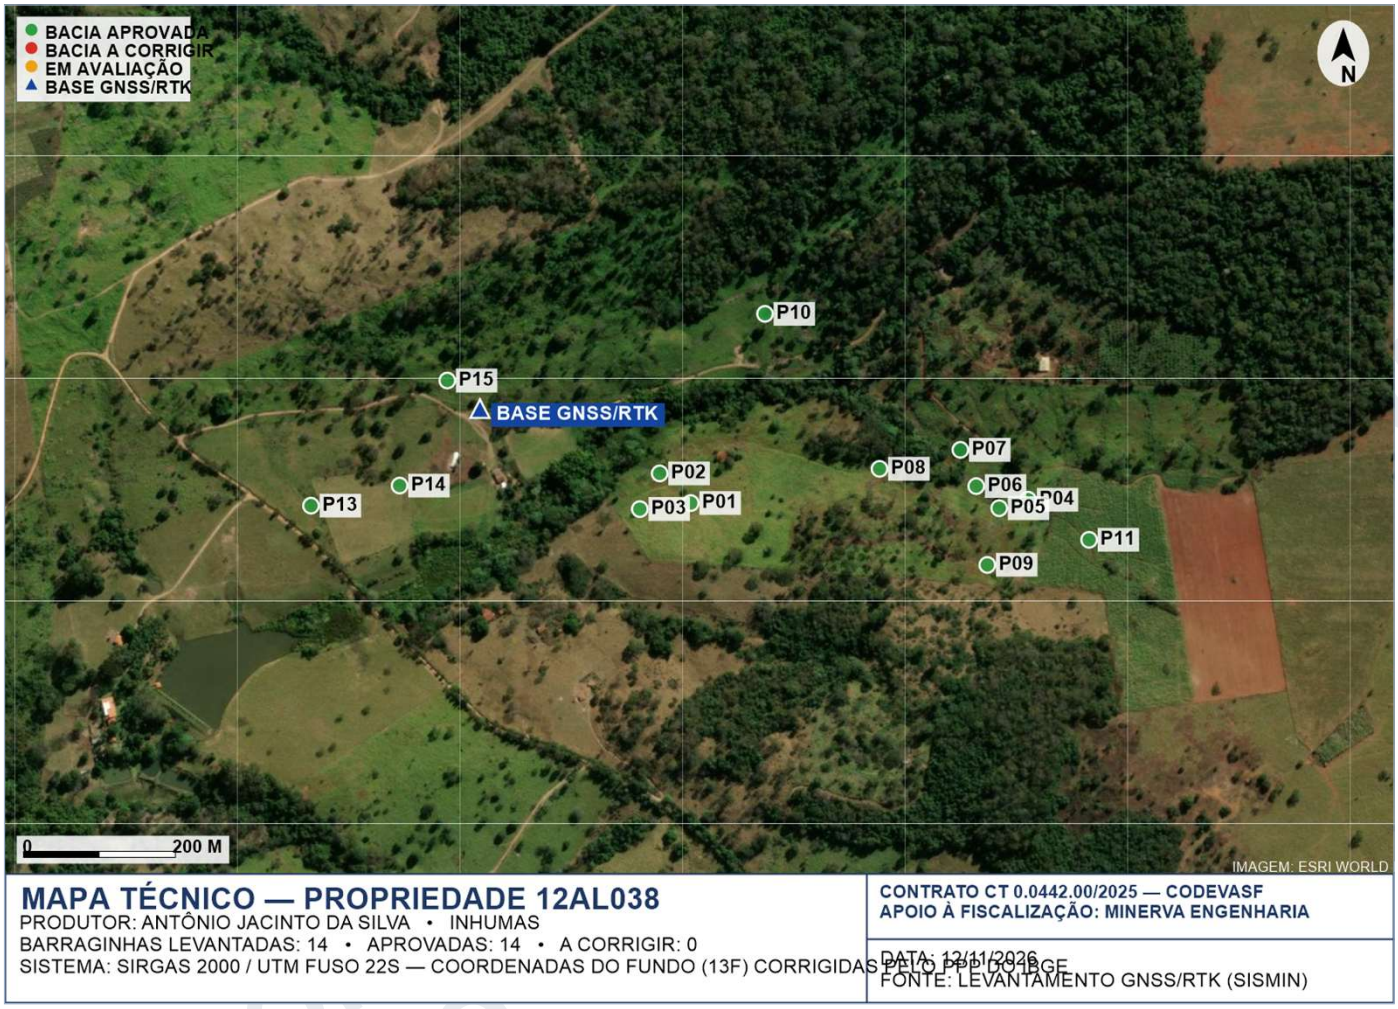

MAPA TÉCNICO — PROPRIEDADE 12AL038
PRODUTOR: ANTÔNIO JACINTO DA SILVA • INHUMAS
BARRAGINHAS LEVANTADAS: 14 • APROVADAS: 14 • A CORRIGIR: 0
SISTEMA: SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S — COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CONTRATO CT 0.0442.00/2025 — CODEVASF
APOIO À FISCALIZAÇÃO: MINERVA ENGENHARIA

DATA: 12/11/2026
FONTE: LEVANTAMENTO GNSS/RTK (SISMIN)

MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE 12AL038, COM LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGINHAS FISCALIZADAS E BASE GNSS/RTK.

A PROPRIEDADE 12AL038 INTEGRA A CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPLADA NESTE RELATÓRIO PARCIAL. CONFORME A BASE DE PLANEJAMENTO, ESTÃO PREVISTAS 14 (QUATORZE) INTERVENÇÕES, DAS QUAIS 14 (QUATORZE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS POR GNSS/RTK ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE	12AL038	PRODUTOR	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA
MUNICÍPIO/UF	INHUMAS/GO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	—
TELEFONE	(62)993556925	LOCALIZAÇÃO	LAT: -16.33975; LONG: -49.60831
BACIA HIDROGRÁFICA	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE	SITUAÇÃO DA FRENTE	CONCLUÍDA
BASE GNSS/RTK	12AL038-BASE	SISTEMA GEODÉSICO	SIRGAS 2000 / UTM / FUSO 22S
E BASE CORRIGIDO	648.634,808	N BASE CORRIGIDO	8.193.062,219
ELEVAÇÃO BASE CORRIGIDA (M)	886,42	SIGMAS 95% (E / N / H)	0,002 / 0,005 / 0,008

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA PROPRIEDADE 12AL038.

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL038P01	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P02	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P03	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P04	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P05	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P06	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P07	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	12 → 6 M
12AL038P08	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	12 → 6 M
12AL038P09	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P10	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	9 METROS	6 → 9 M
12AL038P11	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	9 METROS	6 → 9 M
12AL038P13	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL038P14	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL038P15	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL038.

QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES

OS QUANTITATIVOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DA PREVISÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PRODUTORES E NO PROJETO KML DA CODEVASF E DA QUANTIDADE DE BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK. O SALDO REMANESCENTE REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE O PREVISTO E O EXECUTADO.

INDICADOR	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES	14	11 6M, 1 12M, 1 EXISTENTE 6 M, 1 EXISTENTE 12 M
BARRAGINHAS EXECUTADAS COM REGISTRO RTK	14	BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK
SALDO REMANESCENTE / NÃO PROCESSADO	0	DIFERENÇA ENTRE PREVISTO E EXECUTADO RTK
APROVADAS	14	CONCLUSÃO GERAL = ATENDE
PARA CORREÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = CORRIGIR
EM AVALIAÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = AVALIAR
AVANÇO FÍSICO (%)	100,00%	EXECUTADAS RTK / PREVISTAS


QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES DA PROPRIEDADE 12AL038.


TIPOLOGIA PREVISTA	QUANTIDADE PREVISTA
6M	11
12M	1
EXISTENTE 6 M	1
EXISTENTE 12 M	1

TIPOLOGIAS PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES DA PROPRIEDADE 12AL038.

PAINEL EXECUTIVO E GRÁFICOS COMPARATIVOS

OS GRÁFICOS APRESENTAM, PARA CADA PROPRIEDADE, A MESMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO: CONTROLE FÍSICO, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS REGISTRADAS NO PROCESSAMENTO RTK.

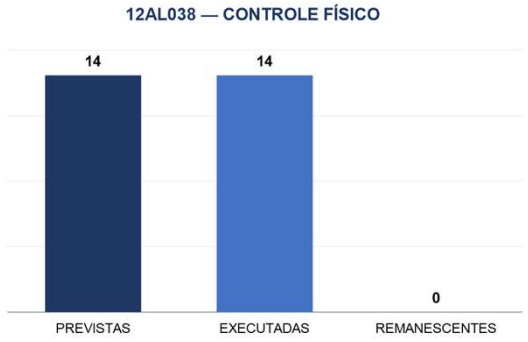

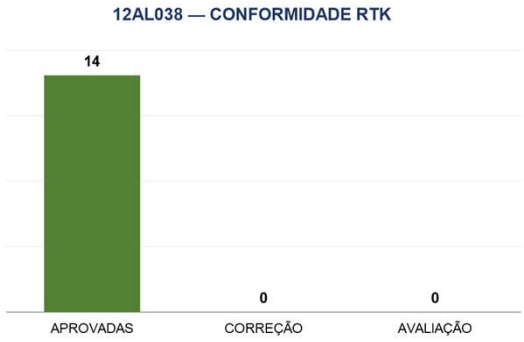

CONTROLE FÍSICO DA PROPRIEDADE 12AL038. • CONFORMIDADE RTK DA PROPRIEDADE 12AL038.



DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS NA PROPRIEDADE 12AL038.

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA VERTEDOR (HA)	DIST. VERT.- ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	TOPSOIL?	CONCLUSÃO GERAL
		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL038P01	6	1,79	97,36	0,43	2,68	3,05	1,57	3,00	SIM	ATENDE
12AL038P02	6	1,95	131,70	0,34	2,43	1,98	3,45	3,00	SIM	ATENDE
12AL038P03	6	2,03	123,75	0,26	2,36	1,98	1,89	3,10	SIM	ATENDE
12AL038P04	6	2,12	140,52	0,28	2,69	1,98	2,45	3,20	SIM	ATENDE
12AL038P05	6	1,86	113,41	0,28	2,79	1,98	2,70	2,80	SIM	ATENDE

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL038P06	6	1,56	80,34	0,75	2,45	6,87	3,15	3,50	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P07	6	2,01	135,14	0,80	2,41	6,87	3,18	3,20	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P08	6	1,89	126,24	0,39	2,46	2,50	4,69	3,10	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P09	6	2,11	111,58	0,42	2,61	3,05	4,10	2,60	SIM	ATENDE
12AL038P10	9	3,03	337,39	0,39	2,61	2,50	2,95	2,80	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P11	9	3,05	394,67	0,39	2,18	2,24	2,29	3,00	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P13	6	2,03	166,53	0,48	2,58	3,63	2,60	3,60	SIM	ATENDE
12AL038P14	6	1,65	81,06	0,83	2,27	6,87	2,45	2,60	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P15	6	1,96	97,28	0,39	2,56	2,50	2,45	3,20	SIM	ATENDE

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL038.

COORDENADAS E DADOS GNSS/RTK

A TABELA A SEGUIR APRESENTA A COORDENADA SÍNTESE DA INTERVENÇÃO E AS COTAS PRINCIPAIS EXTRAÍDAS DOS PONTOS PADRONIZADOS DO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

CÓDIGO DA INTERVENÇÃO	PONTO DE LOCALIZAÇÃO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA FUNDO (M)	COTA 1V (M)	STATUS
12AL038P01	13F	648.911,852	8.192.938,425	886,694	888,487	AJUSTADO
12AL038P02	13F	648.871,154	8.192.977,567	877,531	879,478	AJUSTADO
12AL038P03	13F	648.844,663	8.192.931,078	878,710	880,743	AJUSTADO
12AL038P04	13F	649.356,689	8.192.939,768	925,622	927,746	AJUSTADO
12AL038P05	13F	649.318,403	8.192.929,025	920,521	922,379	AJUSTADO
12AL038P06	13F	649.288,363	8.192.958,044	915,738	917,302	AJUSTADO
12AL038P07	13F	649.267,813	8.193.005,666	911,990	914,004	AJUSTADO
12AL038P08	13F	649.161,027	8.192.981,573	905,827	907,718	AJUSTADO
12AL038P09	13F	649.302,302	8.192.854,816	928,201	930,307	AJUSTADO
12AL038P10	13F	649.011,388	8.193.185,655	886,130	889,157	AJUSTADO
12AL038P11	13F	649.436,581	8.192.886,781	937,236	940,287	AJUSTADO
12AL038P13	13F	648.411,154	8.192.938,418	867,620	869,649	AJUSTADO
12AL038P14	13F	648.528,152	8.192.963,952	867,390	869,041	AJUSTADO
12AL038P15	13F	648.591,896	8.193.101,141	885,796	887,754	AJUSTADO

COORDENADA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES DA PROPRIEDADE 12AL038.

NA SEQUÊNCIA, APRESENTA-SE A TABELA DE PONTOS PADRONIZADOS POR BARRAGINHA, PRESERVANDO A NOMENCLATURA DO LEVANTAMENTO.

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL038P01	1V	648.905,835	8.192.930,010	888,487	AJUSTADO
12AL038P01	2V	648.906,281	8.192.928,486	888,735	AJUSTADO
12AL038P01	3V	648.905,820	8.192.931,130	888,519	AJUSTADO
12AL038P01	4V	648.906,170	8.192.931,357	888,771	AJUSTADO
12AL038P01	5C	648.906,487	8.192.932,892	888,966	AJUSTADO
12AL038P01	6C	648.906,361	8.192.937,099	888,915	AJUSTADO
12AL038P01	7C	648.909,790	8.192.944,427	889,014	AJUSTADO
12AL038P01	8C	648.918,899	8.192.945,496	889,394	AJUSTADO
12AL038P01	9DL	648.916,990	8.192.933,843	888,495	AJUSTADO
12AL038P01	10DL	648.911,574	8.192.943,135	888,481	AJUSTADO
12AL038P01	11DT	648.909,011	8.192.933,841	888,496	AJUSTADO
12AL038P01	12DT	648.919,725	8.192.940,199	888,493	AJUSTADO
12AL038P01	13F	648.911,852	8.192.938,425	886,694	AJUSTADO
12AL038P02	1V	648.878,570	8.192.985,777	879,478	AJUSTADO
12AL038P02	2V	648.879,711	8.192.986,306	879,722	AJUSTADO
12AL038P02	3V	648.877,436	8.192.985,453	879,513	AJUSTADO
12AL038P02	4V	648.877,096	8.192.984,898	880,068	AJUSTADO
12AL038P02	5C	648.873,764	8.192.985,789	879,996	AJUSTADO
12AL038P02	6C	648.869,459	8.192.983,273	879,845	AJUSTADO
12AL038P02	7C	648.865,405	8.192.978,589	879,820	AJUSTADO
12AL038P02	8C	648.866,037	8.192.970,253	879,918	AJUSTADO
12AL038P02	9DL	648.878,595	8.192.977,845	879,475	AJUSTADO
12AL038P02	10DL	648.866,505	8.192.975,668	879,480	AJUSTADO
12AL038P02	11DT	648.876,369	8.192.982,548	879,475	AJUSTADO
12AL038P02	12DT	648.872,243	8.192.969,578	879,476	AJUSTADO
12AL038P02	13F	648.871,154	8.192.977,567	877,531	AJUSTADO
12AL038P03	1V	648.841,823	8.192.920,138	880,743	AJUSTADO
12AL038P03	2V	648.842,463	8.192.918,998	880,944	AJUSTADO
12AL038P03	3V	648.841,451	8.192.921,133	880,744	AJUSTADO
12AL038P03	4V	648.841,749	8.192.921,644	881,292	AJUSTADO
12AL038P03	5C	648.840,839	8.192.923,300	881,244	AJUSTADO
12AL038P03	6C	648.837,232	8.192.929,666	881,007	AJUSTADO
12AL038P03	7C	648.843,018	8.192.937,290	881,255	AJUSTADO
12AL038P03	8C	648.853,627	8.192.936,161	882,160	AJUSTADO
12AL038P03	9DL	648.849,118	8.192.923,904	880,751	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL038P03	10DL	648.843,818	8.192.934,681	880,748	AJUSTADO
12AL038P03	11DT	648.840,929	8.192.927,294	880,740	AJUSTADO
12AL038P03	12DT	648.852,745	8.192.931,209	880,740	AJUSTADO
12AL038P03	13F	648.844,663	8.192.931,078	878,710	AJUSTADO
12AL038P04	1V	649.362,140	8.192.950,450	927,746	AJUSTADO
12AL038P04	2V	649.363,517	8.192.950,838	928,069	AJUSTADO
12AL038P04	3V	649.360,866	8.192.950,364	927,888	AJUSTADO
12AL038P04	4V	649.360,351	8.192.950,230	928,165	AJUSTADO
12AL038P04	5C	649.357,917	8.192.950,467	928,272	AJUSTADO
12AL038P04	6C	649.354,417	8.192.946,486	928,137	AJUSTADO
12AL038P04	7C	649.350,655	8.192.942,288	928,031	AJUSTADO
12AL038P04	8C	649.355,659	8.192.931,467	928,128	AJUSTADO
12AL038P04	9DL	649.364,927	8.192.940,355	927,744	AJUSTADO
12AL038P04	10DL	649.352,135	8.192.939,884	927,737	AJUSTADO
12AL038P04	11DT	649.358,676	8.192.946,180	927,743	AJUSTADO
12AL038P04	12DT	649.358,865	8.192.933,490	927,747	AJUSTADO
12AL038P04	13F	649.356,689	8.192.939,768	925,622	AJUSTADO
12AL038P05	1V	649.322,924	8.192.939,710	922,379	AJUSTADO
12AL038P05	2V	649.324,122	8.192.940,020	922,592	AJUSTADO
12AL038P05	3V	649.321,437	8.192.939,271	922,394	AJUSTADO
12AL038P05	4V	649.320,990	8.192.939,689	922,708	AJUSTADO
12AL038P05	5C	649.318,315	8.192.939,316	922,686	AJUSTADO
12AL038P05	6C	649.315,491	8.192.936,274	922,662	AJUSTADO
12AL038P05	7C	649.312,375	8.192.930,083	922,780	AJUSTADO
12AL038P05	8C	649.315,494	8.192.921,668	923,454	AJUSTADO
12AL038P05	9DL	649.325,438	8.192.927,122	922,374	AJUSTADO
12AL038P05	10DL	649.316,799	8.192.933,159	922,367	AJUSTADO
12AL038P05	11DT	649.320,691	8.192.938,042	922,381	AJUSTADO
12AL038P05	12DT	649.322,255	8.192.923,817	922,368	AJUSTADO
12AL038P05	13F	649.318,403	8.192.929,025	920,521	AJUSTADO
12AL038P06	1V	649.285,891	8.192.951,384	917,302	AJUSTADO
12AL038P06	2V	649.286,497	8.192.950,116	917,578	AJUSTADO
12AL038P06	3V	649.285,128	8.192.952,146	917,414	AJUSTADO
12AL038P06	4V	649.284,880	8.192.952,580	917,792	AJUSTADO
12AL038P06	5C	649.282,135	8.192.954,130	917,997	AJUSTADO
12AL038P06	6C	649.282,831	8.192.959,014	918,049	AJUSTADO
12AL038P06	7C	649.287,220	8.192.964,032	918,322	AJUSTADO
12AL038P06	8C	649.296,038	8.192.966,703	918,597	AJUSTADO
12AL038P06	9DL	649.293,454	8.192.951,036	917,298	AJUSTADO
12AL038P06	10DL	649.288,256	8.192.960,791	917,311	AJUSTADO
12AL038P06	11DT	649.285,773	8.192.954,244	917,300	AJUSTADO
12AL038P06	12DT	649.296,217	8.192.959,150	917,300	AJUSTADO
12AL038P06	13F	649.288,363	8.192.958,044	915,738	AJUSTADO
12AL038P07	1V	649.266,471	8.193.015,052	914,004	AJUSTADO
12AL038P07	2V	649.266,976	8.193.016,251	914,276	AJUSTADO
12AL038P07	3V	649.265,622	8.193.014,258	914,070	AJUSTADO
12AL038P07	4V	649.265,076	8.193.014,258	914,386	AJUSTADO
12AL038P07	5C	649.262,132	8.193.013,050	914,475	AJUSTADO
12AL038P07	6C	649.259,233	8.193.008,623	914,804	AJUSTADO
12AL038P07	7C	649.260,991	8.193.001,404	914,846	AJUSTADO
12AL038P07	8C	649.272,250	8.192.997,797	914,855	AJUSTADO
12AL038P07	9DL	649.273,479	8.193.008,661	914,011	AJUSTADO
12AL038P07	10DL	649.262,621	8.193.002,222	914,005	AJUSTADO
12AL038P07	11DT	649.265,424	8.193.011,866	913,996	AJUSTADO
12AL038P07	12DT	649.272,158	8.193.000,621	914,009	AJUSTADO
12AL038P07	13F	649.267,813	8.193.005,666	911,990	AJUSTADO
12AL038P08	1V	649.161,368	8.192.974,885	907,718	AJUSTADO
12AL038P08	2V	649.162,472	8.192.974,185	908,063	AJUSTADO
12AL038P08	3V	649.160,483	8.192.975,638	907,754	AJUSTADO
12AL038P08	4V	649.160,106	8.192.975,917	908,107	AJUSTADO
12AL038P08	5C	649.155,449	8.192.976,430	908,534	AJUSTADO
12AL038P08	6C	649.153,505	8.192.982,502	908,113	AJUSTADO
12AL038P08	7C	649.158,202	8.192.988,884	908,193	AJUSTADO
12AL038P08	8C	649.170,113	8.192.987,961	908,723	AJUSTADO
12AL038P08	9DL	649.168,793	8.192.978,316	907,707	AJUSTADO
12AL038P08	10DL	649.158,077	8.192.984,487	907,715	AJUSTADO
12AL038P08	11DT	649.156,781	8.192.978,502	907,706	AJUSTADO
12AL038P08	12DT	649.168,701	8.192.984,539	907,668	AJUSTADO
12AL038P08	13F	649.161,027	8.192.981,573	905,827	AJUSTADO
12AL038P09	1V	649.308,449	8.192.851,460	930,307	AJUSTADO
12AL038P09	2V	649.309,023	8.192.850,156	930,613	AJUSTADO
12AL038P09	3V	649.309,115	8.192.852,764	930,533	AJUSTADO
12AL038P09	4V	649.309,645	8.192.853,409	930,837	AJUSTADO
12AL038P09	5C	649.310,860	8.192.857,328	931,333	AJUSTADO
12AL038P09	6C	649.305,077	8.192.861,766	930,726	AJUSTADO
12AL038P09	7C	649.297,159	8.192.860,031	930,820	AJUSTADO
12AL038P09	8C	649.295,859	8.192.849,735	931,316	AJUSTADO
12AL038P09	9DL	649.305,006	8.192.848,673	930,304	AJUSTADO
12AL038P09	10DL	649.301,525	8.192.859,282	930,314	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL038P09	11DT	649.309,164	8.192.855,536	930,312	AJUSTADO
12AL038P09	12DT	649.298,525	8.192.851,030	930,337	AJUSTADO
12AL038P09	13F	649.302,302	8.192.854,816	928,201	AJUSTADO
12AL038P10	1V	649.001,570	8.193.190,138	889,157	AJUSTADO
12AL038P10	2V	649.000,770	8.193.190,880	889,479	AJUSTADO
12AL038P10	3V	649.002,578	8.193.188,999	889,252	AJUSTADO
12AL038P10	4V	649.002,533	8.193.188,221	889,616	AJUSTADO
12AL038P10	5C	649.002,434	8.193.185,273	889,948	AJUSTADO
12AL038P10	6C	649.004,818	8.193.180,796	889,642	AJUSTADO
12AL038P10	7C	649.009,906	8.193.177,218	889,549	AJUSTADO
12AL038P10	8C	649.017,088	8.193.176,679	889,856	AJUSTADO
12AL038P10	9DL	649.016,541	8.193.197,524	889,159	AJUSTADO
12AL038P10	10DL	649.009,144	8.193.179,052	889,155	AJUSTADO
12AL038P10	11DT	649.005,533	8.193.188,181	889,155	AJUSTADO
12AL038P10	12DT	649.017,458	8.193.181,538	889,152	AJUSTADO
12AL038P10	13F	649.011,388	8.193.185,655	886,130	AJUSTADO
12AL038P11	1V	649.448,750	8.192.886,343	940,287	AJUSTADO
12AL038P11	2V	649.449,816	8.192.885,885	940,559	AJUSTADO
12AL038P11	3V	649.447,953	8.192.887,019	940,463	AJUSTADO
12AL038P11	4V	649.447,320	8.192.887,303	940,902	AJUSTADO
12AL038P11	5C	649.446,345	8.192.889,375	941,012	AJUSTADO
12AL038P11	6C	649.440,483	8.192.894,231	940,898	AJUSTADO
12AL038P11	7C	649.430,088	8.192.894,194	940,728	AJUSTADO
12AL038P11	8C	649.426,433	8.192.881,983	940,679	AJUSTADO
12AL038P11	9DL	649.446,002	8.192.877,123	940,270	AJUSTADO
12AL038P11	10DL	649.430,018	8.192.890,837	940,273	AJUSTADO
12AL038P11	11DT	649.442,820	8.192.888,518	940,277	AJUSTADO
12AL038P11	12DT	649.430,522	8.192.879,840	940,273	AJUSTADO
12AL038P11	13F	649.436,581	8.192.886,781	937,236	AJUSTADO
12AL038P13	1V	648.422,792	8.192.940,414	869,649	AJUSTADO
12AL038P13	2V	648.423,328	8.192.941,696	869,878	AJUSTADO
12AL038P13	3V	648.422,685	8.192.939,195	869,800	AJUSTADO
12AL038P13	4V	648.422,068	8.192.938,978	870,202	AJUSTADO
12AL038P13	5C	648.422,251	8.192.936,384	870,377	AJUSTADO
12AL038P13	6C	648.416,146	8.192.933,468	870,218	AJUSTADO
12AL038P13	7C	648.407,550	8.192.932,347	870,129	AJUSTADO
12AL038P13	8C	648.400,987	8.192.940,805	870,506	AJUSTADO
12AL038P13	9DL	648.409,077	8.192.947,184	869,659	AJUSTADO
12AL038P13	10DL	648.411,996	8.192.934,500	869,658	AJUSTADO
12AL038P13	11DT	648.419,830	8.192.938,210	869,639	AJUSTADO
12AL038P13	12DT	648.405,067	8.192.943,362	869,641	AJUSTADO
12AL038P13	13F	648.411,154	8.192.938,418	867,620	AJUSTADO
12AL038P14	1V	648.519,318	8.192.963,978	869,041	AJUSTADO
12AL038P14	2V	648.518,532	8.192.964,453	869,316	AJUSTADO
12AL038P14	3V	648.519,984	8.192.962,702	869,007	AJUSTADO
12AL038P14	4V	648.520,039	8.192.961,930	869,533	AJUSTADO
12AL038P14	5C	648.521,779	8.192.960,201	870,219	AJUSTADO
12AL038P14	6C	648.525,295	8.192.957,948	870,008	AJUSTADO
12AL038P14	7C	648.533,375	8.192.958,494	869,867	AJUSTADO
12AL038P14	8C	648.537,140	8.192.967,532	870,135	AJUSTADO
12AL038P14	9DL	648.529,230	8.192.970,349	869,041	AJUSTADO
12AL038P14	10DL	648.529,282	8.192.960,126	869,001	AJUSTADO
12AL038P14	11DT	648.522,925	8.192.962,171	869,053	AJUSTADO
12AL038P14	12DT	648.533,036	8.192.968,397	869,037	AJUSTADO
12AL038P14	13F	648.528,152	8.192.963,952	867,390	AJUSTADO
12AL038P15	1V	648.603,601	8.193.095,825	887,754	AJUSTADO
12AL038P15	2V	648.604,731	8.193.096,834	888,044	AJUSTADO
12AL038P15	3V	648.603,127	8.193.094,834	887,899	AJUSTADO
12AL038P15	4V	648.602,693	8.193.094,444	888,218	AJUSTADO
12AL038P15	5C	648.600,725	8.193.092,992	888,456	AJUSTADO
12AL038P15	6C	648.593,998	8.193.093,817	888,143	AJUSTADO
12AL038P15	7C	648.587,485	8.193.095,935	888,257	AJUSTADO
12AL038P15	8C	648.583,058	8.193.102,602	888,524	AJUSTADO
12AL038P15	9DL	648.592,471	8.193.106,190	887,786	AJUSTADO
12AL038P15	10DL	648.590,118	8.193.097,541	887,750	AJUSTADO
12AL038P15	11DT	648.599,705	8.193.100,821	887,758	AJUSTADO
12AL038P15	12DT	648.586,724	8.193.104,686	887,761	AJUSTADO
12AL038P15	13F	648.591,896	8.193.101,141	885,796	AJUSTADO

COORDENADAS E COTAS DOS PONTOS PADRONIZADOS COLETADOS NA PROPRIEDADE 12AL038.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A ANÁLISE DE CONFORMIDADE FOI ESTRUTURADA A PARTIR DOS PARÂMETROS PROCESSADOS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK, COM A CLASSIFICAÇÃO APROVADA, PARA CORREÇÃO E EM AVALIAÇÃO.

CÓDIGO	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	CONCLUSÃO GERAL
	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL038P01	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL038P02	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL038P03	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL038P04	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL038P05	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL038P06	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P07	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P08	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P09	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL038P10	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P11	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P13	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL038P14	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL038P15	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPRIEDADE 12AL038.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF)

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 12AL038 É APRESENTADO NOS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, EM ORDEM NUMÉRICA. AS FOTOGRAFIAS CONTEMPLAM A BASE GNSS/RTK, AS BARRAGINHAS EXECUTADAS, VERTEDOUROS, DETALHES CONSTRUTIVOS E DEMAIS EVIDÊNCIAS DE CAMPO.

ELEMENTO DO RF	PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	DUAS COLUNAS, COM 3 LINHAS POR PÁGINA, CONFORME QUANTIDADE DE IMAGENS
LEGENDA	LEGENDA COM O NÚMERO DA BACIA (12AL038-PXX)
RASTREABILIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO CÓDIGO DA BARRAGINHA
CONTEÚDO MÍNIMO	BASE GNSS/RTK, VISTA GERAL, VERTEDOURO, CRISTA/TALUDES E DETALHES EXECUTIVOS

PADRÃO DE INSERÇÃO DO RF DA PROPRIEDADE 12AL038.

CONCLUSÃO TÉCNICA DA PROPRIEDADE

A PROPRIEDADE 12AL038 POSSUI 14 (QUATORZE) BARRAGINHAS PREVISTAS, DAS QUAIS 14 (QUATORZE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS EM CAMPO, CORRESPONDENDO A 100,00% DE EXECUÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO.

CONFORME OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO E DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 14 (QUATORZE) BARRAGINHAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS.


TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À PROPRIEDADE 12AL038, COMPREENDENDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS DE PROCESSAMENTO, MAPAS, TABELAS, GRÁFICOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL068 — ANTÔNIO JACINTO DA SILVA

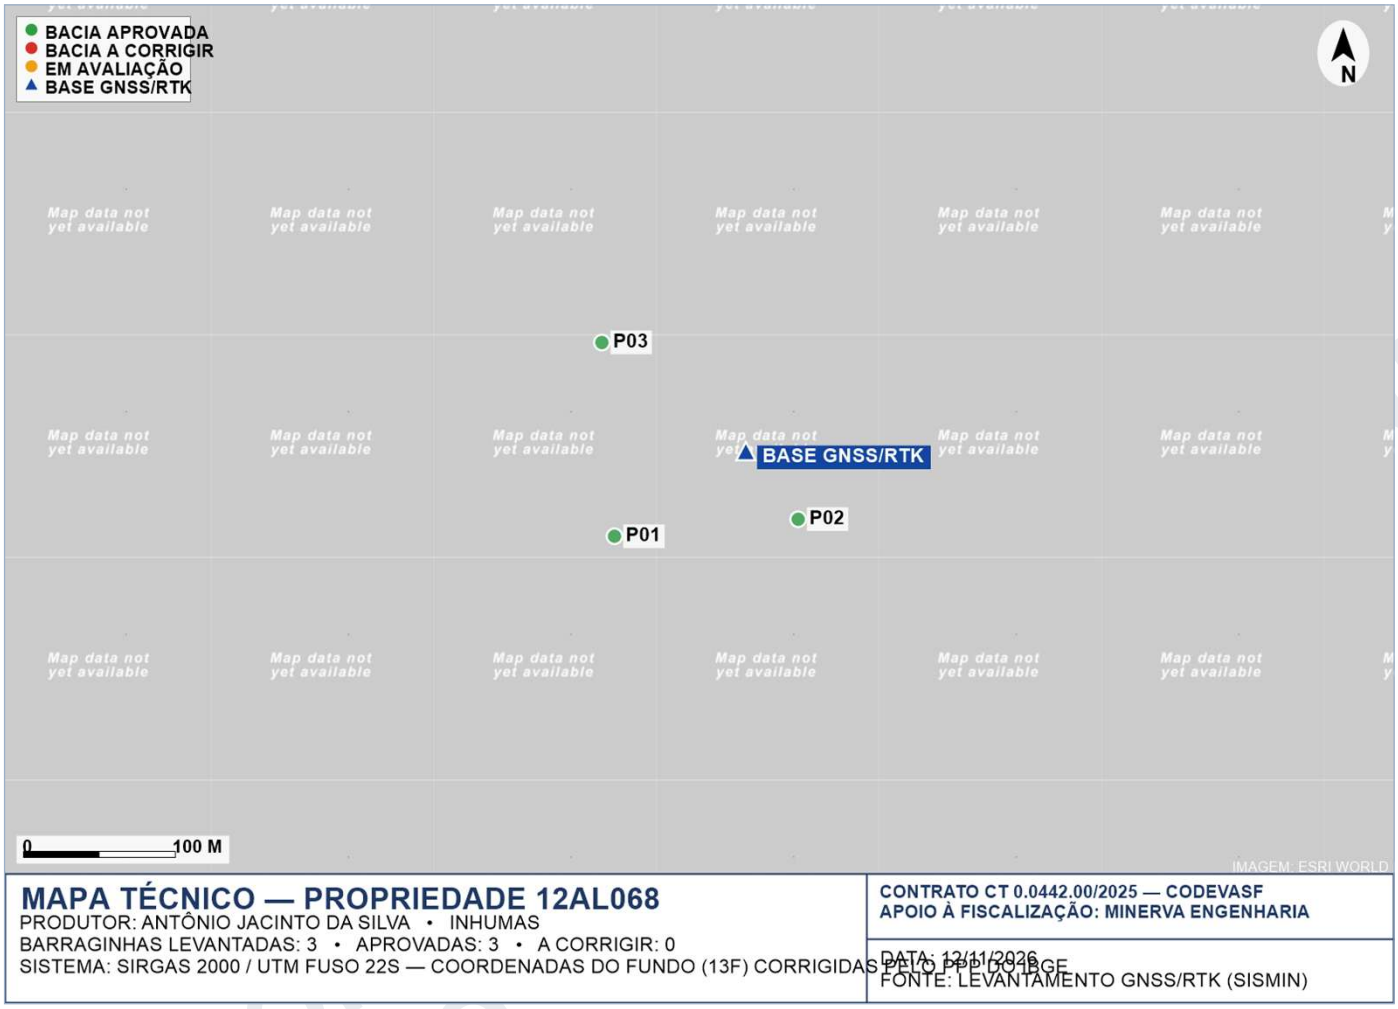

MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE 12AL068, COM LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGINHAS FISCALIZADAS E BASE GNSS/RTK.

A PROPRIEDADE 12AL068 INTEGRA A CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPLADA NESTE RELATÓRIO PARCIAL. CONFORME A BASE DE PLANEJAMENTO, ESTÃO PREVISTAS 3 (TRÊS) INTERVENÇÕES, DAS QUAIS 3 (TRÊS) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS POR GNSS/RTK ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE	12AL068	PRODUTOR	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA
MUNICÍPIO/UF	INHUMAS/GO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	—
TELEFONE	(62)993556925	LOCALIZAÇÃO	LAT: -16.33978; LONG: -49.61223
BACIA HIDROGRÁFICA	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE	SITUAÇÃO DA FRENTE	CONCLUÍDA
BASE GNSS/RTK	12AL068-BASE	SISTEMA GEODÉSICO	SIRGAS 2000 / UTM / FUSO 22S
E BASE CORRIGIDO	648.227,363	N BASE CORRIGIDO	8.193.029,373
ELEVAÇÃO BASE CORRIGIDA (M)	879,90	SIGMAS 95% (E / N / H)	0,002 / 0,010 / 0,011

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA PROPRIEDADE 12AL068.

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL068P01	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL068P02	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL068P03	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL068.

QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES

OS QUANTITATIVOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DA PREVISÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PRODUTORES E NO PROJETO KML DA CODEVASF E DA QUANTIDADE DE BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK. O SALDO REMANESCENTE REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE O PREVISTO E O EXECUTADO.

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

INDICADOR	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES	3	3 6M
BARRAGINHAS EXECUTADAS COM REGISTRO RTK	3	BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK
SALDO REMANESCENTE / NÃO PROCESSADO	0	DIFERENÇA ENTRE PREVISTO E EXECUTADO RTK
APROVADAS	3	CONCLUSÃO GERAL = ATENDE
PARA CORREÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = CORRIGIR
EM AVALIAÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = AVALIAR
AVANÇO FÍSICO (%)	100,00%	EXECUTADAS RTK / PREVISTAS


QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES DA PROPRIEDADE 12AL068.


TIPOLOGIA PREVISTA	QUANTIDADE PREVISTA
6M	3

TIPOLOGIAS PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES DA PROPRIEDADE 12AL068.

PAINEL EXECUTIVO E GRÁFICOS COMPARATIVOS

OS GRÁFICOS APRESENTAM, PARA CADA PROPRIEDADE, A MESMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO: CONTROLE FÍSICO, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS REGISTRADAS NO PROCESSAMENTO RTK.

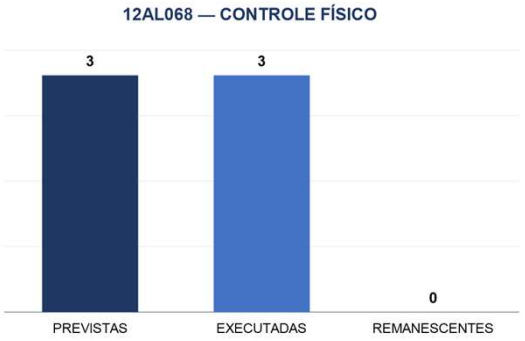

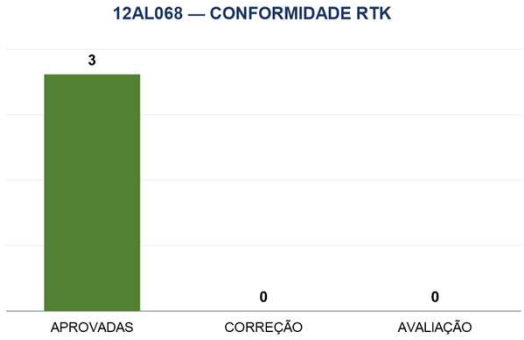

CONTROLE FÍSICO DA PROPRIEDADE 12AL068. • CONFORMIDADE RTK DA PROPRIEDADE 12AL068.



DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS NA PROPRIEDADE 12AL068.

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA VERTEDOR (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	TOPSOIL?	CONCLUSÃO GERAL
		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL068P01	6	1,94	96,85	1,07	2,78	6,87	3,20	2,80	SIM	ATENDE
12AL068P02	6	1,93	97,24	0,65	2,47	5,52	3,05	3,00	SIM	ATENDE
12AL068P03	6	2,55	242,72	0,39	2,51	2,50	2,74	3,00	SIM	ATENDE

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL068.

COORDENADAS E DADOS GNSS/RTK

A TABELA A SEGUIR APRESENTA A COORDENADA SÍNTESE DA INTERVENÇÃO E AS COTAS PRINCIPAIS EXTRAÍDAS DOS PONTOS PADRONIZADOS DO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

CÓDIGO DA INTERVENÇÃO	PONTO DE LOCALIZAÇÃO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA FUNDO (M)	COTA 1V (M)	STATUS
12AL068P01	13F	648.140,406	8.192.975,058	871,029	872,971	AJUSTADO
12AL068P02	13F	648.261,561	8.192.985,392	873,800	875,727	AJUSTADO
12AL068P03	13F	648.132,903	8.193.102,042	882,880	885,428	AJUSTADO

COORDENADA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES DA PROPRIEDADE 12AL068.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

NA SEQUÊNCIA, APRESENTA-SE A TABELA DE PONTOS PADRONIZADOS POR BARRAGINHA, PRESERVANDO A NOMENCLATURA DO LEVANTAMENTO.

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL068P01	1V	648.147,726	8.192.977,725	872,971	AJUSTADO
12AL068P01	2V	648.149,205	8.192.978,406	873,200	AJUSTADO
12AL068P01	3V	648.147,030	8.192.976,677	872,963	AJUSTADO
12AL068P01	4V	648.146,669	8.192.975,709	873,259	AJUSTADO
12AL068P01	5C	648.146,508	8.192.972,513	874,041	AJUSTADO
12AL068P01	6C	648.143,039	8.192.969,191	874,061	AJUSTADO
12AL068P01	7C	648.137,403	8.192.968,763	874,039	AJUSTADO
12AL068P01	8C	648.131,831	8.192.972,438	874,245	AJUSTADO
12AL068P01	9DL	648.138,562	8.192.982,340	872,964	AJUSTADO
12AL068P01	10DL	648.139,550	8.192.971,678	872,972	AJUSTADO
12AL068P01	11DT	648.146,240	8.192.976,122	872,961	AJUSTADO
12AL068P01	12DT	648.134,902	8.192.977,210	872,972	AJUSTADO
12AL068P01	13F	648.140,406	8.192.975,058	871,029	AJUSTADO
12AL068P02	1V	648.254,926	8.192.980,405	875,727	AJUSTADO
12AL068P02	2V	648.253,569	8.192.980,437	875,884	AJUSTADO
12AL068P02	3V	648.255,957	8.192.979,823	875,725	AJUSTADO
12AL068P02	4V	648.256,214	8.192.979,560	876,218	AJUSTADO
12AL068P02	5C	648.257,597	8.192.976,837	876,282	AJUSTADO
12AL068P02	6C	648.262,313	8.192.975,212	876,379	AJUSTADO
12AL068P02	7C	648.269,600	8.192.981,201	876,593	AJUSTADO
12AL068P02	8C	648.265,704	8.192.991,383	877,207	AJUSTADO
12AL068P02	9DL	648.255,233	8.192.986,214	875,727	AJUSTADO
12AL068P02	10DL	648.263,938	8.192.978,675	875,724	AJUSTADO
12AL068P02	11DT	648.257,418	8.192.980,066	875,732	AJUSTADO
12AL068P02	12DT	648.262,835	8.192.989,327	875,732	AJUSTADO
12AL068P02	13F	648.261,561	8.192.985,392	873,800	AJUSTADO
12AL068P03	1V	648.147,132	8.193.101,785	885,428	AJUSTADO
12AL068P03	2V	648.148,434	8.193.101,781	885,704	AJUSTADO
12AL068P03	3V	648.145,959	8.193.101,384	885,384	AJUSTADO
12AL068P03	4V	648.145,510	8.193.101,469	885,871	AJUSTADO
12AL068P03	5C	648.143,556	8.193.099,548	886,430	AJUSTADO
12AL068P03	6C	648.140,390	8.193.097,335	886,053	AJUSTADO
12AL068P03	7C	648.135,465	8.193.094,517	885,913	AJUSTADO
12AL068P03	8C	648.131,420	8.193.092,889	885,820	AJUSTADO
12AL068P03	9DL	648.133,258	8.193.111,156	885,434	AJUSTADO
12AL068P03	10DL	648.135,957	8.193.096,269	885,416	AJUSTADO
12AL068P03	11DT	648.140,687	8.193.106,803	885,403	AJUSTADO
12AL068P03	12DT	648.127,519	8.193.098,701	885,412	AJUSTADO
12AL068P03	13F	648.132,903	8.193.102,042	882,880	AJUSTADO

COORDENADAS E COTAS DOS PONTOS PADRONIZADOS COLETADOS NA PROPRIEDADE 12AL068.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A ANÁLISE DE CONFORMIDADE FOI ESTRUTURADA A PARTIR DOS PARÂMETROS PROCESSADOS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK, COM A CLASSIFICAÇÃO APROVADA, PARA CORREÇÃO E EM AVALIAÇÃO.

CÓDIGO	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	CONCLUSÃO GERAL
	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL068P01	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL068P02	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL068P03	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPRIEDADE 12AL068.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF)

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 12AL068 É APRESENTADO NOS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, EM ORDEM NUMÉRICA. AS FOTOGRAFIAS CONTEMPLAM A BASE GNSS/RTK, AS BARRAGINHAS EXECUTADAS, VERTEDOUROS, DETALHES CONSTRUTIVOS E DEMAIS EVIDÊNCIAS DE CAMPO.

ELEMENTO DO RF	PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	DUAS COLUNAS, COM 3 LINHAS POR PÁGINA, CONFORME QUANTIDADE DE IMAGENS
LEGENDA	LEGENDA COM O NÚMERO DA BACIA (12AL068-PXX)
RASTREABILIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO CÓDIGO DA BARRAGINHA
CONTEÚDO MÍNIMO	BASE GNSS/RTK, VISTA GERAL, VERTEDOURO, CRISTA/TALUDES E DETALHES EXECUTIVOS

PADRÃO DE INSERÇÃO DO RF DA PROPRIEDADE 12AL068.

CONCLUSÃO TÉCNICA DA PROPRIEDADE

A PROPRIEDADE 12AL068 POSSUI 3 (TRÊS) BARRAGINHAS PREVISTAS, DAS QUAIS 3 (TRÊS) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS EM CAMPO, CORRESPONDENDO A 100,00% DE EXECUÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO.

CONFORME OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO E DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 3 (TRÊS) BARRAGINHAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).


TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À PROPRIEDADE 12AL068, COMPREENDENDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS DE PROCESSAMENTO, MAPAS, TABELAS, GRÁFICOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA
USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROPRIEDADE 12AL115 — MILTON JACINTO DA SILVA

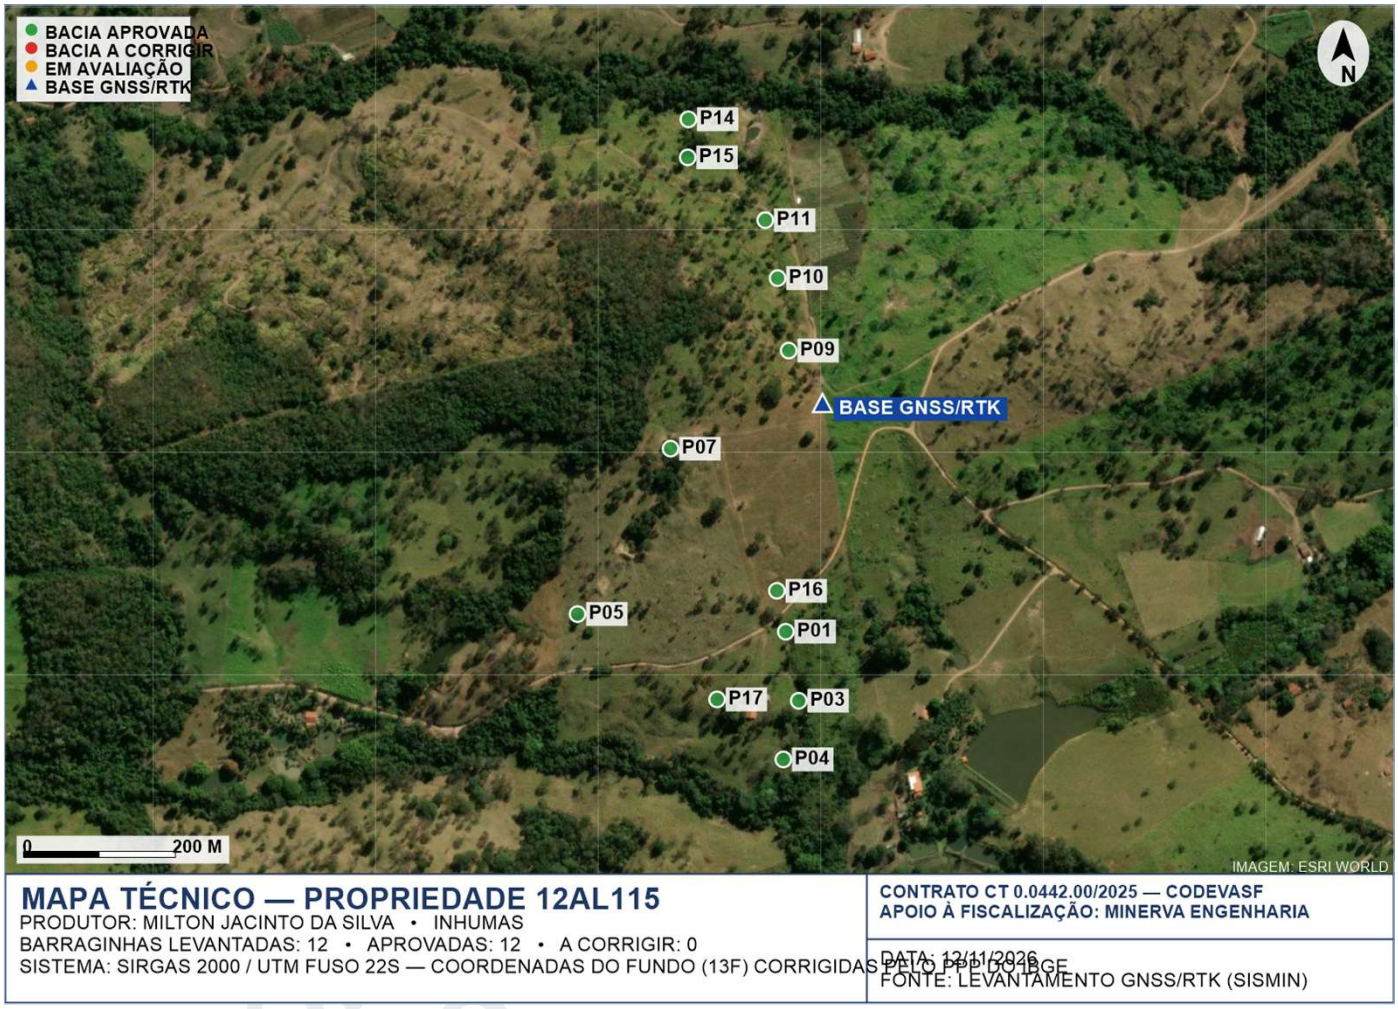

MAPA TÉCNICO — PROPRIEDADE 12AL115
PRODUTOR: MILTON JACINTO DA SILVA • INHUMAS
BARRAGINHAS LEVANTADAS: 12 • APROVADAS: 12 • A CORRIGIR: 0
SISTEMA: SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S — COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CONTRATO CT 0.0442.00/2025 — CODEVASF
APOIO À FISCALIZAÇÃO: MINERVA ENGENHARIA

DATA: 12/11/2026
FONTE: LEVANTAMENTO GNSS/RTK (SISMIN)

MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE 12AL115, COM LOCALIZAÇÃO DAS BARRAGINHAS FISCALIZADAS E BASE GNSS/RTK.

A PROPRIEDADE 12AL115 INTEGRA A CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO CONTEMPLADA NESTE RELATÓRIO PARCIAL. CONFORME A BASE DE PLANEJAMENTO, ESTÃO PREVISTAS 16 (DEZESSEIS) INTERVENÇÕES, DAS QUAIS 12 (DOZE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS POR GNSS/RTK ATÉ A DATA DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

CAMPO	INFORMAÇÃO	CAMPO	INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE	12AL115	PRODUTOR	MILTON JACINTO DA SILVA
MUNICÍPIO/UF	INHUMAS/GO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	—
TELEFONE	(62)992651717	LOCALIZAÇÃO	LAT: -16.34169; LONG: -49.61511
BACIA HIDROGRÁFICA	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE	SITUAÇÃO DA FRENTE	CONCLUÍDA
BASE GNSS/RTK	12AL115-BASE	SISTEMA GEODÉSICO	SIRGAS 2000 / UTM / FUSO 22S
E BASE CORRIGIDO	648.024,471	N BASE CORRIGIDO	8.193.171,281
ELEVAÇÃO BASE CORRIGIDA (M)	893,52	SIGMAS 95% (E / N / H)	0,001 / 0,004 / 0,007

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DA PROPRIEDADE 12AL115.

CÓDIGO	PRODUTOR	DATA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO	MUDANÇA DE RAIO
12AL115P01	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P03	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P04	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P05	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P07	MILTON JACINTO DA SILVA	—	9 METROS	6 → 9 M
12AL115P09	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P10	MILTON JACINTO DA SILVA	—	9 METROS	6 → 9 M
12AL115P11	MILTON JACINTO DA SILVA	—	12 METROS	—
12AL115P14	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P15	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P16	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—
12AL115P17	MILTON JACINTO DA SILVA	—	6 METROS	—

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL115.

QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES

OS QUANTITATIVOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DA PREVISÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PRODUTORES E NO PROJETO KML DA CODEVASF E DA QUANTIDADE DE BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK. O SALDO REMANESCENTE REPRESENTA A DIFERENÇA ENTRE O PREVISTO E O EXECUTADO.

INDICADOR	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES	16	14 6M, 1 12M, 1 EXISTENTE 6 M
BARRAGINHAS EXECUTADAS COM REGISTRO RTK	12	BARRAGINHAS PROCESSADAS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK
SALDO REMANESCENTE / NÃO PROCESSADO	4	DIFERENÇA ENTRE PREVISTO E EXECUTADO RTK
APROVADAS	12	CONCLUSÃO GERAL = ATENDE
PARA CORREÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = CORRIGIR
EM AVALIAÇÃO	0	CONCLUSÃO GERAL = AVALIAR
AVANÇO FÍSICO (%)	75,00%	EXECUTADAS RTK / PREVISTAS


QUANTITATIVOS PREVISTOS, EXECUTADOS E REMANESCENTES DA PROPRIEDADE 12AL115.


TIPOLOGIA PREVISTA	QUANTIDADE PREVISTA
6M	14
12M	1
EXISTENTE 6 M	1

TIPOLOGIAS PREVISTAS NA BASE DE PRODUTORES DA PROPRIEDADE 12AL115.


PAINEL EXECUTIVO E GRÁFICOS COMPARATIVOS

OS GRÁFICOS APRESENTAM, PARA CADA PROPRIEDADE, A MESMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO: CONTROLE FÍSICO, ANÁLISE DE CONFORMIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS REGISTRADAS NO PROCESSAMENTO RTK.

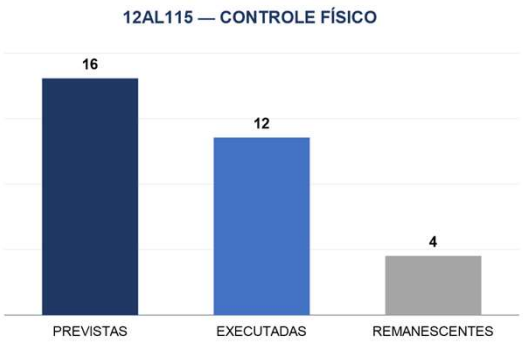

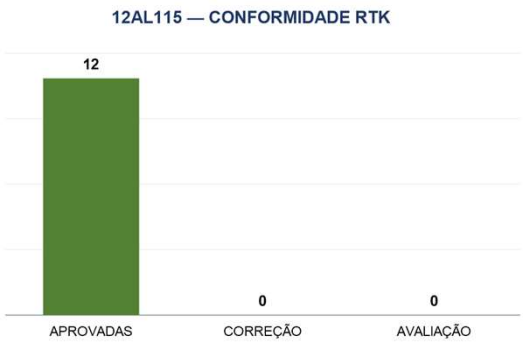

CONTROLE FÍSICO DA PROPRIEDADE 12AL115. • CONFORMIDADE RTK DA PROPRIEDADE 12AL115.

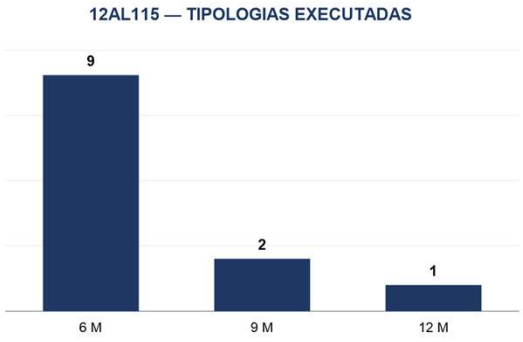

DISTRIBUIÇÃO DAS TIPOLOGIAS EXECUTADAS NA PROPRIEDADE 12AL115.

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS

CÓDIGO	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA VERTEDOR (HA)	DIST. VERT.- ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	TOPSOIL?	CONCLUSÃO GERAL
		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL115P01	6	1,92	99,76	0,39	2,63	2,50	2,65	3,10	SIM	ATENDE
12AL115P03	6	2,53	175,80	0,22	2,67	0,00	2,43	2,70	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P04	6	1,92	116,63	0,61	3,11	5,52	2,45	2,80	SIM	ATENDE
12AL115P05	6	2,09	237,77	0,20	2,25	0,00	2,33	2,90	SIM	ATENDE COM RESSALVA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		MEDIÇÃO	MEDIÇÃO		
12AL115P07	9	2,38	323,23	0,31	2,35	1,98	1,91	2,90	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P09	6	1,72	89,01	0,62	2,42	5,52	2,68	3,10	SIM	ATENDE
12AL115P10	9	2,55	309,35	0,45	2,59	3,05	1,88	2,80	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P11	12	2,09	207,95	0,86	2,57	6,87	3,20	3,20	SIM	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P14	6	2,11	103,24	0,62	2,40	5,52	2,74	3,30	SIM	ATENDE
12AL115P15	6	1,98	101,02	0,85	2,58	6,87	2,47	4,00	SIM	ATENDE
12AL115P16	6	1,87	124,65	0,43	2,81	3,05	4,54	3,30	SIM	ATENDE
12AL115P17	6	1,73	122,12	0,42	2,53	3,05	2,94	2,90	SIM	ATENDE

CONTROLE INDIVIDUAL DAS BARRAGINHAS DA PROPRIEDADE 12AL115.

COORDENADAS E DADOS GNSS/RTK

A TABELA A SEGUIR APRESENTA A COORDENADA SÍNTESE DA INTERVENÇÃO E AS COTAS PRINCIPAIS EXTRAÍDAS DOS PONTOS PADRONIZADOS DO LEVANTAMENTO GNSS/RTK.

CÓDIGO DA INTERVENÇÃO	PONTO DE LOCALIZAÇÃO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA FUNDO (M)	COTA 1V (M)	STATUS
12AL115P01	13F	647.973,970	8.192.873,712	865,735	867,656	AJUSTADO
12AL115P03	13F	647.990,425	8.192.783,110	854,964	857,490	AJUSTADO
12AL115P04	13F	647.969,655	8.192.706,316	846,201	848,122	AJUSTADO
12AL115P05	13F	647.699,533	8.192.898,666	855,164	857,254	AJUSTADO
12AL115P07	13F	647.823,777	8.193.114,489	883,584	885,968	AJUSTADO
12AL115P09	13F	647.980,398	8.193.241,899	883,771	885,488	AJUSTADO
12AL115P10	13F	647.966,294	8.193.336,900	871,193	873,745	AJUSTADO
12AL115P11	13F	647.950,678	8.193.412,975	865,026	867,112	AJUSTADO
12AL115P14	13F	647.850,081	8.193.545,845	844,631	846,742	AJUSTADO
12AL115P15	13F	647.848,886	8.193.495,885	853,793	855,771	AJUSTADO
12AL115P16	13F	647.962,640	8.192.927,288	870,840	872,712	AJUSTADO
12AL115P17	13F	647.882,743	8.192.785,511	858,527	860,255	AJUSTADO

COORDENADA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES DA PROPRIEDADE 12AL115.

NA SEQUÊNCIA, APRESENTA-SE A TABELA DE PONTOS PADRONIZADOS POR BARRAGINHA, PRESERVANDO A NOMENCLATURA DO LEVANTAMENTO.

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL115P01	1V	647.964,487	8.192.869,528	867,656	AJUSTADO
12AL115P01	2V	647.963,274	8.192.869,231	867,894	AJUSTADO
12AL115P01	3V	647.965,810	8.192.869,916	867,692	AJUSTADO
12AL115P01	4V	647.966,495	8.192.869,953	868,123	AJUSTADO
12AL115P01	5C	647.968,904	8.192.868,855	868,324	AJUSTADO
12AL115P01	6C	647.976,593	8.192.869,571	868,045	AJUSTADO
12AL115P01	7C	647.980,759	8.192.872,651	868,272	AJUSTADO
12AL115P01	8C	647.979,124	8.192.880,648	868,492	AJUSTADO
12AL115P01	9DL	647.973,989	8.192.881,784	867,644	AJUSTADO
12AL115P01	10DL	647.975,694	8.192.871,322	867,652	AJUSTADO
12AL115P01	11DT	647.966,929	8.192.875,687	867,641	AJUSTADO
12AL115P01	12DT	647.978,894	8.192.876,740	867,627	AJUSTADO
12AL115P01	13F	647.973,970	8.192.873,712	865,735	AJUSTADO
12AL115P03	1V	647.984,371	8.192.781,312	857,490	AJUSTADO
12AL115P03	2V	647.983,211	8.192.781,957	857,746	AJUSTADO
12AL115P03	3V	647.985,500	8.192.780,588	857,545	AJUSTADO
12AL115P03	4V	647.985,603	8.192.780,084	857,931	AJUSTADO
12AL115P03	5C	647.986,555	8.192.777,851	857,870	AJUSTADO
12AL115P03	6C	647.988,802	8.192.777,431	857,818	AJUSTADO
12AL115P03	7C	647.991,697	8.192.777,316	857,708	AJUSTADO
12AL115P03	8C	647.995,253	8.192.777,786	857,735	AJUSTADO
12AL115P03	9DL	647.992,993	8.192.795,832	857,497	AJUSTADO
12AL115P03	10DL	647.990,099	8.192.779,451	857,489	AJUSTADO
12AL115P03	11DT	647.986,616	8.192.786,578	857,509	AJUSTADO
12AL115P03	12DT	647.996,360	8.192.783,763	857,507	AJUSTADO
12AL115P03	13F	647.990,425	8.192.783,110	854,964	AJUSTADO
12AL115P04	1V	647.956,290	8.192.704,166	848,122	AJUSTADO
12AL115P04	2V	647.955,321	8.192.705,630	848,458	AJUSTADO
12AL115P04	3V	647.957,417	8.192.703,335	848,139	AJUSTADO
12AL115P04	4V	647.957,843	8.192.702,941	848,567	AJUSTADO
12AL115P04	5C	647.960,061	8.192.701,908	849,038	AJUSTADO
12AL115P04	6C	647.962,773	8.192.700,711	848,996	AJUSTADO
12AL115P04	7C	647.965,986	8.192.699,348	848,733	AJUSTADO
12AL115P04	8C	647.971,690	8.192.697,584	848,841	AJUSTADO
12AL115P04	9DL	647.970,141	8.192.714,906	848,105	AJUSTADO
12AL115P04	10DL	647.965,923	8.192.702,543	848,111	AJUSTADO
12AL115P04	11DT	647.963,765	8.192.710,841	848,102	AJUSTADO
12AL115P04	12DT	647.972,347	8.192.703,248	848,106	AJUSTADO
12AL115P04	13F	647.969,655	8.192.706,316	846,201	AJUSTADO
12AL115P05	1V	647.706,550	8.192.891,694	857,254	AJUSTADO
12AL115P05	2V	647.707,481	8.192.891,087	857,584	AJUSTADO
12AL115P05	3V	647.705,523	8.192.892,195	857,333	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL115P05	4V	647.705,248	8.192.892,098	857,689	AJUSTADO
12AL115P05	5C	647.702,959	8.192.891,690	857,742	AJUSTADO
12AL115P05	6C	647.698,297	8.192.892,117	857,555	AJUSTADO
12AL115P05	7C	647.692,709	8.192.895,614	857,452	AJUSTADO
12AL115P05	8C	647.690,541	8.192.901,205	857,566	AJUSTADO
12AL115P05	9DL	647.711,917	8.192.915,616	857,299	AJUSTADO
12AL115P05	10DL	647.695,561	8.192.895,914	857,263	AJUSTADO
12AL115P05	11DT	647.702,344	8.192.894,679	857,223	AJUSTADO
12AL115P05	12DT	647.695,177	8.192.903,137	857,257	AJUSTADO
12AL115P05	13F	647.699,533	8.192.898,666	855,164	AJUSTADO
12AL115P07	1V	647.841,259	8.193.109,186	885,968	AJUSTADO
12AL115P07	2V	647.842,461	8.193.108,626	886,282	AJUSTADO
12AL115P07	3V	647.840,181	8.193.109,205	886,135	AJUSTADO
12AL115P07	4V	647.839,867	8.193.109,434	886,572	AJUSTADO
12AL115P07	5C	647.838,007	8.193.109,016	886,714	AJUSTADO
12AL115P07	6C	647.834,012	8.193.106,920	886,281	AJUSTADO
12AL115P07	7C	647.827,744	8.193.105,643	886,369	AJUSTADO
12AL115P07	8C	647.820,497	8.193.105,091	886,424	AJUSTADO
12AL115P07	9DL	647.819,526	8.193.126,322	885,941	AJUSTADO
12AL115P07	10DL	647.827,496	8.193.107,581	885,959	AJUSTADO
12AL115P07	11DT	647.835,617	8.193.116,159	885,968	AJUSTADO
12AL115P07	12DT	647.819,860	8.193.110,996	885,959	AJUSTADO
12AL115P07	13F	647.823,777	8.193.114,489	883,584	AJUSTADO
12AL115P09	1V	647.991,886	8.193.247,653	885,488	AJUSTADO
12AL115P09	2V	647.993,083	8.193.248,313	885,430	AJUSTADO
12AL115P09	3V	647.990,746	8.193.247,698	885,354	AJUSTADO
12AL115P09	4V	647.990,566	8.193.247,711	886,081	AJUSTADO
12AL115P09	5C	647.987,924	8.193.248,141	886,327	AJUSTADO
12AL115P09	6C	647.983,682	8.193.248,313	886,108	AJUSTADO
12AL115P09	7C	647.979,191	8.193.248,638	886,201	AJUSTADO
12AL115P09	8C	647.971,530	8.193.243,533	886,473	AJUSTADO
12AL115P09	9DL	647.983,122	8.193.236,245	885,357	AJUSTADO
12AL115P09	10DL	647.981,169	8.193.245,922	885,385	AJUSTADO
12AL115P09	11DT	647.988,152	8.193.240,269	885,383	AJUSTADO
12AL115P09	12DT	647.975,305	8.193.242,081	885,349	AJUSTADO
12AL115P09	13F	647.980,398	8.193.241,899	883,771	AJUSTADO
12AL115P10	1V	647.973,226	8.193.346,713	873,745	AJUSTADO
12AL115P10	2V	647.975,779	8.193.347,126	874,071	AJUSTADO
12AL115P10	3V	647.973,226	8.193.346,713	873,745	AJUSTADO
12AL115P10	4V	647.972,240	8.193.346,612	874,283	AJUSTADO
12AL115P10	5C	647.970,453	8.193.346,039	874,450	AJUSTADO
12AL115P10	6C	647.966,930	8.193.344,941	874,191	AJUSTADO
12AL115P10	7C	647.960,128	8.193.343,750	874,305	AJUSTADO
12AL115P10	8C	647.954,527	8.193.343,792	874,645	AJUSTADO
12AL115P10	9DL	647.967,201	8.193.325,652	873,778	AJUSTADO
12AL115P10	10DL	647.965,531	8.193.343,334	873,773	AJUSTADO
12AL115P10	11DT	647.974,017	8.193.337,494	873,766	AJUSTADO
12AL115P10	12DT	647.957,150	8.193.338,394	873,748	AJUSTADO
12AL115P10	13F	647.966,294	8.193.336,900	871,193	AJUSTADO
12AL115P11	1V	647.940,631	8.193.418,212	867,112	AJUSTADO
12AL115P11	2V	647.939,738	8.193.417,039	867,380	AJUSTADO
12AL115P11	3V	647.941,373	8.193.419,022	867,291	AJUSTADO
12AL115P11	4V	647.941,444	8.193.419,336	867,893	AJUSTADO
12AL115P11	5C	647.944,561	8.193.420,043	868,124	AJUSTADO
12AL115P11	6C	647.951,179	8.193.419,648	867,970	AJUSTADO
12AL115P11	7C	647.957,276	8.193.417,100	868,160	AJUSTADO
12AL115P11	8C	647.963,609	8.193.413,470	868,647	AJUSTADO
12AL115P11	9DL	647.953,661	8.193.403,452	867,134	AJUSTADO
12AL115P11	10DL	647.950,842	8.193.416,575	867,107	AJUSTADO
12AL115P11	11DT	647.945,851	8.193.410,124	867,106	AJUSTADO
12AL115P11	12DT	647.964,244	8.193.408,330	867,116	AJUSTADO
12AL115P11	13F	647.950,678	8.193.412,975	865,026	AJUSTADO
12AL115P14	1V	647.840,952	8.193.546,083	846,742	AJUSTADO
12AL115P14	2V	647.840,330	8.193.544,908	846,932	AJUSTADO
12AL115P14	3V	647.841,352	8.193.547,082	846,729	AJUSTADO
12AL115P14	4V	647.841,469	8.193.547,425	847,127	AJUSTADO
12AL115P14	5C	647.841,460	8.193.550,160	847,441	AJUSTADO
12AL115P14	6C	647.847,031	8.193.552,687	847,364	AJUSTADO
12AL115P14	7C	647.853,389	8.193.553,237	847,389	AJUSTADO
12AL115P14	8C	647.857,286	8.193.545,270	847,937	AJUSTADO
12AL115P14	9DL	647.847,756	8.193.540,408	846,727	AJUSTADO
12AL115P14	10DL	647.849,696	8.193.550,476	846,739	AJUSTADO
12AL115P14	11DT	647.843,272	8.193.547,948	846,723	AJUSTADO
12AL115P14	12DT	647.853,792	8.193.543,140	846,731	AJUSTADO
12AL115P14	13F	647.850,081	8.193.545,845	844,631	AJUSTADO
12AL115P15	1V	647.842,370	8.193.497,714	855,771	AJUSTADO
12AL115P15	2V	647.841,746	8.193.496,530	856,020	AJUSTADO
12AL115P15	3V	647.843,222	8.193.498,651	855,836	AJUSTADO
12AL115P15	4V	647.843,552	8.193.499,150	856,342	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BARRAGINHA	PONTO	UTM E CORRIGIDO	UTM N CORRIGIDO	COTA/ELEVAÇÃO (M)	STATUS
12AL115P15	5C	647.844,831	8.193.501,267	856,802	AJUSTADO
12AL115P15	6C	647.850,167	8.193.502,197	856,624	AJUSTADO
12AL115P15	7C	647.855,636	8.193.499,771	856,899	AJUSTADO
12AL115P15	8C	647.860,489	8.193.489,989	857,829	AJUSTADO
12AL115P15	9DL	647.849,240	8.193.489,050	855,755	AJUSTADO
12AL115P15	10DL	647.850,313	8.193.499,764	855,783	AJUSTADO
12AL115P15	11DT	647.845,357	8.193.498,458	855,775	AJUSTADO
12AL115P15	12DT	647.853,128	8.193.489,854	855,776	AJUSTADO
12AL115P15	13F	647.848,886	8.193.495,885	853,793	AJUSTADO
12AL115P16	1V	647.973,802	8.192.928,321	872,712	AJUSTADO
12AL115P16	2V	647.975,391	8.192.928,610	873,019	AJUSTADO
12AL115P16	3V	647.972,861	8.192.927,379	872,766	AJUSTADO
12AL115P16	4V	647.972,578	8.192.926,847	873,096	AJUSTADO
12AL115P16	5C	647.971,165	8.192.922,535	873,207	AJUSTADO
12AL115P16	6C	647.966,222	8.192.918,941	873,138	AJUSTADO
12AL115P16	7C	647.961,358	8.192.919,641	873,224	AJUSTADO
12AL115P16	8C	647.956,404	8.192.922,911	873,523	AJUSTADO
12AL115P16	9DL	647.966,295	8.192.936,233	872,692	AJUSTADO
12AL115P16	10DL	647.963,036	8.192.921,611	872,706	AJUSTADO
12AL115P16	11DT	647.970,857	8.192.926,596	872,695	AJUSTADO
12AL115P16	12DT	647.961,127	8.192.931,742	872,684	AJUSTADO
12AL115P16	13F	647.962,640	8.192.927,288	870,840	AJUSTADO
12AL115P17	1V	647.891,762	8.192.779,883	860,255	AJUSTADO
12AL115P17	2V	647.892,939	8.192.779,163	860,484	AJUSTADO
12AL115P17	3V	647.890,526	8.192.779,917	860,388	AJUSTADO
12AL115P17	4V	647.889,928	8.192.779,595	860,723	AJUSTADO
12AL115P17	5C	647.886,990	8.192.779,572	861,086	AJUSTADO
12AL115P17	6C	647.884,148	8.192.779,864	860,847	AJUSTADO
12AL115P17	7C	647.878,067	8.192.781,218	860,671	AJUSTADO
12AL115P17	8C	647.872,581	8.192.784,320	861,036	AJUSTADO
12AL115P17	9DL	647.885,667	8.192.795,764	860,259	AJUSTADO
12AL115P17	10DL	647.881,228	8.192.782,679	860,263	AJUSTADO
12AL115P17	11DT	647.889,186	8.192.783,939	860,253	AJUSTADO
12AL115P17	12DT	647.878,794	8.192.791,303	860,254	AJUSTADO
12AL115P17	13F	647.882,743	8.192.785,511	858,527	AJUSTADO

COORDENADAS E COTAS DOS PONTOS PADRONIZADOS COLETADOS NA PROPRIEDADE 12AL115.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A ANÁLISE DE CONFORMIDADE FOI ESTRUTURADA A PARTIR DOS PARÂMETROS PROCESSADOS NO LEVANTAMENTO GNSS/RTK, COM A CLASSIFICAÇÃO APROVADA, PARA CORREÇÃO E EM AVALIAÇÃO.

CÓDIGO	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARGURA SUPERIOR CRISTA (M)	CONCLUSÃO GERAL
	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	CONCLUSÃO	
12AL115P01	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL115P03	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P04	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL115P05	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P07	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P09	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL115P10	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P11	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE COM RESSALVA
12AL115P14	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL115P15	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL115P16	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE
12AL115P17	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA PROPRIEDADE 12AL115.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF)

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 12AL115 É APRESENTADO NOS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, EM ORDEM NUMÉRICA. AS FOTOGRAFIAS CONTEMPLAM A BASE GNSS/RTK, AS BARRAGINHAS EXECUTADAS, VERTEDOUROS, DETALHES CONSTRUTIVOS E DEMAIS EVIDÊNCIAS DE CAMPO.

ELEMENTO DO RF	PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO	DUAS COLUNAS, COM 3 LINHAS POR PÁGINA, CONFORME QUANTIDADE DE IMAGENS
LEGENDA	LEGENDA COM O NÚMERO DA BACIA (12AL115-PXX)
RASTREABILIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO CÓDIGO DA BARRAGINHA
CONTEÚDO MÍNIMO	BASE GNSS/RTK, VISTA GERAL, VERTEDOURO, CRISTA/TALUDES E DETALHES EXECUTIVOS

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PADRÃO DE INSERÇÃO DO RF DA PROPRIEDADE 12AL115.

CONCLUSÃO TÉCNICA DA PROPRIEDADE

A PROPRIEDADE 12AL115 POSSUI 16 (DEZESSEIS) BARRAGINHAS PREVISTAS, DAS QUAIS 12 (DOZE) FORAM EXECUTADAS E LEVANTADAS EM CAMPO, CORRESPONDENDO A 75,00% DE EXECUÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO.

AS 4 (QUATRO) BARRAGINHAS REMANESCENTES CORRESPONDEM ÀS INTERVENÇÕES AINDA NÃO EXECUTADAS NA DATA DA FISCALIZAÇÃO, PERMANECENDO VINCULADAS AO CRONOGRAMA DA EMPRESA EXECUTORA. CASO OCORRA DESISTÊNCIA PELO PRODUTOR RURAL, A SITUAÇÃO DEVERÁ SER FORMALIZADA MEDIANTE A RESPECTIVA ANUÊNCIA DE DESISTÊNCIA.


CONFORME OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO E DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 12 (DOZE) BARRAGINHAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS.

TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À PROPRIEDADE 12AL115, COMPREENDENDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS DE PROCESSAMENTO, MAPAS, TABELAS, GRÁFICOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO RELATÓRIO

AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO PARCIAL (03/10/2026 A 12/11/2026) PERMITIRAM CONSOLIDAR O ACOMPANHAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO CONTRATO, COM A ATUALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES EM EXECUÇÃO E A MANUTENÇÃO, DE FORMA RESUMIDA, DAS PROPRIEDADES JÁ CONCLUÍDAS.

SÍNTESE DO AVANÇO FÍSICO DAS PROPRIEDADES FISCALIZADAS					
PROPRIEDADE	PRODUTOR	PREVISTAS	EXECUTADAS	APROVADAS	CORREÇÃO
12AL010	JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA	39	30	30	0
12AL025	ANTÔNIO MEDANHA	29	27	27	0
12AL037	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	5	1	1	0
12AL039	ANTÔNIO MEDANHA	21	21	21	0
12AL042	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	4	3	3	0
12AL053	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	2	1	1	0
12AL077	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	6	4	4	0
12AL033	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	39	37	37	0
12AL005	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	11	7	7	0
12AL034	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	3	5	5	0
12AL035	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	18	15	15	0
12AL038	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	14	14	14	0
12AL068	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	3	3	3	0
12AL115	MILTON JACINTO DA SILVA	16	12	12	0

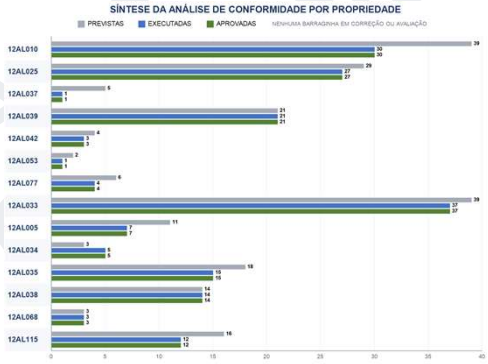

PARA A PROPRIEDADE 12AL005, FORAM EXECUTADAS E PROCESSADAS 7 (SETE) BARRAGINHAS, DE UM TOTAL DE 11 (ONZE) PREVISTAS, CORRESPONDENDO A UM AVANÇO FÍSICO DE 63,64%; 7 (SETE) ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS.

PARA A PROPRIEDADE 12AL034, FORAM EXECUTADAS E PROCESSADAS 5 (CINCO) BARRAGINHAS, DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PREVISTAS, CORRESPONDENDO A UM AVANÇO FÍSICO DE 100,00%; 5 (CINCO) ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS.

PARA A PROPRIEDADE 12AL035, FORAM EXECUTADAS E PROCESSADAS 15 (QUINZE) BARRAGINHAS, DE UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) PREVISTAS, CORRESPONDENDO A UM AVANÇO FÍSICO DE 83,33%; 15 (QUINZE) ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS.

PARA A PROPRIEDADE 12AL038, FORAM EXECUTADAS E PROCESSADAS 14 (QUATORZE) BARRAGINHAS, DE UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) PREVISTAS, CORRESPONDENDO A UM AVANÇO FÍSICO DE 100,00%; 14 (QUATORZE) ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS.

PARA A PROPRIEDADE 12AL068, FORAM EXECUTADAS E PROCESSADAS 3 (TRÊS) BARRAGINHAS, DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PREVISTAS, CORRESPONDENDO A UM AVANÇO FÍSICO DE 100,00%; 3 (TRÊS) ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS.

PARA A PROPRIEDADE 12AL115, FORAM EXECUTADAS E PROCESSADAS 12 (DOZE) BARRAGINHAS, DE UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) PREVISTAS, CORRESPONDENDO A UM AVANÇO FÍSICO DE 75,00%; 12 (DOZE) ATENDEM AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS.

OS QUANTITATIVOS EVENTUALMENTE DISPONIBILIZADOS EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS OU DE ALTERAÇÕES DE PLANEJAMENTO PERMANECERÃO SUJEITOS À DELIBERAÇÃO EXCLUSIVA DA CODEVASF.

COMPARATIVO TÉCNICO ANTES X DEPOIS DAS CORREÇÕES

ESTE ITEM APRESENTA O COMPARATIVO TÉCNICO ENTRE A SITUAÇÃO REGISTRADA NA FISCALIZAÇÃO ORIGINAL E A SITUAÇÃO VERIFICADA APÓS AS CORREÇÕES EXECUTADAS E O RETORNO A CAMPO, PARA AS PROPRIEDADES COM RECONFERÊNCIA NESTE PERÍODO.

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

COMPARATIVO DETALHADO POR BARRAGINHA — 12AL035

CÓDIGO	RAIO (M)ANTES → DEPOIS	PROF. (M)ANTES → DEPOIS	VOL. (M³)ANTES → DEPOIS	PROF.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	LARG.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	DIST.V-ATERRO(M) ANTES → DEPOIS	CONCLUSÃOANTES → DEPOIS
P14	12	1,89 → 2,21	377,30 → 498,08	0,41 → 0,63	2,89 → 2,90	2,92 → 2,99	CORRIGIR → ATENDE

COMPARATIVO ANTES X DEPOIS — PROPRIEDADE 12AL035 (1 (UMA) BARRAGINHA).

COMPARATIVO DETALHADO POR BARRAGINHA — 12AL068

CÓDIGO	RAIO (M)ANTES → DEPOIS	PROF. (M)ANTES → DEPOIS	VOL. (M³)ANTES → DEPOIS	PROF.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	LARG.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	DIST.V-ATERRO(M) ANTES → DEPOIS	CONCLUSÃOANTES → DEPOIS
P02	6	1,48 → 1,93	73,51 → 97,24	0,65 → 0,65	2,47 → 2,47	3,05 → 3,05	CORRIGIR → ATENDE

COMPARATIVO ANTES X DEPOIS — PROPRIEDADE 12AL068 (1 (UMA) BARRAGINHA).

COMPARATIVO DETALHADO POR BARRAGINHA — 12AL115

CÓDIGO	RAIO (M)ANTES → DEPOIS	PROF. (M)ANTES → DEPOIS	VOL. (M³)ANTES → DEPOIS	PROF.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	LARG.VERT.(M)ANTES → DEPOIS	DIST.V-ATERRO(M) ANTES → DEPOIS	CONCLUSÃOANTES → DEPOIS
P09	**6**	**2,31 → 1,72**	**176,59 → 89,01**	**0,14 → 0,62**	**2,38 → 2,42**	**3,26 → 2,68**	**AVALIAR → ATENDE**
P10	9	2,57 → 2,55	319,54 → 309,35	0,15 → 0,45	2,68 → 2,59	2,55 → 1,88	AVALIAR → ATENDE COM RESSALVA

COMPARATIVO ANTES X DEPOIS — PROPRIEDADE 12AL115 (2 (DUAS) BARRAGINHAS).

TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO PLANILHAS DE PROCESSAMENTO GNSS/RTK, RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO GEODÉSICO DA BASE DE REFERÊNCIA (IBGE), MAPAS TÉCNICOS, TABELAS, GRÁFICOS, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS (RF), ANÁLISES DE CONFORMIDADE E DEMAIS DOCUMENTOS PRODUZIDOS DURANTE A FISCALIZAÇÃO, INTEGRA OS ANEXOS DESTE RELATÓRIO E CONSTITUI A BASE TÉCNICA QUE SUBSIDIA AS AVALIAÇÕES, MEDIÇÕES E PARECERES EMITIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.

TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA QUE FUNDAMENTA AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRA OS ANEXOS DESTE DOCUMENTO, COMPREENDENDO:

•PLANILHAS DE PROCESSAMENTO GNSS/RTK

•RELATÓRIOS DE PROCESSAMENTO GEODÉSICO E POSICIONAMENTO DA BASE DE REFERÊNCIA (IBGE)

•PLANILHAS DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS BARRAGINHAS

•MAPAS DAS PROPRIEDADES E DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS

•RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS (RF) DE CADA PROPRIEDADE

•TABELAS DE COORDENADAS, COTAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

•DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRODUZIDOS DURANTE A FISCALIZAÇÃO

OS ANEXOS POSSUEM CARÁTER COMPLEMENTAR E COMPROBATÓRIO, INTEGRANDO O PRESENTE RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO PARA TODOS OS FINS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E CONTRATUAIS.

INHUMAS-GO, 12 DE NOVEMBRO DE 2026.

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

APANHADO GERAL DAS BARRAGINHAS APROVADAS — ACUMULADO ATÉ 12/11/2026

SITUAÇÃO ACUMULADA DE TODAS AS PROPRIEDADES LEVANTADAS ATÉ ESTA DATA, NO MESMO FORMATO DO ACOMPANHAMENTO ENVIADO À EMPRESA EXECUTORA: BARRAGINHAS APROVADAS COM DATA DA COLETA, TAMANHO (RAIO APROVADO), COORDENADA DO FUNDO (13F) EM SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S, LOCAÇÃO, PROFUNDIDADE, VOLUME ESTIMADO E CONCLUSÃO, E AS BARRAGINHAS AINDA EM CORREÇÃO COM A ORIENTAÇÃO DE CAMPO.

RESUMO DO QUE JÁ FOI APROVADO

TOTAL APROVADAS	ATENDE (ANÁLISE)	APROVADA (ATESTO)	RESSALVA ANÁLISE	RESSALVA ATESTO	RAIO ALTERADO*
180	68	80	1	31	30

CADA BARRAGINHA ENTRA EM UMA SÓ COLUNA E A SOMA DAS QUATRO COLUNAS DE SITUAÇÃO É IGUAL AO TOTAL. ATENDE = APROVADA PELA ANÁLISE, SEM ATESTO. APROVADA PELO FISCAL = ATESTO DE APROVAÇÃO DIRETA. RESSALVA DA ANÁLISE = ATENDE COM RESSALVA PELA ANÁLISE (VOLUME ATÉ 10% ABAIXO DO MÍNIMO), SEM ATESTO. RESSALVA PELO FISCAL = APROVADA COM RESSALVA POR ATESTO DO FISCAL. *RAIO ALTERADO JÁ ESTÁ CONTADO NAS COLUNAS ANTERIORES (NÃO SOMA).

SITUAÇÃO ATÉ 12/11/2026

LEVANTADAS	APROVADAS	EM CORREÇÃO	PROPRIEDADES COM CORREÇÃO
180	**180**	0	0

RESUMO POR PROPRIEDADE

PROPRIEDADE	PRODUTOR	MUNICÍPIO	TOTAL	ATENDE	ATESTO	RESS. ANÁLISE	RESS. ATESTO	RAIO ALT.*
12AL005	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	INHUMAS	**7**	7	0	0	0	0
12AL010	JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA	INHUMAS	**30**	0	30	0	0	11
12AL025	ANTÔNIO MEDANHA	INHUMAS	**27**	0	27	0	0	3
12AL033	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	INHUMAS	**37**	23	0	1	13	5
12AL034	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	INHUMAS	**5**	3	0	0	2	2
12AL035	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	INHUMAS	**15**	14	0	0	1	1
12AL037	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	INHUMAS	**1**	0	0	0	1	0
12AL038	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	INHUMAS	**14**	8	0	0	6	4
12AL039	ANTÔNIO MEDANHA	INHUMAS	**21**	0	19	0	2	1
12AL042	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	INHUMAS	**3**	0	3	0	0	0
12AL053	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	INHUMAS	**1**	0	1	0	0	0
12AL068	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	INHUMAS	**3**	3	0	0	0	0
12AL077	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	INHUMAS	**4**	3	0	0	1	1
12AL115	MILTON JACINTO DA SILVA	INHUMAS	**12**	7	0	0	5	2
TOTAL	**14 PROPRIEDADES**	—	**180**	**68**	**80**	**1**	**31**	**30**

12AL005 — LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE • INHUMAS (7 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL005P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	653.044,057	8.191.415,246	OK	2,107	141,38	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P02	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.999,059	8.191.445,726	OK	1,654	96,32	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.956,011	8.191.480,367	OK	1,955	121,46	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P04	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.598,624	8.192.037,258	OK	1,896	126,76	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P07	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.939,569	8.192.347,325	OK	2,030	114,64	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P08	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.954,519	8.192.390,432	OK	1,717	131,36	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P09	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.804,348	8.192.566,186	OK	1,660	101,34	**PAGAR COMO RAIO 6 M**

12AL010 — JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA • INHUMAS (30 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL010P01	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.402,464	8.194.492,762	OK	1,505	104,07	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL010P02	INHUMAS-GO	22/10/2026	4 METROS	22S	654.054,804	8.194.415,680	**ALTERADA 6 → 4 M**	1,310	56,21	**PAGAR COMO RAIO 4 M**
12AL010P03	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.579,133	8.194.303,012	**ALTERADA 12 → 6 M**	1,967	134,95	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL010P04	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	654.392,140	8.194.361,849	**ALTERADA 6 → 9 M**	1,823	234,93	**PAGAR COMO RAIO 9 M**
12AL010P05	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	654.325,058	8.194.247,403	**ALTERADA 6 → 9 M**	2,190	272,45	**PAGAR COMO RAIO 9 M**
12AL010P06	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.161,873	8.194.500,588	OK	1,315	75,84	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL010P07	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.193,579	8.194.037,903	OK	1,693	128,79	**PAGAR COMO RAIO 6 M**

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL010P08	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.249,650	8.194.243,878	OK	1,463	91,07	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P09	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.951,648	8.194.059,383	OK	1,701	100,56	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P10	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.221,048	8.194.194,588	OK	1,601	96,81	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P11	INHUMAS-GO	22/10/2026	4 METROS	22S	654.240,102	8.194.005,951	ALTERADA 6 → 4 M	1,276	53,53	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL010P12	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.162,943	8.194.156,637	OK	1,520	171,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P13	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.179,022	8.194.799,173	OK	1,491	87,38	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P14	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.146,688	8.194.077,437	OK	1,653	86,83	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P15	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	654.088,088	8.194.239,400	ALTERADA 6 → 9 M	1,979	214,20	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL010P16	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.173,684	8.195.374,029	OK	1,562	127,17	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P17	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.234,569	8.195.305,650	OK	1,614	99,18	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P18	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.317,381	8.195.412,377	OK	1,899	135,20	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P19	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.332,902	8.195.302,410	OK	1,540	102,31	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P20	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.751,806	8.194.295,804	OK	2,250	104,19	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P21	INHUMAS-GO	22/10/2026	4 METROS	22S	654.125,104	8.194.182,294	ALTERADA 6 → 4 M	1,919	53,01	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL010P22	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.344,149	8.193.814,636	OK	1,839	100,51	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P23	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.875,912	8.194.325,492	OK	2,686	113,65	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P24	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.988,032	8.194.432,096	OK	2,034	101,74	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P25	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.039,033	8.194.658,838	OK	1,687	170,32	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P26	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.232,857	8.194.106,378	ALTERADA 12 → 6 M	1,953	118,32	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P27	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.129,011	8.194.307,978	OK	1,675	105,26	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P28	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.390,547	8.193.964,561	ALTERADA 9 → 6 M	1,763	101,31	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P29	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.500,412	8.194.399,094	ALTERADA 9 → 6 M	1,602	91,52	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P30	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.081,494	8.194.529,296	ALTERADA 12 → 6 M	1,563	103,12	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL025 — ANTÔNIO MEDANHA • INHUMAS (27 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL025P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.756,425	8.193.273,513	OK	1,606	109,55	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.272,076	8.193.338,523	OK	1,623	108,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P03	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.364,723	8.193.454,900	OK	1,622	103,16	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.534,345	8.193.391,807	OK	1,984	160,40	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.462,548	8.193.497,899	OK	1,479	128,56	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P06	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.541,234	8.193.265,961	OK	1,359	91,53	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P07	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.807,545	8.193.308,243	OK	1,970	217,99	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P08	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.999,842	8.193.393,328	OK	1,664	187,32	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P09	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.975,706	8.193.425,530	OK	1,778	146,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P10	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	654.947,796	8.193.524,589	ALTERADA 6 → 9 M	2,483	265,42	PAGAR COMO RAIO 9 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL025P11	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.833,857	8.193.581,830	OK	1,636	133,54	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P12	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	654.777,241	8.193.562,262	ALTERADA 6 → 9 M	2,085	208,91	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL025P14	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.692,442	8.193.648,428	OK	1,968	138,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P15	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.668,619	8.193.667,952	OK	2,146	195,48	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P20	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.060,395	8.193.517,132	OK	1,527	104,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P21	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.905,023	8.193.665,582	OK	1,596	120,94	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P22	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.331,168	8.193.136,131	OK	1,788	149,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P23	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.407,838	8.193.238,776	OK	1,741	133,90	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P24	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	655.361,036	8.193.204,312	ALTERADA 6 → 9 M	2,029	322,53	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL025P25	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.419,068	8.193.164,007	OK	1,274	88,50	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P26	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.785,244	8.193.341,757	OK	2,309	307,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P27	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.394,432	8.193.064,510	OK	1,372	112,97	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P28	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.468,951	8.192.978,233	OK	1,567	125,47	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P29	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.547,262	8.193.008,260	OK	1,482	87,47	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P30	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.628,158	8.192.969,581	OK	1,544	131,91	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P31	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.576,729	8.192.921,978	OK	1,348	101,22	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P32	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.516,933	8.192.919,926	OK	1,665	87,43	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL033 — CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA • INHUMAS (37 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL033P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.573,917	8.193.856,242	OK	1,863	130,05	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P02	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.673,699	8.193.782,398	OK	1,662	132,64	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.748,939	8.193.674,780	OK	1,671	141,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P04	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.823,235	8.194.487,431	OK	1,742	151,54	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P05	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.030,747	8.194.291,432	OK	1,568	121,02	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P06	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.279,763	8.194.146,791	OK	1,769	166,68	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P07	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.363,980	8.194.160,003	OK	1,553	119,76	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P08	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	652.347,349	8.194.040,826	OK	1,546	74,46	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P09	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.488,989	8.193.951,794	OK	2,028	211,03	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P11	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.587,229	8.193.419,708	OK	1,721	88,52	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P12	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.006,656	8.192.836,616	OK	2,280	87,72	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P13	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.019,253	8.192.785,193	OK	1,985	88,03	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P14	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.842,595	8.192.904,586	OK	2,465	91,25	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P15	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.979,207	8.192.947,252	OK	1,769	88,67	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P16	INHUMAS-GO	12/11/2026	4 METROS	22S	650.801,482	8.193.285,559	ALTERADA 6 → 4 M	1,133	57,78	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL033P17	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.825,662	8.193.447,985	OK	1,271	89,44	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL033P18	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.044,848	8.193.732,402	OK	1,510	79,21	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P19	INHUMAS-GO	12/11/2026	4 METROS	22S	651.037,671	8.193.816,979	ALTERADA 6 → 4 M	1,567	66,47	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL033P20	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.942,110	8.193.594,782	OK	1,530	102,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P21	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.023,609	8.193.850,056	OK	1,818	94,94	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P22	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.028,032	8.194.039,769	OK	2,056	124,47	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P24	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.238,747	8.194.143,604	ALTERADA 4 → 6 M	1,725	122,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P25	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.729,156	8.191.537,848	OK	1,119	190,87	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P27	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.491,108	8.191.665,848	OK	2,411	195,95	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P28	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.467,309	8.191.239,039	OK	2,203	164,10	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P29	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.414,057	8.191.270,001	OK	1,805	122,07	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P30	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.323,747	8.191.223,684	OK	1,914	129,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P32	INHUMAS-GO	12/11/2026	12 METROS	22S	650.091,660	8.191.339,636	ALTERADA 6 → 12 M	2,335	445,08	PAGAR COMO RAIO 12 M
12AL033P33	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.090,277	8.191.393,676	OK	1,666	113,82	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P34	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.971,777	8.191.179,091	OK	1,662	83,18	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P35	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.839,740	8.191.232,228	OK	1,564	106,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P38	INHUMAS-GO	12/11/2026	4 METROS	22S	649.983,821	8.191.268,187	OK	1,562	108,39	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL033P39	INHUMAS-GO	12/11/2026	9 METROS	22S	650.090,588	8.191.339,348	ALTERADA 6 → 9 M	2,204	463,38	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL033P40	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.667,053	8.191.353,051	OK	1,960	144,28	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P41	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.611,875	8.191.237,831	OK	1,717	131,01	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P42	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.233,716	8.192.672,507	OK	1,723	120,26	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P43	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	651.300,002	8.192.644,700	OK	1,618	81,52	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL034 — DIVINO BARBOSA QUEIROZ • INHUMAS (5 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL034P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.521,024	8.194.412,074	ALTERADA 4 → 6 M	2,170	159,33	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL034P02	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.593,416	8.194.476,792	OK	1,640	145,39	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL034P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	9 METROS	22S	649.512,218	8.194.510,156	ALTERADA 6 → 9 M	2,314	234,60	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL034P04	INHUMAS-GO	12/11/2026	4 METROS	22S	650.385,314	8.193.131,009	OK	1,355	71,33	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL034P05	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.251,042	8.193.414,647	OK	1,266	121,88	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL035 — ANTÔNIO LIMA DE ABREU • INHUMAS (15 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL035P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.798,458	8.192.382,504	OK	1,631	97,14	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P02	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.965,743	8.192.501,973	OK	1,635	108,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.072,640	8.192.572,729	OK	1,654	112,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P04	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.532,087	8.192.939,504	OK	1,640	102,85	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P05	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.364,970	8.192.680,211	OK	1,552	85,04	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P06	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.183,766	8.192.633,740	OK	1,869	151,88	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL035P07	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.118,839	8.192.607,548	OK	2,128	155,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P08	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.286,857	8.192.658,796	OK	1,687	128,66	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P10	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.517,775	8.192.710,625	OK	1,708	129,97	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P12	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.833,821	8.191.874,044	OK	1,553	101,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P13	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.780,090	8.191.901,233	OK	1,880	165,92	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P14	INHUMAS-GO	12/11/2026	12 METROS	22S	650.152,505	8.191.948,486	OK	2,211	498,08	PAGAR COMO RAIO 12 M
12AL035P15	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.695,870	8.192.238,770	OK	1,755	104,87	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P16	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.084,712	8.192.103,727	OK	1,630	108,21	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P18	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	650.116,834	8.192.247,189	ALTERADA 12 → 6 M	2,014	166,35	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL037 — ANTÔNIO LIMA DE ABREU • INHUMAS (1 APROVADA)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL037P01	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	650.615,987	8.194.105,446	OK	1,276	79,06	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL038 — ANTÔNIO JACINTO DA SILVA • INHUMAS (14 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL038P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.911,852	8.192.938,425	OK	1,793	97,36	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P02	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.871,154	8.192.977,567	OK	1,947	131,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.844,663	8.192.931,078	OK	2,033	123,75	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P04	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.356,689	8.192.939,768	OK	2,124	140,52	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P05	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.318,403	8.192.929,025	OK	1,858	113,41	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P06	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.288,363	8.192.958,044	OK	1,564	80,34	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P07	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.267,813	8.193.005,666	ALTERADA 12 → 6 M	2,014	135,14	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P08	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.161,027	8.192.981,573	ALTERADA 12 → 6 M	1,891	126,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P09	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	649.302,302	8.192.854,816	OK	2,106	111,58	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P10	INHUMAS-GO	12/11/2026	9 METROS	22S	649.011,388	8.193.185,655	ALTERADA 6 → 9 M	3,027	337,39	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL038P11	INHUMAS-GO	12/11/2026	9 METROS	22S	649.436,581	8.192.886,781	ALTERADA 6 → 9 M	3,051	394,67	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL038P13	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.411,154	8.192.938,418	OK	2,029	166,53	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P14	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.528,152	8.192.963,952	OK	1,651	81,06	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P15	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.591,896	8.193.101,141	OK	1,958	97,28	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL039 — ANTÔNIO MEDANHA • INHUMAS (21 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL039P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.972,436	8.192.972,994	OK	1,693	111,51	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.067,413	8.192.912,313	OK	1,706	166,22	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P03	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.331,032	8.192.799,850	OK	1,785	122,86	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.127,229	8.192.873,427	OK	1,632	99,37	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.151,137	8.192.836,406	OK	1,411	82,22	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P06	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.206,280	8.192.795,088	OK	1,451	152,76	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL039P07	INHUMAS-GO	23/10/2026	4 METROS	22S	655.200,535	8.192.853,518	ALTERADA 6 → 4 M	1,326	56,57	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL039P08	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.168,208	8.192.937,902	OK	1,813	110,42	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P09	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.124,308	8.193.105,862	OK	1,755	122,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P10	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.907,450	8.193.060,208	OK	1,496	92,78	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P11	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.974,296	8.193.052,152	OK	1,627	91,01	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P12	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.816,739	8.193.209,463	OK	1,595	93,98	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P13	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.916,898	8.193.276,381	OK	1,440	100,20	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P14	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.930,205	8.193.318,625	OK	2,271	221,46	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P15	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.814,233	8.193.389,602	OK	1,713	148,68	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P16	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.784,716	8.193.433,296	OK	1,830	145,57	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P17	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.707,880	8.193.493,632	OK	1,846	117,51	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P18	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.764,763	8.193.370,638	OK	1,375	109,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P19	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.274,617	8.193.024,261	OK	1,551	97,99	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P20	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.686,607	8.192.968,865	OK	1,541	88,48	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P21	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.732,167	8.193.032,817	OK	1,524	144,01	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL042 — ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO • INHUMAS (3 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL042P01	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	655.511,796	8.194.023,972	OK	1,712	73,59	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL042P02	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	655.430,373	8.194.049,943	OK	1,852	79,26	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL042P03	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	655.343,675	8.194.086,828	OK	1,484	70,87	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL053 — ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO • INHUMAS (1 APROVADA)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL053P02	INHUMAS-GO	21/10/2026	12 METROS	22S	654.955,554	8.193.900,117	OK	1,961	460,90	PAGAR COMO RAIO 12 M

12AL068 — ANTÔNIO JACINTO DA SILVA • INHUMAS (3 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL068P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.140,406	8.192.975,058	OK	1,942	96,85	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL068P02	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.261,561	8.192.985,392	OK	1,927	97,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL068P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	648.132,903	8.193.102,042	OK	2,548	242,72	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL077 — CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA • INHUMAS (4 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL077P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.753,646	8.194.107,494	OK	1,998	204,87	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL077P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.669,400	8.194.199,315	OK	1,835	102,63	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL077P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	650.737,151	8.194.330,648	ALTERADA 6 → 9 M	2,688	295,51	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL077P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.813,784	8.194.257,176	OK	2,223	336,49	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

12AL115 — MILTON JACINTO DA SILVA • INHUMAS (12 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL115P01	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.973,970	8.192.873,712	OK	1,921	99,76	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P03	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.990,425	8.192.783,110	OK	2,526	175,80	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P04	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.969,655	8.192.706,316	OK	1,921	116,63	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P05	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.699,533	8.192.898,666	OK	2,090	237,77	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P07	INHUMAS-GO	12/11/2026	9 METROS	22S	647.823,777	8.193.114,489	**ALTERADA 6 → 9 M**	2,384	323,23	**PAGAR COMO RAIO 9 M**
12AL115P09	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.980,398	8.193.241,899	OK	1,717	89,01	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P10	INHUMAS-GO	12/11/2026	9 METROS	22S	647.966,294	8.193.336,900	**ALTERADA 6 → 9 M**	2,552	309,35	**PAGAR COMO RAIO 9 M**
12AL115P11	INHUMAS-GO	12/11/2026	12 METROS	22S	647.950,678	8.193.412,975	OK	2,086	207,95	**PAGAR COMO RAIO 12 M**
12AL115P14	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.850,081	8.193.545,845	OK	2,111	103,24	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P15	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.848,886	8.193.495,885	OK	1,978	101,02	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P16	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.962,640	8.192.927,288	OK	1,872	124,65	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL115P17	INHUMAS-GO	12/11/2026	6 METROS	22S	647.882,743	8.192.785,511	OK	1,728	122,12	**PAGAR COMO RAIO 6 M**

LOCAÇÃO: "ALTERADA" QUANDO O RAIO APROVADO DIFERE DO RAIO DE PROJETO. DATA: PRIMEIRA COLETA DE CAMPO. UTM: FUNDO (13F) CORRIGIDO PELO PPP (SIRGAS 2000 / UTM 22S).

TOTAL: 180 BARRAGINHA(S) APROVADA(S) EM 14 PROPRIEDADE(S).

ANEXOS

ANEXO 01 — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF) — 12AL005

ANEXO 02 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL005 (COM PPP DO IBGE)

ANEXO 03 — MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE — 12AL005

ANEXO 04 — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF) — 12AL034

ANEXO 05 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL034 (COM PPP DO IBGE)

ANEXO 06 — MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE — 12AL034

ANEXO 07 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL034

ANEXO 08 — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF) — 12AL035

ANEXO 09 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL035 (COM PPP DO IBGE)

ANEXO 10 — MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE — 12AL035

ANEXO 11 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL035

ANEXO 12 — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF) — 12AL038

ANEXO 13 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL038 (COM PPP DO IBGE)

ANEXO 14 — MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE — 12AL038

ANEXO 15 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL038

ANEXO 16 — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF) — 12AL068

ANEXO 17 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL068 (COM PPP DO IBGE)

ANEXO 18 — MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE — 12AL068

ANEXO 19 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL068

ANEXO 20 — RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (RF) — 12AL115

ANEXO 21 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL115 (COM PPP DO IBGE)

ANEXO 22 — MAPA TÉCNICO DA PROPRIEDADE — 12AL115

ANEXO 23 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL115 — NOTA TÉCNICA Nº 026/2026 DE 21/10/2026

ANEXO 24 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL115 — NOTA TÉCNICA Nº 027/2026 DE 05/11/2026

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO 25 — RELATÓRIO DO PROCESSAMENTO RTK — 12AL033 (ATUALIZADO)

ANEXO 26 — ATESTO / NOTA TÉCNICA DA CODEVASF — 12AL033

DAVID DE SOUSA FERNANDES RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA E ASSESSO… ENGENHEIRO CIVIL – 060133223-7	**JOÃO PEDRO CARLOS PAIM** FISCAL DO CONTRATO – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO D… RECEBIDO EM ___/___/_____	**CONSULTE PELO CELULAR** **VERIFICAÇÃO: TF2E-6KNA** MIN-RTF-CT0442-2026-RP005-R00 AUTORIA: MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7 USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).
